


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2020			tri 2, 2020			tri 3, 2020			tri 4, 2020			tri 1, 2021
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1		ETAPA PRECONTRACTUAL	30 días	mar 24/12/19	lun 3/02/20														
2		PLAN MANEJO AMBIENTAL	150 días	mar 4/02/20	lun 31/08/20	1													
3		ETAPA CONTRACTUAL	143 días	mar 4/02/20	jue 20/08/20														
4		EXPLANACIONES	10 días	vie 26/06/20	jue 9/07/20														
5		EXCAVACIONES V	1 día	vie 26/06/20	vie 26/06/20	1;45													
6		TERRAPLENES	9 días	lun 29/06/20	jue 9/07/20	5													
7		AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	1 día	vie 10/07/20	vie 10/07/20														
8		TRAMO 1	1 día	vie 10/07/20	vie 10/07/20														
9		SUBBASES GRA	1 día	vie 10/07/20	vie 10/07/20	6													
10		Estructura de Pavimento	6 días	lun 13/07/20	lun 20/07/20	9													
11		TRAMO 1	6 días	lun 13/07/20	lun 20/07/20														
12		PAVIMENTO EI	5 días	lun 13/07/20	vie 17/07/20	9													
13		ACERO DE REFL	1 día	lun 20/07/20	lun 20/07/20	12													
14		ESTRUCTURAS Y DR	143 días	mar 4/02/20	jue 20/08/20														

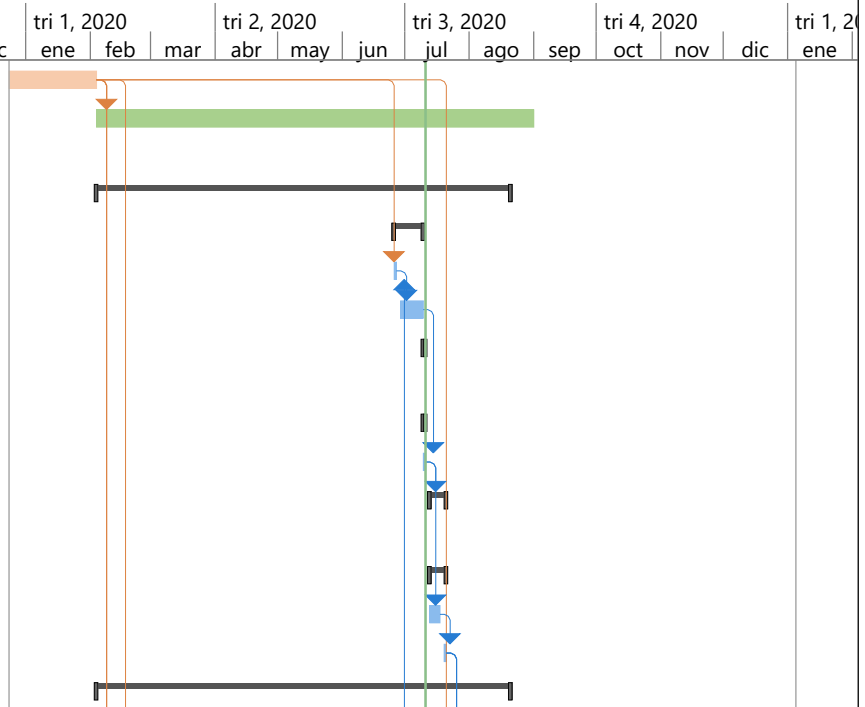

Proyecto: Programación_ Tarazá
Fecha: sáb 11/07/20

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2020			tri 2, 2020			tri 3, 2020			tri 4, 2020			tri 1, 2021
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
15		CUNETAS, COLCHOGAVIONE Y BOLSACRETO	23 días	mar 21/07/20	jue 20/08/20														
16		EXCAVACIONE	1 día	mar 21/07/20	mar 21/07/20	1;13													
17		ACERO DE REFL	9 días	mié 22/07/20	lun 3/08/20	16													
18		CUNETA DE CC	8 días	mar 21/07/20	jue 30/07/20	13													
19		COLCHOGAVIO	10 días	mar 4/08/20	lun 17/08/20	17													
20		SUMINISTRO E	3 días	mar 18/08/20	jue 20/08/20	19													
21		puente de 35 m	103 días	mar 4/02/20	jue 25/06/20														
22		EXCAVACIONE	1 día	mar 4/02/20	mar 4/02/20	1													
23		RELLENOS PAI	3 días	mié 5/02/20	vie 7/02/20	22													
24		CONCRETO RE	2 días	lun 10/02/20	mar 11/02/20	23													
25		TUBERIA DE D	1 día	lun 17/02/20	lun 17/02/20	24													
26		CONCRETO f'c=	2 días	mar 18/02/20	mié 19/02/20	1;25													
27		CONCRETO f'c=	1 día	jue 20/02/20	jue 20/02/20	26													
28		PILAS DE CONC	10 días	vie 21/02/20	jue 5/03/20	27													
29		ACERO DE REFL	5 días	vie 6/03/20	jue 12/03/20	28													
30		ACERO DE REF	5 días	vie 13/03/20	jue 19/03/20	28;29													
31		ACERO DE REF	4 días	vie 20/03/20	mié 25/03/20	30													

Proyecto: Programación_ Tarazá
Fecha: sáb 11/07/20

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2020			tri 2, 2020			tri 3, 2020			tri 4, 2020			tri 1, 2021
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
32		CONCRETO f'c=	4 días	jue 26/03/20	mar 31/03/20	31													
33		CONCRETO f'c=	1 día	mié 1/04/20	mié 1/04/20	32													
34		CONCRETO f'c=	1 día	jue 2/04/20	jue 2/04/20	33													
35		CONCRETO f'c=	1 día	vie 3/04/20	vie 3/04/20	34													
36		CONCRETO f'c=	1 día	lun 6/04/20	lun 6/04/20	35													
37		ACERO DE REFL	8 días	mar 7/04/20	jue 16/04/20	36													
38		ACERO DE REFL	12 días	vie 17/04/20	lun 4/05/20	37													
39		ACERO DE REFL	6 días	mar 5/05/20	mar 12/05/20	38													
40		ACERO DE REFL	9 días	mié 13/05/20	lun 25/05/20	39													
41		ACERO DE REFL	3 días	mar 26/05/20	jue 28/05/20	40													
42		TUBERIA DE DF	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20	41													
43		BARANDAS ME	9 días	lun 1/06/20	jue 11/06/20	42													
44		ACERO DE PRE	9 días	vie 12/06/20	mié 24/06/20	43													
45		APOYOS ELAST	1 día	jue 25/06/20	jue 25/06/20	44													
46		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	8 días	mar 21/07/20	jue 30/07/20														
47		TRAMO 1 a 4	8 días	mar 21/07/20	jue 30/07/20														
48		SEÑAL VERTIC	1 día	mar 21/07/20	mar 21/07/20	13													
49		LINEA DEMARC	7 días	mié 22/07/20	jue 30/07/20	48													

Proyecto: Programación_ Tarazá
Fecha: sáb 11/07/20

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart															
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene		
50		PLAN DE MANEJO DE T	150 días	mar 4/02/20	lun 31/08/20	1																
51		INVENTARIO VIAL	15 días	vie 31/07/20	jue 20/08/20	18																
52		ETAPA DE LIQUIDACION	90 días	mar 1/09/20	lun 4/01/21	50																

Proyecto: Programación_ Tarazá
Fecha: sáb 11/07/20

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			
