



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Informe Semanal

03 al 07 de octubre de 2022





Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas



Reincorporación



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial



Primera infancia



Sustitución



BID Préstamo



KFW



ICBF Sacúdete



Jurisdicción Especial de Paz



Agencia Nacional de Tierras



Colombia Sostenible



Sociedad de Activos Especiales



BID Facilidad



AFD



Zona ZEII Catatumbo



Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Estabilización



Funcionamiento



Ambiente y Desarrollo Sostenible



Herencia Colombia



Agencia Nacional de Tierras 2019



Visión Amazonía



Catastro Multipropósito



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 5.668.487	\$ 5.105.732	\$ 562.756
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 4.858.957	\$ 4.378.006	\$ 480.951
TOTAL EJECUTADO	\$ 3.264.832	\$ 3.216.290	\$ 48.542

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Contrapartidas subcuenta Sustitución por \$90.707 millones/ Capitalización de Rendimientos por \$6.619 / Otros ingresos Funcionamiento por \$202 millones / Aporte de contrapartida por \$600 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$22.667 millones / Otros ingresos - Sustitución por \$6.129 millones / Otros ingresos - Reincorporación por \$20 millones /Otros ingresos PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$53.447./Aporte de contrapartidas OIM \$975/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Contrapartidas contratos BID Facilidad \$12.635. /Contrapartidas contratos BID Préstamo \$303.494/ Convenios Fondo Paz \$24.979/Convenio Visión Amazonía \$8.374./Convenio AFD \$1.772./ Contrapartidas MADS \$11.894/ Contrapartidas ICBF \$1.014/Contrapartidas HECO \$2.658/ Convenio de aportes Sustitución \$700.




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.602.314	\$ 2.266.566	87%	\$ 335.748	13%
Reincorporación	\$ 943.271	\$ 921.944	98%	\$ 21.326	2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 790.119	\$ 603.976	76%	\$ 186.143	24%
BID Préstamo	\$ 659.134	\$ 606.491	92%	\$ 52.643	8%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 128.113	\$ 126.348	99%	\$ 1.765	1%
ICBF Sacúdete	\$ 91.014	\$ 32.257	35%	\$ 58.757	65%
Funcionamiento	\$ 88.946	\$ 84.723	95%	\$ 4.222	5%
Primera Infancia	\$ 67.877	\$ 28.297	42%	\$ 39.581	58%
KFW	\$ 53.447	\$ 5.928	11%	\$ 47.519	89%
Catastro Multipropósito	\$ 52.647	\$ 16.588	32%	\$ 36.059	68%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.906	99,6%	\$ 159	0,4%
Estabilización	\$ 40.086	\$ 36.166	90%	\$ 3.920	10%
BID Facilidad	\$ 35.325	\$ 30.045	85%	\$ 5.280	15%
Herencia Colombia	\$ 25.902	\$ 21.625	83%	\$ 4.277	17%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.710	\$ 17.030	78%	\$ 4.680	22%
Visión Amazonía	\$ 8.374	\$ 7.756	93%	\$ 618	7%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 5.614	\$ 320	6%	\$ 5.294	94%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.804	98%	\$ 43	2%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.772	\$ 1.435	81%	\$ 337	19%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 1.354	\$ 194	14%	\$ 1.160	86%
TOTAL	\$ 5.668.487	\$ 4.858.957	86%	\$ 809.530	14%

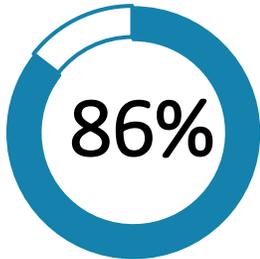




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapartidas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.266.566	\$ 1.599.168	71%	\$ 587.497	26%	\$ 79.900	3,5%
Reincorporación	\$ 921.944	\$ 781.914	85%	\$ 139.255	15%	\$ 775	0,1%
BID Préstamo	\$ 606.491	\$ 176.932	29%	\$ 126.065	21%	\$ 303.494	50%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 603.976	\$ 416.885	69%	\$ 185.531	31%	\$ 1.560	0,3%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 126.348	\$ 62.411	49%	\$ 52.043	41%	\$ 11.894	9%
Funcionamiento	\$ 84.723	\$ 70.413	83%	\$ 14.310	17%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.906	\$ 43.906	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Estabilización	\$ 36.166	\$ 31.815	88%	\$ 4.351	12%	\$ 0	0%
ICBF Sacúdete	\$ 32.257	\$ 14.357	45%	\$ 16.886	52%	\$ 1.014	3%
BID Facilidad	\$ 30.045	\$ 12.567	42%	\$ 4.843	16%	\$ 12.635	42%
Primera Infancia	\$ 28.297	\$ 25.222	89%	\$ 3.075	11%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 21.625	\$ 5.300	25%	\$ 13.667	63%	\$ 2.658	12%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 17.030	\$ 11.551	68%	\$ 5.479	32%	\$ 0	0%
Catastro Multipropósito	\$ 16.588	\$ 248	1,5%	\$ 16.340	98,5%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 7.756	\$ 4.782	62%	\$ 2.974	38%	\$ 0	0%
KFW	\$ 5.928	\$ 0	0%	\$ 5.928	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.804	\$ 2.804	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.435	\$ 0	0%	\$ 1.435	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 320	\$ 0	0%	\$ 320	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 194	\$ 0	0%	\$ 194	100%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 4.858.957	\$ 3.264.832	67%	\$ 1.180.194	24%	\$ 413.931	9%

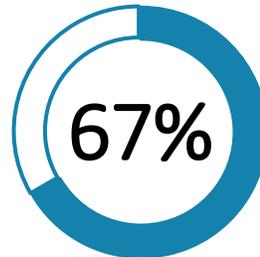



Línea del Tiempo

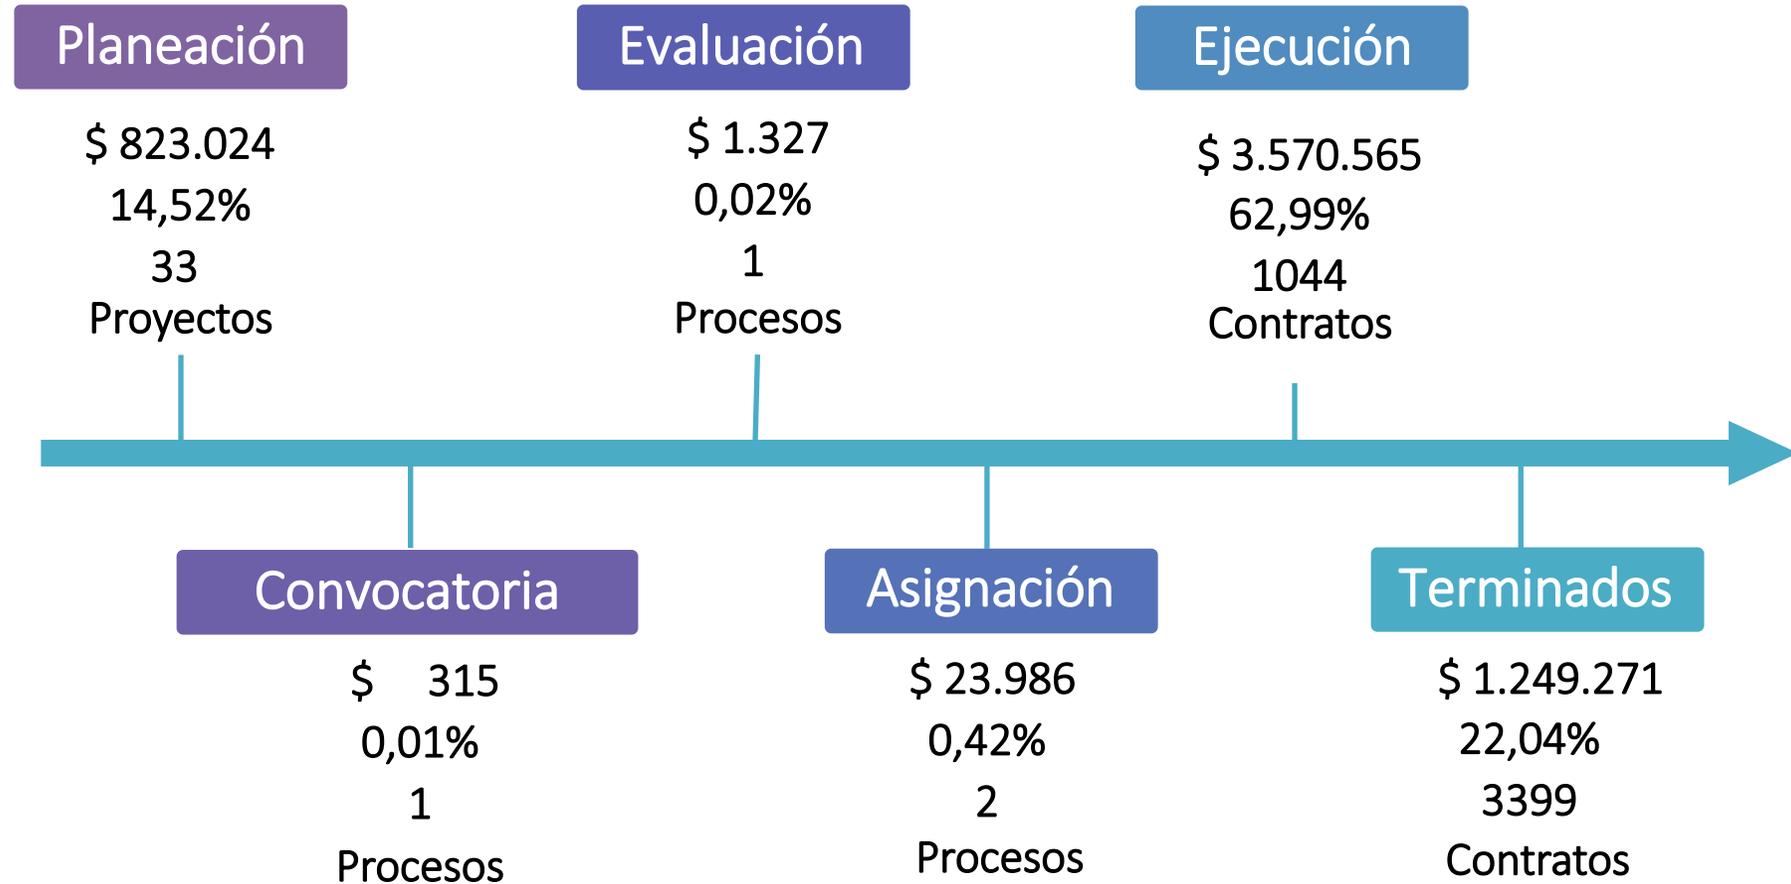



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 335.896

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 23.448

Ejecución
\$ 1.698.914

Terminado
\$ 544.055

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 335.896

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Sustitución	\$ 335.748
Contratos de prestación de servicios	\$ 148

Sustitución



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 23.448

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Logístico	ART	GRUPO IV CONSORCIO META SOSTENIBLE	\$ 23.448	14 de octubre de 2022

Sustitución



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.698.914

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$852.945	-	Nov17 - Dic22	100%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	UNODC	1092-21	\$ 157.898	\$21.379	Ene22 - Ene24	44%
	Fupad Colombia	1041-21	\$ 136.554	\$40.860	Dic21 - Dic23	15%
	OEI	1091-21	\$ 79.389	\$15.912	Ene22 - Ene24	17%
	Departamento Vichada, municipio de Cumaribo	671-21	\$ 815	-	Oct21 - Oct23	0%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	\$ 25.855	-	Jun21 - Feb23	50%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	\$ 21.849	-	Jul21 - Mar23	50%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	\$ 15.066	-	Jul21 - Mar23	50%
Servicios Persona Natural	201 CPS	N/A	\$ 20.357	-	Ene21 - Feb23	79%

\$ 1.698.914*

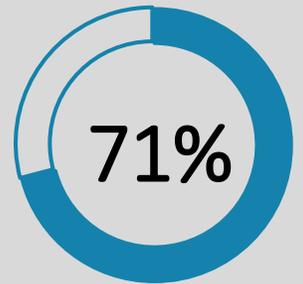

EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a adición a 2 CPS

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.698.914

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Consorcio construyendo proyectos sostenibles	364-22	\$ 24.573	-	Jul22 - Oct23	10%
	Unión temporal selva social	373-22	\$ 31.145	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio desarrollo rural zona 3	375-22	\$ 30.693	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio productivo Caquetá 4	377-22	\$ 28.919	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio grupo Max de Orinoquia	366-22	\$ 27.681	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio construyendo proyectos PNIS	365-22	\$ 31.629	-	Jul22 - Oct23	10%
	UT para la Paz 2022	359-22	\$ 24.411	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio familias productivas por la paz 2022	402-22	\$ 20.520	-	Pendiente acta	0%
	Corporación para impulsar el desarrollo ambiental "CIDMAG"	404-22	\$ 17.539	-	Ago22 - Nov23	10%
	UT Caquetá avanza	403-22	\$ 13.456	-	Ago22 - Nov23	0%
	Situando SAS	927-21	\$ 6.957	-	Dic21 - Jun23	50%
	Publica S.A.S.	984-21	\$ 2.500	-	Nov21 - Nov22	41%

\$ 1.698.914*

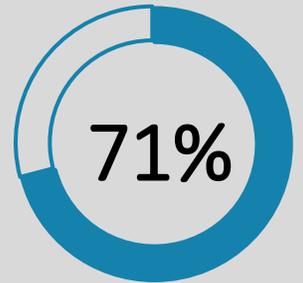

EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a adición a 2 CPS

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.698.914

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	DCO Ingeniería & Servicios SAS	371-22	\$ 9.655	-	May22 - Sep23	23%
	DCO Ingeniería & Servicios SAS	372-22	\$ 8.898	-	Jun22 - Oct23	20%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 8.696	-	Sep21 - Mar23	50%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 5.241	-	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 5.082	-	Jul21 - Ene23	10%
Arrendamientos	Situando SAS	928-21	\$ 3.046	-	Oct21 - Abr23	44%
Transporte Público Terrestre	UT Dapre OS 2022	354-22	\$ 2.575	-	Abr22 - Abr23	36%
Implementación de modelos productivos asociativos sostenibles	Gran Tierra Colombia INC Sucursal	1124-21	\$ 2.000	\$ 1.750	Dic21 - Dic25	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 2.187	-	N/A	96%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	-	Dic19 - Dic22	82%

\$ 1.698.914*

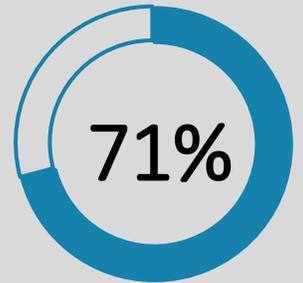

EJECUCIÓN

Sustitución





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 544.055

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF002	\$309.350	\$ 10.807	dic-20	Liquidado
-OEI-	262-20	\$ 89.169	-	nov-21	En proceso de liquidación
UNODC	AF001	\$ 67.177	-	dic-19	Liquidado
511 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 24.520	-	dic-18	Liquidado
Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	may-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 9.226	-	nov-20	Liquidado
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 4.850	-	sep-19	Liquidado
COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	jun-22	En proceso de liquidación
78 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 4.864	-	ago-19	En proceso de liquidación
Situando SAS	254-19	\$ 3.001	-	oct-21	Liquidado
AS Transportes	28-21	\$ 2.392	-	abr22	En proceso de liquidación
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 992	-	ene-20	Liquidado
Ecomún	771-18	\$ 871	-	oct-19	Liquidado
Situando SAS	411-20	\$ 706	-	oct-21	Liquidado

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 544.055

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 682	-	dic-18	Liquidado
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 19	-	nov-20	Liquidado
UNODC - Departamento de Nariño - Municipio de Buesaco	227-22	-	-	may-22	Liquidado
UNODC - Municipio de Campamento	225-22	-	-	may-22	Liquidado
Municipio de la Cruz	154-22	-	-	jun-22	Liquidado
Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego	180-22	-	-	may-22	Liquidado
Municipio el Tablón de Gomez	153-22	-	-	may-22	Liquidado
UNODC-Municipio de Valdivia	226-22	-	-	may-22	Liquidado

Sustitución



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$186.765

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 286.711

Terminado
\$ 316.643

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 186.765

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible PDET	\$ 186.143
Contratos de prestación de servicios	\$ 622

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 286.711

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - Nov22	43%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	-	Jul20 - Oct22	21%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Nov22	26%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - Oct22	88%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - Oct22	26%
	Unión Temporal Futuro Pazcifico	110-20	\$11.137	-	Jul20 - Oct22	37%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Oct22	51%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Nov22	60%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Nov22	57%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - Oct22	34%

\$ 286.711*

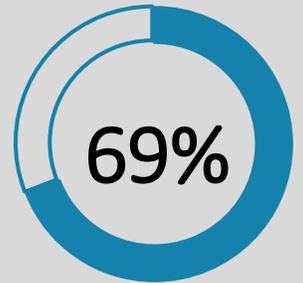

EJECUCIÓN

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 3 CPS y adición de 6 CPS

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 286.711

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	292 CPS	N/A	\$30.474	-	Ene21 - Oct23	78%
Ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo social y económico	OR Construcciones e ingeniería SAS	433-22	\$22.604	-	Pendiente acta	0%
Proyectos de Generación de Ingresos	UT E&C - Colombia en Paz	1068-21	\$14.437	-	Dic21 - Feb23	50%
	UT por la Paz 2022	360-22	\$ 10.892	-	Jun22 - Ago23	10%
	Corporación Colombia Internacional CCI	1042-21	\$10.293	-	Dic21 - Feb23	50%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	358-22	\$13.496	-	Abr22 - Abr23	11%
	Proyectamos Colombia SAS	436-22	\$ 3.053	-	Ago22 - Feb23	0%
Implementación de proyectos de generación de ingresos	Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	\$ 8.860	-	Ago21 - Oct22	90%
Interventoría	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - Dic22	41%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - Dic22	52%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Ene23	55%
	Velnec S.A.	437-22	\$ 4.064	-	Pendiente acta	0%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA LTDA	393-22	\$ 85	-	Jun22 - Ene23	0%

\$ 286.711*

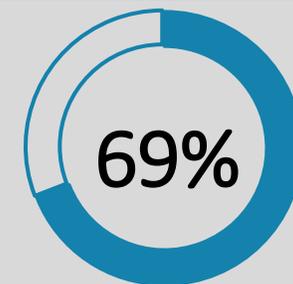

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 3 CPS y adición de 6 CPS

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 286.711

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 5.838	-	N/A	80%
Servicio de transporte público terrestre	U.T. TCSC - Sabana FCP	1073-21	\$ 3.000	-	Ene22 - Ene23	59%
Adquisición y entrega de dotación	Inversiones BlucherS.A.S	463-22	\$ 2.693	-	Sep22 - Ene23	0%
		464-22	\$ 1.698	-	Sep22 - Ene23	0%
Ejecutar proyecto de infraestructura productiva	Consortio Eres 2022	417-22	\$ 678	-	Ago22 - Mar23	0%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Ene21 - Nov22	100%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	\$ 525	-	May21 - Nov22	44%
Tiquetes Aéreos	Novatours Ltda.	315-22	\$ 450	-	Mar22 - Ene23	60%
Interventoría Construcción de puente vehicular	Consortio Intervial Antioquia	157-21	\$ 422	-	May21 - Oct22	0%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	\$ 12	-	Non21 - N/A	100%

\$ 286.711*

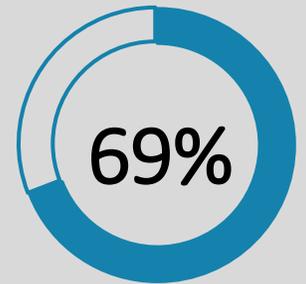

EJECUCIÓN

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 3 CPS y adición de 6 CPS

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 316.643

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1032 CPS	\$34.810	-	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	675 CPS	\$28.455	-	feb-19	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	jul-22	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Douglas Trade S.A.S.	721-21	\$ 8.705	-	may-22	Liquidado
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$7.627	-	dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$6.651	-	ago-21	Liquidado
Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	-	jun-22	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	nov-21	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



BOYACÁ
DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO
CON
ENFOQUE TERRITORIAL



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 316.643

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$3.156	-	abr-21	Liquidado
Norte Ingenieros Ltda.	167-21	\$ 2.981	-	sep-22	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio ART JRUNOA	200-21	\$ 2.004	-	ene-22	Liquidado
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	nov-21	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	-	ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.171	-	jun-22	En proceso de liquidación
Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	mar-22	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	abr-21	Liquidado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	nov-19	Liquidado
COCOMACIA	821-20	\$ 889	-	feb-22	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	57-19	\$ 798	-	sep-22	En proceso de liquidación
Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	-	dic-21	En proceso de liquidación
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	oct-20	Liquidado
Proyectamos Colombia SAS	654-21	\$ 341	-	feb-22	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





FONDO COLOMBIA EN PAZ



Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 24.591

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Reincorporación



Nombre corto	Valor
Disponible Reincorporación	\$ 21.326
Implementación Proyecto Piscícola	\$ 3.265



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 1.327

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Apoyo al fortalecimiento institucional	ARN	\$ 1.327	<ol style="list-style-type: none"> 1. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO – CODES 2. CORPORACION PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL – CORPROGRESO 3. PARES-CORPOINTEGRAL 	14 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 812.050

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 627.591	-	Sep17 - Nov22	88%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 94.483	-	Jun18 - Nov22	84%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 35.536	-	Sep17 - Nov22	94%
Suministros víveres secos	Integralservicios SAS	493-22	\$ 25.535	-	Pendiente acta	0%
Suministros víveres secos	Integralservicios SAS	261-22	\$ 20.447	-	Mar22 - Oct22	61%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones	239-21	\$ 2.528	\$ 375	Jul21 - Dic22	27%
Fortalecimiento y Comercialización de Proyectos Productivos	Fiducoldex, vocera del fideicomiso Innpulsa Colombia	438-22	\$ 2.000	\$ 200	Jul22 - Ago24	0%
Prestación de Servicios	17 CPS	N/A	\$ 1.787	-	Feb21 - Nov22	83%
Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales	Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	\$ 514	-	Jul21 - Oct22	20%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 377	-	N/A	95%

\$ 812.050

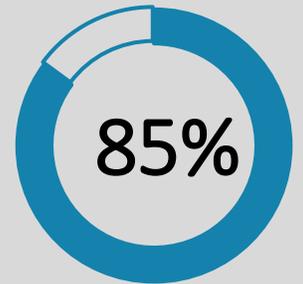

EJECUCIÓN

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 812.050

Terminados

Reincorporación

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adecuación espacio físico para acopio, preservación y conservación de productos agropecuarios	Monval Ingenieria S.A.S.	490-22	\$ 205	-	Pendiente acta	0%
Arrendamiento de Equipos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 223	-	Jul20 - Dic22	59%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	381-22	\$ 100	-	Jun22 - Dic22	18%
Transporte Terrestre	Transportes especiales F.S.G. SAS.	430-22	\$ 100	-	Ago22 - Feb23	0%
Licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS.	435-22	\$ 47	-	Jul22 - Jul23	0%

\$ 812.050

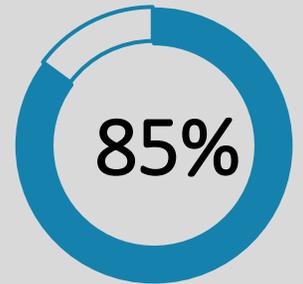

EJECUCIÓN



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 105.302

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	-	abr-21	Liquidado
UT FCP 2021	217-21	\$ 25.546	-	mar-22	En proceso de liquidación
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	mar-18	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	jul-22	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 1.977	\$ 200	ago-20	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	245-20	\$ 1.500	\$ 600	dic-21	Liquidado
CODES	907-21	\$ 1.213	-	ago-22	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 5 CPS	N/A	\$ 595	-	feb-20	En proceso de liquidación
Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	jul-21	Liquidado
Prestación de Servicios 20 CPS	N/A	\$ 971	-	feb-20	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	abr-20	Liquidado
Subatours SAS	286-21	\$ 84	-	jun-22	Liquidado
Transporte Terrestre	209-21	\$ 71	-	abr-22	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	\$ 60	-	may-21	Liquidado

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 105.302

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
ESRI Colombia S.A.S	608-22	\$ 45	-	Jul-22	En proceso de liquidación
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	jul-21	Liquidado
BIM Latinoamérica SAS	629-21	\$ 12	-	ago-22	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ -	-	nov-19	Liquidado

Reincorporación



FONDO COLOMBIA EN PAZ



Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019



Jurisdicción Especial de Paz





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 159

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible JEP	\$ 159

Jurisdicción
Especial de
Paz





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.906

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	239 CPS	\$ 10.733	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	ene-21	Liquidado
Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	jun-22	En proceso de liquidación
Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$ 584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	Liquidado
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$77	may-22	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Gastos de Desplazamiento	N/A	\$57	jul-22	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022

Jurisdicción
Especial de
Paz



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
ENFOQUE TERRITORIAL



FONDO COLOMBIA EN PAZ



Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 39.581

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	\$ 39.581

Primera
Infancia



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 2.598

Terminados

Primera Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Dotación Pedagógica	Consortia PDET 2021	1123-21	\$ 1.895	-	Feb22 - Oct22	13%
Interventoría	Consortio S&T 2021	923-21	\$ 528	-	Oct21 - Oct22	73%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 CPS	N/A	\$ 121	-	May21 - Oct22	88%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 53	-	N/A	89%

\$ 2.598

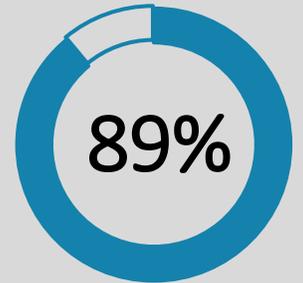

EJECUCIÓN



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.699

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$3.877	nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	\$3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	\$ 3.069	jul-22	En proceso de liquidación
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 3.052	nov-20	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	ago-20	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	68 CPS	\$2.999	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.391	nov-20	Liquidado
Asesoría y Gestión CÍA SAS	306-22	\$ 1.342	sep-22	En proceso de liquidación
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.387	ago-20	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	8 CPS	\$ 571	sep-19	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	57-19	\$ 160	sep-22	En proceso de liquidación
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	\$ -	nov-21	Liquidado

Primera Infancia



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 43

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	\$ 43

Agencia
Nacional de
Tierras



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.804

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	89 CPS	\$ 2.799	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022

Agencia
Nacional de
Tierras



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



FONDO COLOMBIA EN PAZ



Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 4.450

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

Nombre corto	Valor
Disponible Funcionamiento	\$ 4.222
Arrendamientos	\$ 203
Adecuaciones mobiliario e instalación de redes	\$ 19
Desmante mobiliario	\$ 5



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 41.037

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 15.540	Oct19 - Nov22	89%
Nómina	Su Temporal S.A.S	166-21	\$ 9.838	May21 - May23	96%
Nómina	PEC y CIA. S.A.S.	383-22	\$ 8.773	Jun22 - Abr23	16%
Servicios TIC	IMPRETIC'S E.I.C.E	416-22	\$ 2.508	Ago22 - Ago23	0%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 1.141	Nov18 - Nov22	97%
Auditoría	Ernst & Young S.A.S.	380-22	\$ 707	Jun22 - Abr23	30%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 704	Dic20 - Feb23	80%
Custodia de Documentos	PGD procesos de gestión documental SAS	439-22	\$ 518	Ago22 - Ago23	0%
Tiquetes aéreos	Novatours LTDA	356-22	\$ 300	May22 - May23	18%
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty SegurosS.A.	Póliza	\$ 232	Jul22 - Jul23	100%
Aseo y Cafetería	Grupo empresarial SEISO S.A.S.	465-22	\$ 115	Pendiente acta	0%

\$ 41.037*

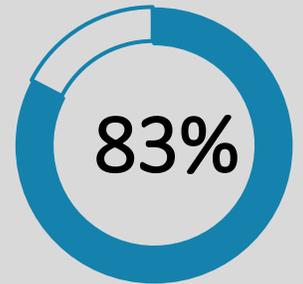

EJECUCIÓN

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a adición en asunción de gastos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 41.037

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	882-21	\$ 100	Oct21 - Oct22	90%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales Nueva Era SAS	379-22	\$ 100	Jun22 - Jun23	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	90%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic22	16%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic22	53%
Póliza	Zurich Colombia seguros S.A.	Póliza	\$ 7	Jul22 - Jul23	100%

\$ 41.037*

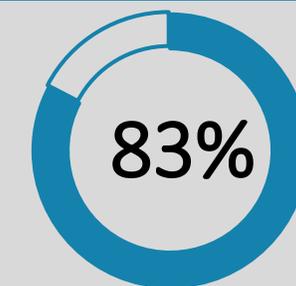

EJECUCIÓN

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a adición en asunción de gastos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.459

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Nomina	N/A	\$ 6.510	jul-22	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 5.701	abr-21	Liquidado
IMPRETIC'S E.I.C.E	304-21	\$ 2.375	jul-22	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.249	may-21	Liquidado
Ernst & Young	55-19	\$ 964	dic-20	Liquidado
Ernst & Young	867-20	\$ 947	abr22	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 560	dic-20	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$471	sep-22	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	nov-18	Liquidado
Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 222	ago-22	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	Liquidado

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.459

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	jul-21	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	jul-22	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 137	sep.22	En proceso de liquidación
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 133	mar-21	Liquidado
Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	dic-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Syneris	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Transportes Especiales A&S SAS	549-21	\$ 90	may-22	En proceso de liquidación
Nexura Internacional SAS	554-21	\$ 83	feb-22	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	\$ 31	sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	\$ 30	jul-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	jun-20	Liquidado

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.459

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	oct-20	Liquidado
Zurich Colombia Seguros SA	N/A	\$ 8	jul-22	Liquidado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	\$ 7	jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	Liquidado
Arquiredes construcciones S.A.S.	462-22	\$ 6	sep-22	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	\$ 5	ago-21	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	\$ 1	mar-20	Liquidado

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 4.058

Convocatoria
\$ 315

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 9.694

Terminado
\$ 26.019

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 4.058

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Disponible Estabilización	\$ 3.920
Contratos de prestación de servicios	\$ 138



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria
\$ 315

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	\$ 315	12 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 9.694

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	36 CPS	N/A	\$4.740	Mar21 - Ene23	85%
Operador Logístico	Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S.	427-22	\$1.050	Sep22 - Sep23	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.416	N/A	62%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	1002-21	\$1.300	Dic21 - Dic22	100%
Posicionamiento marca PAZ PAISSANA	Sociedad hotelera Tequendama SA	428-22	\$ 1.170	Jul22 - Oct22	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 18	N/A	100%

\$ 9.694*

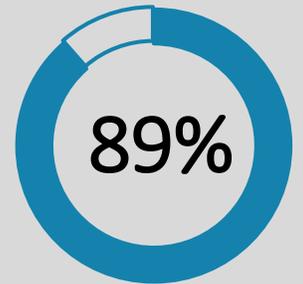

EJECUCIÓN

Estabilización



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 26.019

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	96 CPS	\$ 8.761	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	37 CPS	\$ 3.461	ago-18	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$ 2.700	ago-22	En proceso de liquidación
Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$ 2.550	ene-22	En proceso de liquidación
Infotíc S.A.	238-21	\$ 1.259	ago-22	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 495	jul-19	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$ 365	sep-22	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	sep-21	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	1029-21	\$ 91	jun-22	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	sep-19	Liquidado
Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	jun-22	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$ 16	dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	\$ 3	jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$ 0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022

Estabilización



PROYECTOS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Sociedad de
Activos
Especiales



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia
Sostenible



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ



BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 57.561

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



BID Préstamo

Nombre corto	Valor
Disponible BID Préstamo	\$ 52.643
Apoyos económicos	\$ 4.705
Levantamiento de información, sistematización y análisis de indicadores	\$ 198
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 14



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Santa Isabel	122-22	\$ 6.693	\$ 4.032	Mar22 - Mar23	22%
	DEBISAMCO	108-22	\$ 6.147	\$ 4.778	Abril22 - Oct23	20%
	Fundación ambientalistas y reforestadores de Colombia	369-22	\$ 5.708	\$ 2.446	Jun22 - Jun24	25%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Nov22	30%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Nov22	21%
	Corporacion Lexcom Colombia	104-22	\$ 5.361	\$ 6.090	Jun22 - Jun24	16%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	48%
	Conservation International	740-20	\$ 4.826	\$ 8.345	Nov20 - Ene23	28%
	ASOPATÍA	304-22	\$ 4.582	\$ 1.964	May22 - May24	24%
	FEDEGAN	290-22	\$ 4.058	\$ 2.776	Abr22 - Abr23	21%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Nov22	51%
	Consortio ambiental ecosistemas tropicales 2021	361-22	\$ 4.394	\$ 2.033	Jun22 - Jun24	24%
Consortio ambiental ecosistemas tropicales 2021	341-22	\$ 3.709	\$ 2.009	Jun22 - Jun24	23%	

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	39%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Ene24	46%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	106-22	\$ 3.285	\$ 6.673	Mar22 - Mar23	12%
	Masbosques	260-22	\$ 3.236	\$ 2.034	May22 - May24	21%
	Corporación PBA	283-22	\$ 3.204	\$ 1.381	Abr22 - Abr24	24%
	Universidad de Ibague	291-22	\$ 2.823	\$ 1.251	Jul22 - Jul24	24%
	ONF Andina	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	42%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Nov22	36%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	47%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Nov22	61%

\$ 523.030

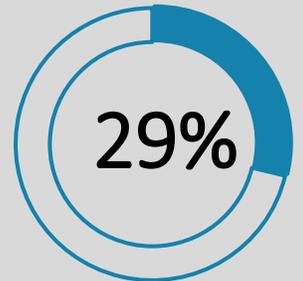

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASPROPISAT	342-22	\$ 2.457	\$ 3.571	May22 - Nov23	14%
	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	\$ 2.293	\$ 2.221	May21 - Feb23	36%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	107-22	\$ 2.214	\$ 4.674	Mar22 - Mar23	11%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	44-22	\$ 2.151	\$ 2.234	Jun22-Jun23	17%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.091	\$ 1.338	Nov20 - Feb23	43%
	FUDESCO	508-22	\$ 1.980	\$ 2.096	Pendiente acta	0%
	Unión Temporal Cindap - Cordep	301-22	\$ 1.979	\$ 3.346	May22 - Sep23	13%
	CRC	905-21	\$ 1.966	\$ 1.091	Nov21 - Feb23	23%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	17%
	Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov20 - Nov22	20%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	60%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - Nov22	32%
	Resguardo indígena YUPKA IROKA	370-22	\$ 1.815	\$ 779	Jun22 - Jun24	24%
	Codesarrollo	276-22	\$ 1.800	\$ 1.385	Mar22 - Sep24	20%
	CCI	259-22	\$ 1.656	\$ 1.314	Mar22 - Sep23	20%
	COGAINCHAIRÁ	271-22	\$ 1.602	\$11.066	Mar22 - Mar23	9%
Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta del río Palo	297-22	\$ 1.598	\$ 684	Mar22 - Jul23	25%	

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación para el desarrollo integral de las comunidades – SINERGIA	374-22	\$ 1.455	\$ 624	Jun22 - Jun24	25%
	Unión temporal agrofuturo del norte	343-22	\$ 1.440	\$ 2.184	May22 - May24	14%
	ASOPRODEMA	295-22	\$ 1.341	\$ 1.647	May22 - Nov23	16%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Nov23	24%
	UNAD	281-22	\$ 1.260	\$ 1.251	May22 - Nov23	18%
	CETEC	434-22	\$ 1.260	\$ 846	Pendiente acta	21%
	Fundación Horizonte	269-22	\$ 1.206	\$ 1.733	May22 - May23	14%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	\$ 1.207	\$ 990	Jun21 - Feb23	38%
	Instituto Amazonico de investigaciones científicas SINCHI	98-22	\$ 1.204	\$ 516	Jun22 - Dic23	24%
	SAVIA AMBIENTAL S.A.S	302-22	\$ 1.197	\$ 501	May22 - May24	25%
	CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - Nov22	54%
	Universidad surcolombiana	125-22	\$ 1.170	\$ 1.799	Pendiente acta	0%
	Consortio Prosercot Asociados	378-22	\$ 1.170	\$ 907	Jun22 - Sep23	20%
	Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB	314-22	\$ 1.169	\$ 878	Abr22 - Oct23	0%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la Plata Bahía Malaga	382-22	\$ 1.167	\$ 500	Pendiente acta	24%
Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Nov22	47%	

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Nov22	40%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Nov22	59%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Nov20 - Dic22	57%
	Comité de Ganaderos del Tolima	36-22	\$ 1.107	\$ 739	Mar22 - Mar23	21%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.101	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	15%
	ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Nov20 - Dic22	17%
	GESTANDO	277-22	\$ 1.089	\$ 987	Abr22 - Oct23	18%
	FUDESCO	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov20 - Nov22	35%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación EQUAL Colombia	123-22	\$ 1.064	\$ 1.307	Mar22 - Mar23	0%
	Fundación Orinoquia Biodiversidad	128-22	\$ 1.051	\$ 450	Abr22 - Abr24	24%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	\$ 1.021	\$ 5.012	Abr22 - Abr24	0%
	PROYECTO NASA	345-22	\$ 1.008	\$ 3.864	Pendiente acta	0%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov20 - Nov22	40%
	ASOPROTECCO	262-22	\$ 981	\$ 806	May22 - May23	19%
	UNIMINUTO	43-22	\$ 981	\$ 670	Mar22 - Mar23	21%
	PRAGRO SAS	41-22	\$ 977	\$ 708	Mar22 - Mar23	20%
	RAPE REGIÓN CENTRAL	443-22	\$ 956	\$ 1.814	Pendiente acta	0%

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación asesorías e investigaciones profesionales	58-22	\$ 954	\$ 852	Mar22 - Sep23	18%
	Consortio PBA	274-22	\$ 936	\$1.028	Mar22 - Sep23	17%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%
	CAFISUR	258-22	\$ 927	\$ 3.479	May22 - Nov23	7%
	Fundación Horizonte	57-22	\$ 918	\$ 1.418	May22 - May23	14%
	COSURCA	101-22	\$ 917	\$ 782	Abr22 - Oct23	19%
	CORPORACION PBA	115-22	\$ 917	\$ 623	Abr22 - Abr24	21%
	CORPOYARUMOS	114-22	\$ 909	\$ 834	May22 - Nov23	18%
	FUNDAHERENCIA	275-22	\$ 907	\$ 617	May22 - Nov23	21%
	Grupo asociativo de cafeteros Villalibano	109-22	\$ 900	\$ 1.350	Abr22 - Abr23	14%
	CAFISUR	272-22	\$ 900	\$ 1.646	May22 - Nov23	12%
	Consortio "RAÍCES"	362-22	\$ 900	\$ 614	Jun22 - Jun24	21%
	CODES	300-22	\$ 900	\$ 2.147	May22 - Nov23	10%
	COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Nov22	30%
	Innovakit SAS BIC	48-22	\$ 900	\$ 932	Mar22 - May23	17%
GENYTEC	112-22	\$ 900	\$ 666	Abr22 - Abr23	0%	

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	FUN Lantano	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov20 - Nov22	51%
	Proyecto NASA	313-22	\$ 888	\$ 711	May22 - Nov23	19%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Nov22	16%
	Futuro y desarrollo comunitario	120-22	\$ 873	\$ 2.690	Jun22 - Jun24	9%
	Fundación Pancitas Felices	292-22	\$ 873	\$ 855	May22 - Nov23	18%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	\$ 864	\$ 1.184	Mar22 - Mar23	0%
	COMICACAO	344-22	\$ 864	\$ 2.312	May22 - May24	10%
	FUDESCO	510-22	\$ 851	\$ 1.161	Pendiente acta	0%
	COSURCA	46-22	\$ 861	\$ 1.115	Abr22 - Abr23	0%
	CINDAP	45-22	\$ 833	\$ 639	Jun22 - May23	20%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov20 - Nov22	28%
	Corporación Colombia Internacional CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov20 - Nov22	17%
	Corporación Colombia Internacional CCI	257-22	\$ 819	\$ 869	Mar22 - Mar23	17%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Nov22	46%
Corporación Colombia Agropecuaria	273-22	\$ 801	\$ 2.435	Jun22 - Jun24	9%	

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación reserva natural la Palmita Centro de Investigación	308-22	\$ 794	\$ 340	Pendiente acta	0%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov20 - Nov22	46%
	FTV	40-22	\$ 783	\$ 652	Mar22 - Mar23	19%
	Prodesarrollo Limitada	299-22	\$ 783	\$1.029	May22 - May23	15%
	ASOHECA	859-20	\$ 777	\$4.014	Nov20 - Oct22	16%
	ASOCALM	324-22	\$ 773	\$ 659	May22 - May23	19%
	Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo	105-22	\$ 766	\$ 559	Mar23 - Mar24	20%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$2.398	Nov20 - Nov22	17%
	Innovakit SAS BIC	51-22	\$ 755	\$ 693	Mar22 - Mar23	18%
	ASOM	124-22	\$ 720	\$ 950	Mar22 - Sep23	15%
	Corpoamazonía	245-22	\$ 720	\$ 1.081	Jun22 - Jun23	14%
	FUNDECERP	131-22	\$ 719	\$ 648	May22 - May23	18%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$ 1.832	Dic20 - Dic22	20%
	FUNINSUR	113-22	\$ 693	\$ 595	Mar22 - Sep23	19%

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	37-22	\$ 684	\$1.375	Mar22 - Mar23	12%
	CADI	103-22	\$ 675	\$ 626	Mar22 - Jun23	18%
	CORPOJAGUAR	56-22	\$ 675	\$ 460	Abr22 - Abr24	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	255-22	\$ 666	\$ 474	Mar22 - Jun23	20%
	Corporación Ambiental SIE	298-22	\$ 666	\$ 473	May22 - May23	20%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Nov22	58%
	Fundación Planeta Rural	59-22	\$ 662	\$ 487	Mar22 - Sep23	20%
	Corporacion para la sostenibilidad de la subcuenca del rio palo	346-22	\$ 662	\$ 288	May22 - May23	24%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Nov22	42%
	Asesorias y Sevicios de Ingenieria	54-22	\$ 657	\$ 535	Abr22 - Abr23	19%
	FUNDARREGION	267-22	\$ 657	\$ 525	Abr22 - Abr23	19%
	ASOGANADO	787-20	\$ 648	\$1.203	Nov20 - Nov22	35%
	Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz	263-22	\$ 648	\$ 513	Mar22 - Mar23	21%

\$ 523.030

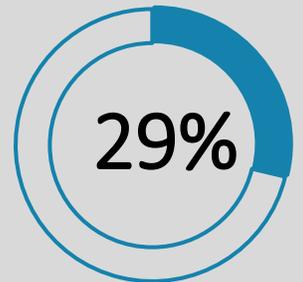

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Corporación PBA	110-22	\$ 638	\$ 724	Abr22 - Abr24	16%
	CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Nov20 - Nov22	41%
	ASI	53-22	\$ 637	\$ 605	Mar22 - Mar23	18%
	Corpoamazonia	50-22	\$ 630	\$ 463	Feb22 - Ene23	40%
	Fundación integral para el desarrollo sostenible Findes	323-22	\$ 630	\$ 421	May22 - May23	21%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	42-22	\$ 630	\$ 614	Mar22 -Feb23	18%
	Union Temporal Agromanifue	305-22	\$ 630	\$ 576	Abr22 - Mar23	18%
	FUNDARREGION	266-22	\$ 630	\$ 546	Abr22 - Jul23	19%
	U.T AGROMANIFUE	289-22	\$ 621	\$ 438	Abr22 - Abr23	41%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	47-22	\$ 621	\$ 437	Jun22 - Jun23	21%
ASI	55-22	\$ 621	\$ 485	Mar22 - Mar23	20%	

\$ 523.030

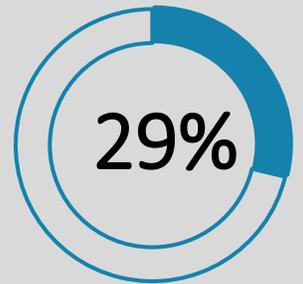

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Planeta Rural	268-22	\$ 619	\$ 436	Mar22 - Mar23	21%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Nov20 - Oct22	60%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic20 - Dic22	60%
	Acuicula Green Fish SAS	303-22	\$ 607	\$ 419	Abr22 - Abr23	21%
	Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad SERVICURE	129-22	\$ 603	\$ 4.345	Mar22 - Mar23	4%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Nov22	42%
	CAFISUR	100-22	\$ 603	\$ 577	May22 - May23	18%
	Corporación Colombia Internacional CCI	284-22	\$ 593	\$ 449	Mar22 - Mar23	20%
	PRAGRO SAS	39-22	\$ 602	\$ 435	Mar22 - Mar23	20%
	UNAD	282-22	\$ 600	\$ 408	May22 - Nov23	21%
	GENYTEC	111-22	\$ 600	\$ 400	Abr22 - Abr23	0%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Nov22	50%
	ASOPRODAMET	285-22	\$ 593	\$ 836	Mar22 - Abr23	0%
	Instituto Amazónico de Investigaciones científicas SINCHI	265-22	\$ 591	\$ 632	Jun22 - Jun24	17%
	Camara de Comercio de Arauca	293-22	\$ 591	\$ 494	May22 - Nov23	19%
	Corporación Colombia Internacional CCI	256-22	\$ 585	\$ 497	Mar22 - Mar23	19%
Corpoamazonía	38-22	\$ 585	\$ 424	Ene22 - Ene23	20%	

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	CORSOC-ONG	127-22	\$ 585	\$ 789	Mar22 - Mar23	30%
	Federación nacional de cafeteros de Colombia	126-22	\$ 584	\$ 474	Jul22 - Jun23	19%
	Bolivar - Asocafe	121-22	\$ 584	\$ 389	Mar22 - Mar23	0%
	CINDAP	49-22	\$ 585	\$ 447	Mar22 - Mar23	20%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 572	\$ 1.676	Nov20 - Nov22	25%
	Fundación Hijos de la Sierra Flor	264-22	\$ 585	\$ 638	Mar22 - Mar23	17%
	ASOES	286-22	\$ 416	\$5.547	Mar22 - Mar23	0%
	Instituto Amazonico de investigaciones cientificas SINCHI	97-22	\$ 327	\$ 780	Jun22 - Jun24	0%
	CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Nov22	60%
CECIDIC	368-22	\$ 244	\$ 196	Pendiente acta	0%	

\$ 523.030

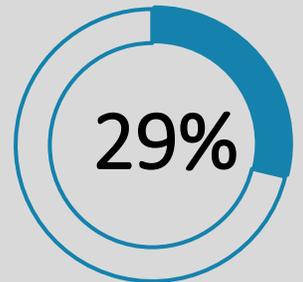

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 523.030

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	43 CPS	N/A	\$ 5.122	-	Mar21 - Ene23	73%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	-	Ene21-N/A	100%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	\$ 146	-	Nov21 - Nov22	30%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 118	-	N/A	80%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Feb23	56%
Operador Logístico	Imagroup Colombia S.A.S	461-22	\$ 50	-	Ago22 - Dic22	0%
Libro y Brochure	Mas medios diseño y comunicación estratégica S.A.S	492-22	\$ 10	-	Pendiente acta	0%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	\$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	100%

\$ 523.030

29%

EJECUCIÓN

BID Préstamo





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 78.543

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
58 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 3.860	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
28 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 2.647	-	Oct 2019	Liquidado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$ 2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$ 1.929	-	May 2020	Liquidado
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$ 1.927	-	May 2020	Liquidado
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Jun 2021	Liquidado
ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Ago 2022	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$ 1.538	-	May 2020	Liquidado
MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Ago 2022	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Jun 2021	Liquidado
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$ 1.527	-	May 2020	Liquidado
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.349	-	Jun 2021	Liquidado
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$ 1.438	-	May 2020	Liquidado
ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Sep 2022	En proceso de Liquidación
UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.297	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Jun 2021	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
EN FUNCIÓN TERRITORIAL

BID Préstamo



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 78.543

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	-	Jul 2020	Liquidado
Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Jun 2021	Liquidado
Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Jun 2021	Liquidado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Sep 2021	Liquidado
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Oct 2021	Liquidado
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Jun 2021	Liquidado
INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Jun 2021	Liquidado
APCA Corporación para el Desarrollo ral y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Jun 2021	Liquidado
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Jun 2021	Liquidado
CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Sep 2022	En proceso de Liquidación
CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Sep 2022	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Sep 2022	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Jul 2021	Liquidado
Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Jun 2021	Liquidado
Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Feb 2022	En proceso de Liquidación
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 78.543

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Jul 2022	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
CORPOTUNIA	782-20	\$ 666	\$ 2.889	Mar 2022	En proceso de Liquidación
Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Feb 2022	En proceso de Liquidación
Universidad de los Andes	309-20	\$ 655	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Mar 2022	En proceso de Liquidación
Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Sep 2022	En proceso de Liquidación
Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Sep 2022	En proceso de Liquidación
SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Jul 2022	En proceso de Liquidación
ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Mar 2022	En proceso de Liquidación
FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Mar 2022	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	\$ 479	-	Sep 2021	Liquidado
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 10	-	Abr 2022	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep 2020	Liquidado
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	-	-	Nov 2021	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	855-20	-	-	May 2022	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



PRODIGIOS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

BID Préstamo



FONDO COLOMBIA EN PAZ



BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano de Desarrollo



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 5.280

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible BID Facilidad	\$ 5.280

BID Facilidad



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 26.088

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.550	\$1.931	Nov20 - Dic22	45%
	APROCASUR	279-22	\$ 1.211	\$ 807	Mar22 - Jun23	42%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.037	\$ 717	Nov20 - Dic22	59%
	Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	\$ 1.370	\$1.309	Feb21 - Nov23	51%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	117-22	\$ 972	\$ 663	Mar22 - Mar23	21%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	118-22	\$ 900	\$ 875	Mar22 - Mar23	18%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	119-22	\$ 900	\$ 693	Mar22 - Jun23	20%
	La fundación de mineros S.A	280-22	\$ 783	\$ 770	Jun22 - Jun24	18%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 740	\$1.038	Ago20 - Ene23	27%
	CCI	278-22	\$ 687	\$ 458	Mar22 - Jun23	21%
	UNAD	130-22	\$ 639	\$ 665	May22 - May23	17%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 595	\$1.942	Feb21 - Feb23	14%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 608	\$ 401	Sep20 - Oct22	44%
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	Corporación Colombiana internacional	844-21	\$ 447	\$ 366	Oct21 - Nov22	54%
Prestación de Servicios Persona Natural	5 CPS	N/A	\$ 395	-	Oct21 - Feb23	40%

\$ 26.088*

42%

EJECUCIÓN

BID Facilidad





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 26.088

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	\$ 154	-	Feb21 - N/A	67%
		44-20	\$ 100	-	Feb21 - N/A	100%
Diseño e impresión material visual	Sinergia P&M S.A.S	326-22	\$ 86	-	Abr22 - Dic22	0%
Campaña BIBO	Comunican S.A.	457-22	\$ 75	-	Ago22 - May23	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 72	-	N/A	60%
Divulgación de avances y resultados	Editorial la republica SAS	444-22	\$ 48	-	Pendiente de acta	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 24	-	Nov19 - Feb23	57%
		447-22	\$ 20	-	Ago22 - Mar24	0%
		357-22	\$ 9	-	Jul22 - Jul23	54%
Página web	High Quality Solutions La EU	353-22	\$ 21	-	Jun22 - Jun23	0%
Desarrollar e implementar videos tutoriales	Compañía pedagógica SAS	482-22	\$ 10	-	Pendiente de acta	0%

\$ 26.088*

42%

EJECUCIÓN



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.957

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Sep 2021	Liquidado
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	\$ 1.309	-	Sep 2021	Liquidado
22 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 717	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
2 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 181	-	Nov 2019	Liquidado
Subatours S.A.S.	412-19	\$ 3	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ



Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 4.277

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

Nombre corto	Valor
Disponible Herencia Colombia	\$ 4.277



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 21.205

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia	1062-21	\$ 6.200	\$ 2.658	Dic21 - Dic22	45%
Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura	Consorcio Ingeurbano	1026-21	\$4.602	-	Abr22 - Nov22	0%
Estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana	Corporación grupo empresarial ASES	418-22	\$ 2.776	-	Ago22 - Abr23	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	21 CPS	N/A	\$2.057	-	Dic21 - Ago23	41%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Nevados	321-22	\$ 1.561	-	May22 - Dic22	0%
Tiquetes aéreos	Publica SAS	327-22	\$ 500	-	Nov22 - Abr23	0%
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	Consorcio Interparques 22	322-22	\$ 330	-	Abr22 - Dic22	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	2%
Interventoría	Consorcio Macaram	419-22	\$ 222	-	Ago22 - May23	0%

\$ 21.205



EJECUCIÓN

Herencia Colombia



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 420

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	3 CPS	\$ 266	Sep-21	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	2 CPS	\$ 154	Ago-22	En proceso de liquidación

Herencia
Colombia



FONDO COLOMBIA EN PAZ



Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 1.765

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 1.765

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 104.904

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	\$ 10.000	-	Sep21 - Dic22	60%
Implementar procesos de restauración ecológica	Masbosques	224-22	\$ 7.441	\$ 210	Feb22 - Abr23	75%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	\$ 6.000	\$ 576	Nov21 - Nov22	68%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	\$ 7.000	\$ 3.010	Sep21 - Mar23	36%
		708-21	\$ 5.000	\$ 2.150	Sep21 - Mar23	38%
Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales	Masbosques	1047-21	\$ 9.990	\$ 190	Dic21 - Feb23	64%
Prestación de Servicios Persona Natural	78 CPS	N/A	\$ 5.723	-	Jun21 - Ago23	43%
Adquisición de insumos para dotación de viveros	Universidad de Cordoba	152-22	\$ 5.686	-	Mar22 - Feb23	18%
Adecuación Centro de información y monitoreo ambiental	Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarenia	1090-21	\$ 4.106	-	Mar22 -Dic22	25%
Estrategias pedagógicas y contenidos educativos	Universidad Nacional abierta y a distancia	1121-21	\$ 3.320	-	Feb22 - Oct22	70%

\$ 104.904

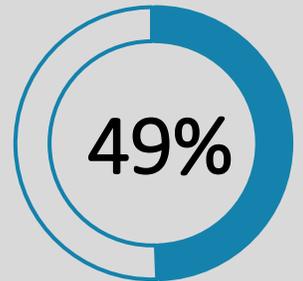

EJECUCIÓN

Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 104.904

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Arquiteck y asociados SAS	309-22	\$ 3.278	-	Abr22 - Oct22	2%
	Consorcio Arqmara Tayrona	311-22	\$ 3.008	-	Abr22 - Nov2	0%
	Consorcio Arqmara Corales	319-22	\$ 871	-	May22 - Oct22	0%
Implementar acciones de restauración ecológica	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia	1089-21	\$ 2.975	\$ 1.275	Mar22-Mar23	11%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	\$ 2.940	\$ 1.260	Jul21 - Mar23	46%
Servicios de preproducción, producción y divulgación del programa de siembra de 180 millones de árboles	RTVC	216-22	\$ 1.728	-	Feb22 - Dic22	28%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Iguaque	316-22	\$ 1.606	-	Mar22 - Sep23	0%
Implementar proyecto piloto de restauración activa	Corpocaldas	35-22	\$ 1.500	\$ 287	Ene22 - Mar23	40%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	\$ 1.469	\$ 630	Nov21 - Mar23	31%
Negocios verdes	Innpulsa Colombia	1028-21	\$ 1.300	\$ 500	Ene22 - Feb23	14%

\$ 104.904

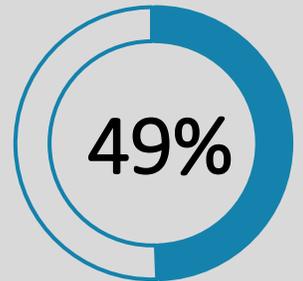

EJECUCIÓN

Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 104.904

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Estoraques	367-22	\$ 1.235	-	Ago22 - Ene23	0%
Generar información de emisiones atmosféricas	Universidad pontifica Bolivariana	1083-21	\$ 1.000	\$ 440	Ene22 - Nov22	7%
Obtener información de la Biodiversidad presente en el Tejido Urbano	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	1048-21	\$ 1.000	\$ 301	Ene22 - Ene23	23%
Implementar un esquema de pago por servicios	Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge	219-22	\$ 823	\$ 82	Feb22 - Feb23	9%
Tiquetes aéreos	Publica SAS	327-22	\$ 685	-	Abr22 - Abr23	12%
Alquiler de equipos de tecnología	EMTEL E.S.P.	906-21	\$ 600	-	Nov21 - Oct22	73%
Restauración Ecológica	Saving The Amazon	1027-21	\$ 510	\$ 219	Dic21 - Mar23	14%
Incentivar procesos reforestación	Coolechera	220-22	\$ 486	\$ 209	Ene22 - Ene23	21%
Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas	Policía Nacional	689-21	\$ 400	-	Nov21 - Nov22	100%

\$ 104.904

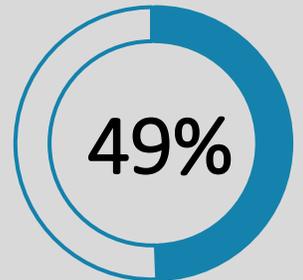

EJECUCIÓN

Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 104.904

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	29%
Cartilla educativa	Fundación Natura	843-21	\$ 206	\$ 91	Nov21 - Oct22	21%
Interventoría	Corporación Grupo Empresarial ASES	310-22	\$ 232	-	Abr22 - Nov22	0%
		312-22	\$ 286	-	Abr22 - Dic22	0%
	Consortio estoraques HC	420-22	\$ 178	-	Ago22 - Feb23	0%
	Consortio JD 044	317-22	\$ 160	-	Mar22 - Oct22	0%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA Ltda.	425-22	\$ 74	-	Ago22 - Feb23	0%
Aunar esfuerzos técnicos y financieros con IIAP	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico	1112-22	\$ 200	\$ 158	Ene22 - Nov22	34%

\$ 104.904

49%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 21.444

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Invemar	181-22	\$ 7.434	-	Jul 22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	86 CPS	\$ 5.119	-	Sep 21	En proceso de Liquidación
Masbosques	774-21	\$ 4.000	\$ 172	Sep 22	En proceso de Liquidación
Ecoflora SAS	772-21	\$ 2.463	-	Jun 22	En proceso de Liquidación
Valencia Producciones FX	878-21	\$ 757	-	Abr 22	En proceso de Liquidación
Wework	720-21	\$ 756	-	Sep 22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	9 CPS	\$ 327	-	Oct 21	Liquidado
Telecafé Limitada	1084-21	\$ 200	-	Mar 22	En proceso de Liquidación
703 S.A.S.	709-21	\$ 91	-	Oct 21	Liquidado
Pradilla Nuñez SAS	911-21	\$ 75	-	Dic 21	En proceso de Liquidación
I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	\$ 50	-	Dic 21	En proceso de Liquidación

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 4.680

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible ANT 2019	\$ 4.680

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 16.982

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 10.123	N/A	100%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 2.230	Sep21 - Mar23	50%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 1.344	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 1.303	Jul21 - Ene23	10%
Levantamiento de información y diligenciamiento de FISO	Consultores en información Infometrika S.A.S.	466-22	\$ 1.982	Pendiente de acta	0%

\$ 16.982

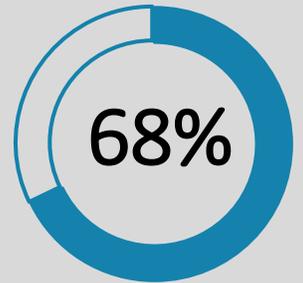

EJECUCIÓN

Agencia Nacional de Tierras 2019



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 49

Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 49	May 21	Liquidado

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ



KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 47.519

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible KFW	\$ 47.519

KFW



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 5.928

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	Gopa Infra GMBH Sucursal Colombia	355-22	\$ 5.928	Ago22 - Ago25	0%

\$ 5.928

0%

EJECUCIÓN

KFW





FONDO COLOMBIA EN PAZ



AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 1.072

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



AFD

Nombre corto	Valor
Estructuración Integral De Proyectos	\$ 735
Disponible AFD	\$ 337



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 700

Terminados

AFD

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	ADEL CCZ - RM - DM	394-22	\$ 700	Jul22 - Mar23	0%

\$ 700

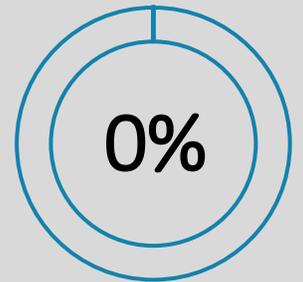

EJECUCIÓN



FONDO COLOMBIA EN PAZ



VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 920

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Visión Amazonía	\$ 618
Procesando lácteos del Caguán	\$ 302

Visión
Amazonía



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 7.454

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 1.894	Nov20 - Ene23	50%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 734	Nov20 - Ene23	0%
	Fundación equal Colombia	123-22	\$ 709	Mar22 - Mar23	87%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	\$ 680	Abr22 - Abr24	88%
	Rape región central	443-22	\$ 637	Pendiente acta	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	\$ 576	Mar22 - Mar23	87%
	ASOHECA	859-20	\$ 518	Nov20 - Oct22	100%
	ASOGANADO	787-20	\$ 432	Nov20 - Nov22	100%
	ASOPRODAMET	285-22	\$ 396	Mar22 - Abr23	87%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 382	Nov20 - Nov22	100%
	ASOES	286-22	\$ 277	Mar22 - Mar23	88%
Instituto amazónico de investigaciones científicas SINCHI	97-22	\$ 218	Jun22 - Jun24	87%	

\$ 7.454

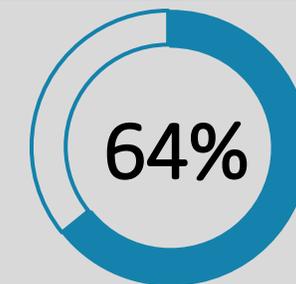

EJECUCIÓN

Visión
Amazonía



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 58.757

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 108

Terminado
\$ 32.149

ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: N/A





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 58.757

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible ICBF Sacúdete	\$ 58.757

ICBF
Sacúdete





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 108

Terminados

ICBF
Sacúdete

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 108	-	N/A	1%

\$ 108

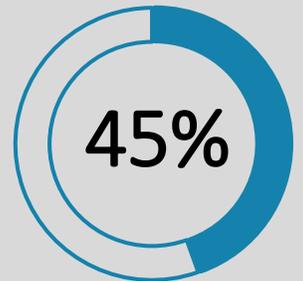

EJECUCIÓN



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.149

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Asociación Colombiana Renaciente	925-21	\$ 2.246	\$ 67	Jun 22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	\$ 1.986	\$ 50	Jun 22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	853-21	\$ 1.655	\$ 42	Abr 22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	968-21	\$ 1.544	\$ 39	Jun 22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	986-21	\$ 1.503	\$ 90	Jul 22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	\$ 1.319	\$ 33	Jun 22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	724-21	\$ 1.232	\$ 43	Abr 22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	740-21	\$ 1.469	\$ 37	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	\$ 995	\$ 38	Abr 22	En proceso de Liquidación
Corporación Trigal del Norte	722-21	\$ 912	\$ 36	Mar 22	En proceso de Liquidación
Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	\$ 965	\$ 24	Abr 22	En proceso de Liquidación
Corporación Oxsan	856-21	\$ 963	\$ 40	Abr 22	En proceso de Liquidación
AEMG	987-21	\$ 856	\$ 26	Jun 22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	839-21	\$ 852	\$ 51	Jun 22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	\$ 805	\$ 32	Mar 22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	808-21	\$ 802	\$ 48	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación Social Creciendo	698-21	\$ 794	\$ 24	Mar 22	En proceso de Liquidación

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.149

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	\$ 940	\$ 24	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación para el desarrollo y soluciones	812-21	\$ 774	\$ 20	Jun 22	En proceso de Liquidación
Prestación de servicios	10 CPS	\$ 735	-	-	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	\$ 725	\$ 29	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación para el desarrollo y soluciones	813-21	\$ 715	\$ 18	Jul 22	En proceso de Liquidación
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	\$ 705	\$ 18	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	\$ 622	\$ 25	Abr 22	En proceso de Liquidación
FAVANSO	855-21	\$ 647	\$ 32	Jun 22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP	988-21	\$ 608	\$ 15	Jun 22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	814-21	\$ 548	\$ 19	Jun 22	En proceso de Liquidación
Corpollanos	924-21	\$ 543	\$ 14	Jun 22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	\$ 511	\$ 20	Mar 22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP IS	840-21	\$ 477	\$ 12	Jun 22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	\$ 477	\$ 12	Jun 22	En proceso de Liquidación

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.149

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundalianza	910-21	\$ 437	\$ 11	Jun 22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	900-21	\$ 349	\$ 12	Jun 22	En proceso de Liquidación
Fundalianza	908-21	\$ 249	\$ 6	Jun 22	En proceso de Liquidación
UT San Pedro	743-21	\$ 120	\$ 5	Sep 22	En proceso de Liquidación
Vélez Tours SAS	217-22	\$ 55	-	Sep 22	En proceso de Liquidación

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Planeación



Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 5.294

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Zona ZEII
Catatumbo

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo	\$ 5.294



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 320

Terminados

Zona ZEII
Catatumbo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Actualización de diseños y estudios técnicos	Unión temporal Ludark	391-22	\$ 210	-	Jul22 - Oct22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 CPS	N/A	\$ 110	-	Jul22 - Oct22	0%

\$ 320

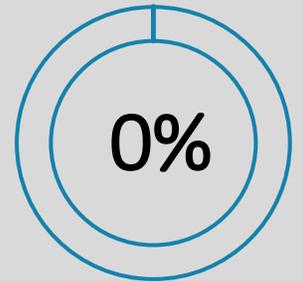

EJECUCIÓN



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Planeación
\$ 39.198

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 538

Ejecución
\$ 12.648

Terminado
\$ 263

Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva



Estado: En Planeación



Temporalidad: Inicialmente por 2 años.

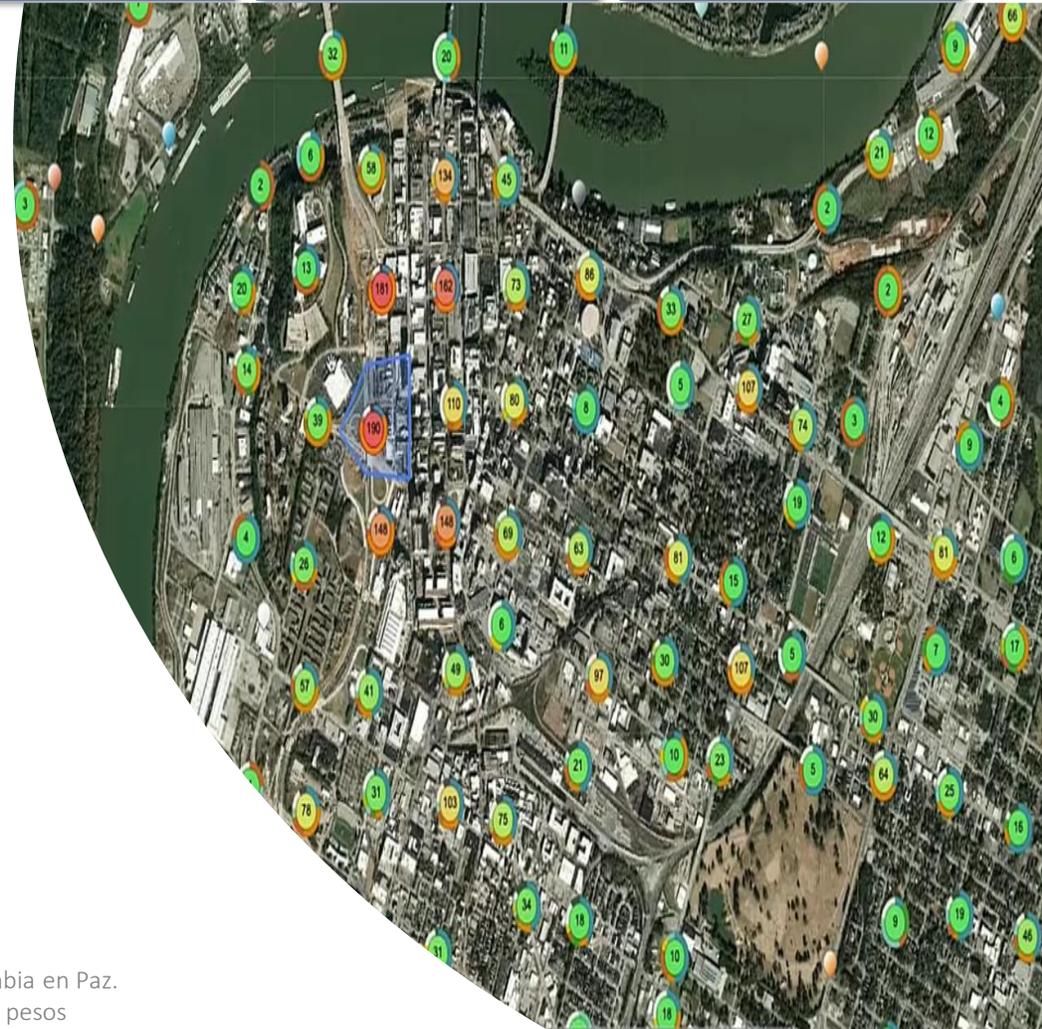



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 39.198

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Catastro Multipropósito	\$ 36.059
Adquirir estaciones de referencia de operación continua CORS	\$ 3.139

Catastro
Multipropósito



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 538

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Realizar captura de coordenadas de precisión	IGAC	CONSORCIO APOYO PDET	\$ 538	14 de octubre de 2022

Catastro Multipropósito





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 12.648

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Generar Productos Cartográficos	UT Carto 044 2022	483-22	\$ 6.354	Pendiente acata	0%
Adquirir Ortoimágenes de los Municipios priorizados	Unión temporal Ingecalculo	387-22	\$ 5.163	Jul22 - Nov22	0%
Adquirir Modelos Digitales del Terreno de los Municipios priorizados	Geospatial S.A.S	386-22	\$ 1.132	Jun22 - Nov22	0%

\$ 12.648



EJECUCIÓN

Catastro Multipropósito





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 263

Catastro
Multipropósito

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural 6 CPS	N/A	\$ 95	-	Abr 22	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural 7 CPS	N/A	\$ 169	-	Mar 22	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 1.160

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 194

Terminado
\$ -

Zona ZEI Catatumbo-Catastro



Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales



Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.




Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander



Estado: Activa (CD FCP No 40)



Temporalidad: 2021-2022

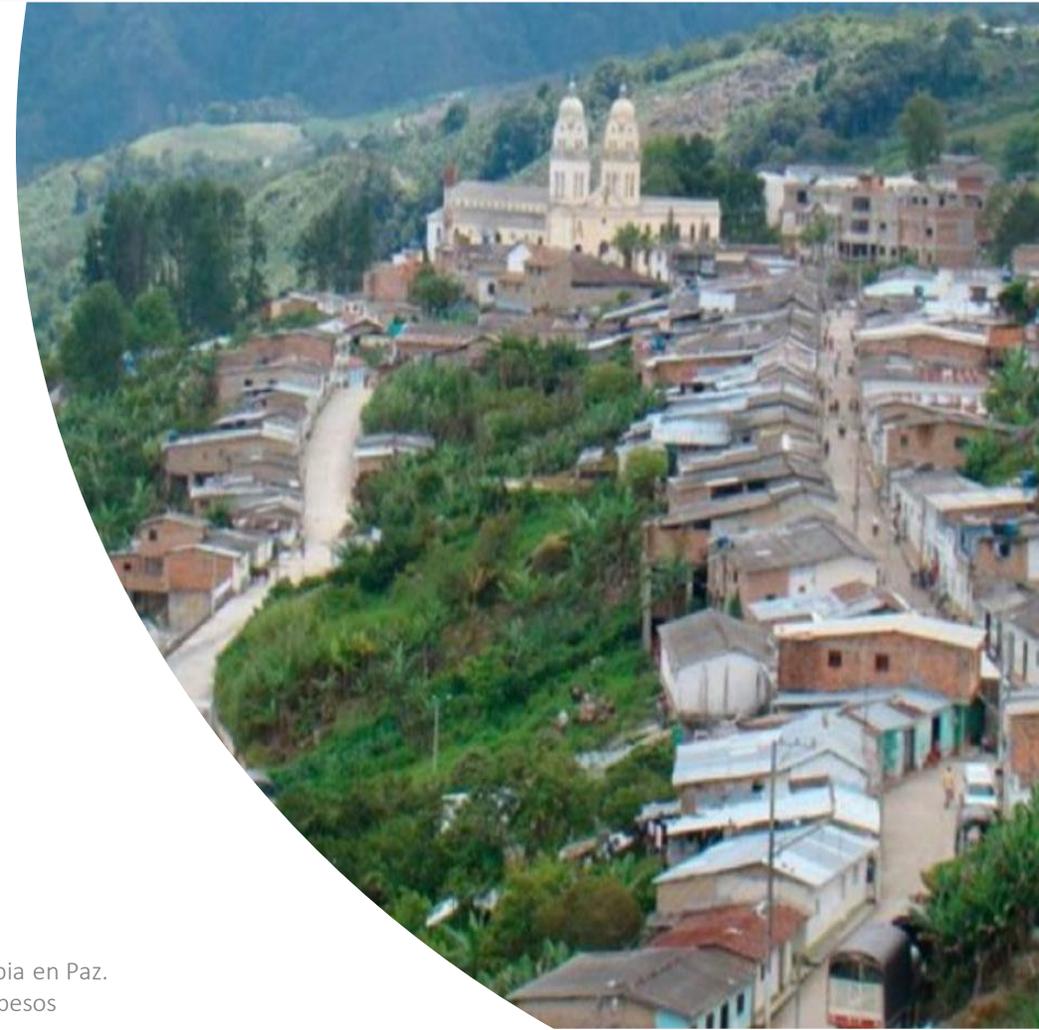



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación
\$ 1.160

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Zona ZEII
Catatumbo
Catastro

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro	\$ 1.160



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 194

Terminados

Zona ZEII
Catatumbo
Catastro

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operación Catastral	Asomunicipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña Y Sur del Cesar	422-22	\$ 194	-	Ago22 - May23	0%

\$ 194



EJECUCIÓN



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ -

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar.	218-22	\$ -	-	May 22	Liquidado

Zona ZEII
Catatumbo
Catastro



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women´s Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.203.483 (contribuciones más intereses)
Total Gastado(USD):	\$ 83.705.932
Gastos administrativos	\$3.074.208
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

contribuciones

Presupuesto Total:

USD 87.203.483

Contribuciones + intereses

Fondos para la Paz con Legalidad



<https://www.fondonuol.org/>



El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

116

Proyectos aprobados
(2016-2018)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund ONU	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund ONU	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

* Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para
la Paz con
Legalidad





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz de ONU.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ USD 117.299.093
Total gastado (USD):	\$ USD 88.870.824
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

150

Proyectos aprobados y

3

Convocatorias

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones
Reino Unido	USD 20.487.671
Chile	USD 120.000
Alemania	USD 23.878.610
Noruega	USD 38.625.590
Corea	USD 500.000
Suecia	USD 9.663.604
Canadá	USD 4.243.484
Fondo Consolidación de la Paz	USD 11.500.000
Suiza	USD 3.027.009
Finlandia	USD 514.439
Irlanda	USD 2.072.309
SDG Fund	USD 283.443
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.250.000
Total:	USD 117.299.093

Fondos para la Paz con Legalidad





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2021
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.110.186
Saldo en ejecución (dólares):	\$ 557.661



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.110.186

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.110.186

Presupuesto total



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



7

Proyectos aprobados

Total U\$ 7.1 millones

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS
	Banco Mundial	USD 4.000.000
	Suecia	USD 3.110.186
Total		USD 7.110.186

Fondos para la Paz con Legalidad





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, la decisión se comunicará en el 6° Comité Estratégico del Fondo (25.11.2021).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC-Colombia, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	€130.8 M.
Presupuesto asignado a proyectos:	€123.5 M contratados
Proyectos en ejecución:	Treinta (30) y 3 Asistencias Técnicas
Gastos Administrativos:	€4.3 M.
Contribuciones pendientes desembolso:	No
	https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/



Fondo Europeo para la Paz

EUR 130.8 M.

Fondos para la Paz con Legalidad



El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondo Europeo para la Paz



30

Proyectos en ejecución

3

Asistencias Técnicas.

Donante	Recursos aportados	Compromisos Pendientes
Alemania	€ 6.000.000	€ 0
Austria	€ 10.000	€ 0
Chile	€ 89.686	€ 0
Chipre	€ 10.000	€ 0
Comisión Europea	€ 90.000.000	€ 0
Croacia	€ 20.000	€ 0
Eslovaquia	€ 20.000	€ 0
Eslovenia	€ 12.000	€ 0
España	€ 4.500.000	€ 0
Finlandia	€ 150.000	€ 0
Francia	€ 3.000.000	€ 0
Holanda	€ 5.000.000	€ 0
Hungría	€ 20.000	€ 0
Irlanda	€ 3.750.000	€ 0
Italia	€ 5.000.000	€ 0
Letonia	€ 10.000	€ 0
Lituania	€ 46.000	€ 0
Luxemburgo	€ 35.000	€ 0
Malta	€ 10.000	€ 0
Portugal	€ 200.000	€ 0
Reino Unido	€ 1.510.000	€ 0
República Checa	€ 40.678	€ 0
Rumania	€ 25.000	€ 0
Suecia	€ 7.170.422	€ 70.160
UE-ECHO	€ 2.000.000	€ 0
EU (DCI admin)	€ 1.890.000	
Bank interests	€ 773	
TOTAL APORTES	€ 130.519.559	

Fondos para la Paz con Legalidad



El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$49.439.399



BID Colombia
Sostenible

USD 12.894.399

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 17.045.000

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 19.500.000

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 235
03 al 07 de octubre de 2022



Fondo Colombia Sostenible



COLOMBIA
SOSTENIBLE

27

Proyectos aprobados

DONANTES	Recursos desembolsados 2016 a 2020
 Noruega*	U\$ 41.288.361
 Suecia	U\$ 5.543.399
 Suiza	U\$ 5.000.000
TOTAL	U\$ 51.831.760

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención configurada por Noruega, Alemania y Reino Unido.

Fondos para la Paz con Legalidad



¡Algo maravilloso está pasando!



FONDO COLOMBIA EN PAZ



@fcolombiaenpaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz
