



# INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

07 al 11 de octubre de 2019



# Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



# Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



# Subcuentas Administradas

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  Reincorporación                                 |  Jurisdicción Especial de Paz    |  Estabilización                   |
|  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |  Agencia Nacional de Tierras     |  Funcionamiento                   |
|  Primera infancia                                |  Colombia Sostenible             |  Ambiente y Desarrollo Sostenible |
|  Sustitución                                    |  Sociedad de Activos Especiales |  Herencia Colombia               |
|  BID Préstamo                                  |  BID Facilidad                 |  |



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.279.417	\$ 2.252.858	\$ 26.559
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 1.881.990	\$ 1.866.459	\$ 15.531
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 1.459.242</b>	<b>\$ 1.451.181</b>	<b>\$ 8.060</b>

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por \$3.035 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones



# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución	\$ 1.271.052	\$ 1.061.656	84%	\$ 209.396	16%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 409.751	\$ 402.975	98%	\$ 6.776	2%
Reincorporación	\$ 368.443	\$ 299.757	81%	\$ 68.685	19%
BID Préstamo	\$ 96.885	\$ 2.480	3%	\$ 94.405	97%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.218	\$ 42.669	96%	\$ 1.548	4%
Funcionamiento	\$ 37.243	\$ 32.571	87%	\$ 4.671	13%
Primera Infancia	\$ 20.552	\$ 19.584	95%	\$ 968	5%
Estabilización	\$ 14.196	\$ 12.831	90%	\$ 1.365	10%
BID Facilidad	\$ 9.650	\$ 57	1%	\$ 9.593	99%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.870	\$ 2.852	99%	\$ 18	1%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018)	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.279.417</b>	<b>\$ 1.881.990</b>	<b>83%</b>	<b>\$ 397.427</b>	<b>17%</b>

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



# Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución	\$ 1.061.656	\$ 971.606	92%	\$ 90.050	8%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 402.975	\$ 146.910	36%	\$ 256.064	64%
Reincorporación	\$ 299.757	\$ 272.080	91%	\$ 27.678	9%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 42.669	\$ 26.077	61%	\$ 16.592	39%
Funcionamiento	\$ 32.571	\$ 21.417	66%	\$ 11.154	34%
Primera Infancia	\$ 19.584	\$ 5.494	28%	\$ 14.091	72%
Estabilización	\$ 12.831	\$ 8.260	64%	\$ 4.571	36%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.852	\$ 2.804	98%	\$ 48	2%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018)	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
BID Préstamo	\$ 2.480	\$ 29	0%	\$ 2.450	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 57	\$ 7	0%	\$ 50	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.881.990</b>	<b>\$ 1.459.242</b>	<b>78%</b>	<b>\$ 422.748</b>	<b>22%</b>

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.



# Línea del Tiempo

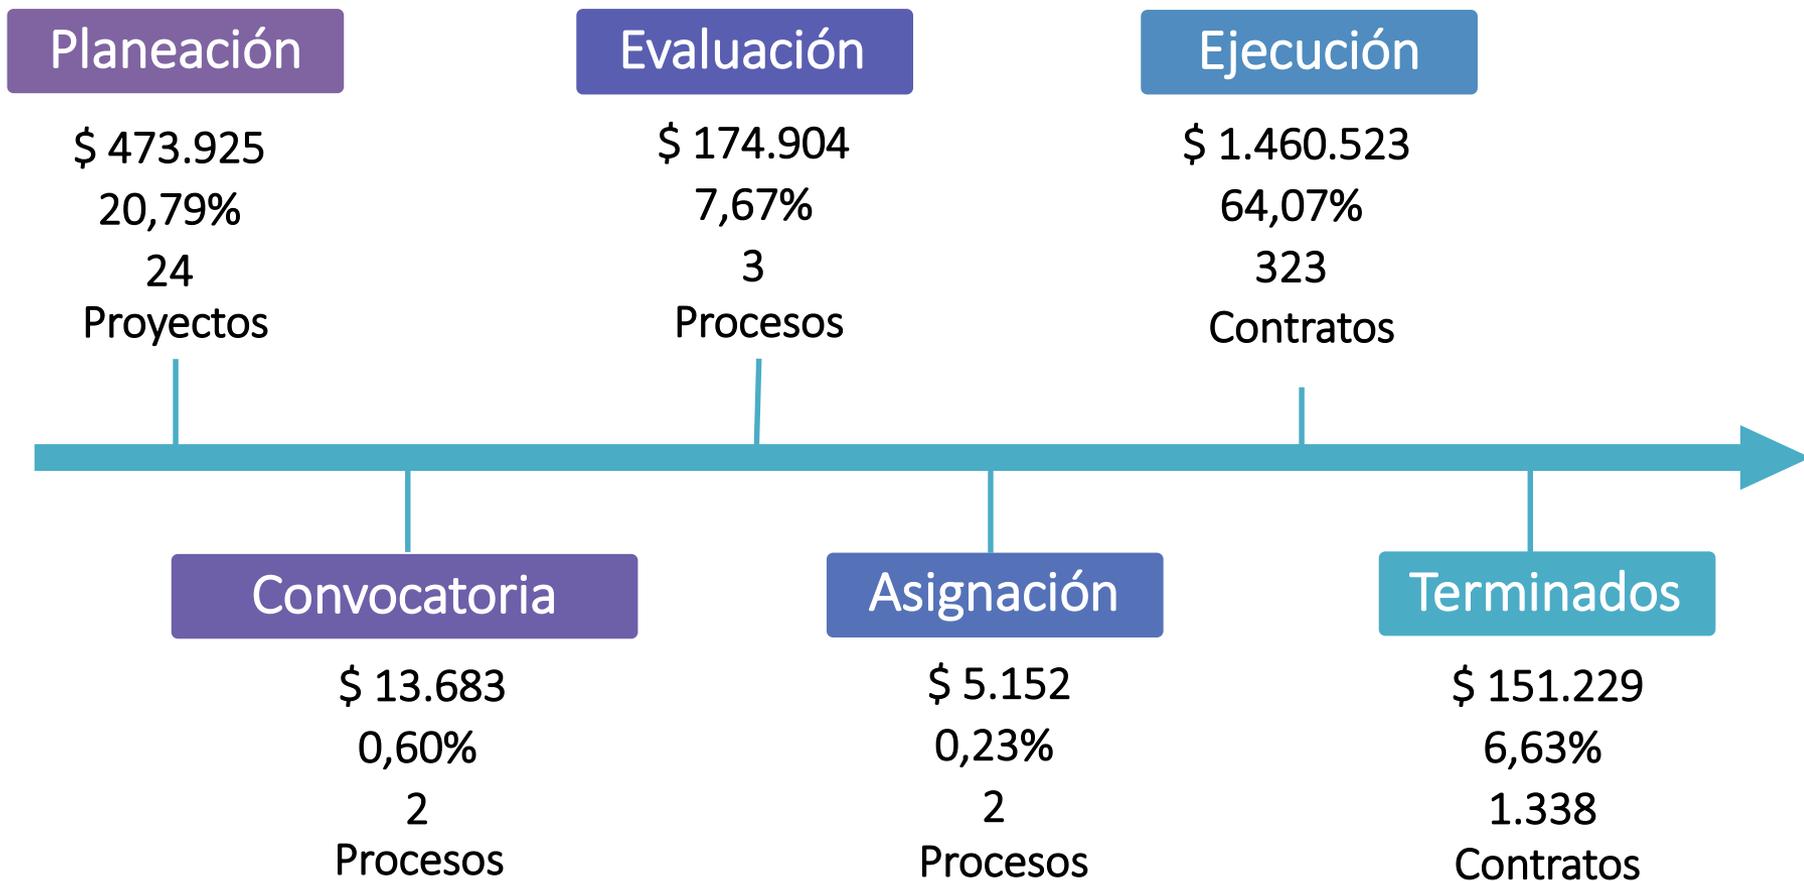



Planeación

\$ 275.226

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 984.889

Terminado

\$ 10.938

# Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 275.226


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 209.396
Adición Convenio AF002 – UNODC	\$ 58.695
Arrendamiento	\$ 2.945
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.158
Tiquetes Aéreos	\$ 891
Transporte Terrestre	\$ 821
Interventoría Fedecacao	\$ 320

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 984.889

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$ 631.662	Nov 2017 Dic 2019	99%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$260.383	Dic 2017 Dic 2019	100%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$ 67.500	Sep 2017 Dic 2019	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$ 10.946	Ene 2018 Ene 2020	33%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$ 9.791	Nov 2017 Oct 2019	77%
Prestación de Servicios Persona Natural	82	N/A	\$ 3.003	Feb 2019 Oct 2020	12%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	<a href="#">771-18</a>	\$ 880	Ene 2018 Oct 2019	100%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 724	N/A	6%

\$984.889\*

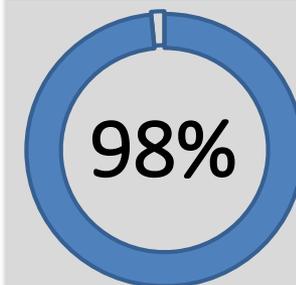

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*El incremento corresponde a suscripción de 23 OPS y aumento CDP de pago a familias





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 10.938

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	<u>561-18</u>	\$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	<u>792-18</u>	\$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
5 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 305	dic-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 113	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$ 7.618

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación  
\$ 2.477

Ejecución  
\$ 151.655

Terminado  
\$ 74.101

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 7.618


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 6.776
Contratos de prestación de servicios	\$ 842



Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	<a href="#">ART</a>	\$ 151.723	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COMFACESAR – Caja de Compensación Familiar del Cesar</li> <li>2. Consorcio GUAPI 2018</li> <li>3. Cooperativa de Servicios y Comercialización PROINMAT</li> <li>4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima</li> <li>5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar</li> <li>6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca Piedemonte</li> <li>7. Global Communities</li> <li>8. Unión Temporal Desarrollo Urabá Antioqueño</li> <li>9. Consorcio Pacífico Medio PDET</li> <li>10. Consorcio Construyendo Paz</li> <li>11. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial</li> </ol>	18 de octubre de 2019*

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	<a href="#">ART</a>	\$ 151.723	12. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial 13. Consorcio Nuevo Catatumbo 14. Consorcio Obras para la Paz 2019 15. Consorcio Obras para la Paz VI 16. Consorcio CONSTRUPAZ 17. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 18. Condugas S.A. 19. Unión Temporal PDET Caguán 2019 20. Proyectos Paz Colombia 21. Unión Temporal Desarrollo Montes de María 22. Global Communities 23. Unión Temporal Proyectos Paz Colombia 24. Unión Temporal Territorio 2019	18 de octubre de 2019*

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación


Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	<a href="#">ART</a>	\$ 151.723	25. Consorcio FUNDYPROC 26. Fundación Plan 27. Fundación Plan 28. Consorcio PDET Urabá 2019 29. Unión Temporal Virgen de la Candelaria 30. Unión Temporal los Manglares 31. Unión Temporal ASOPRO – OBRAS 2019 32. Unión Temporal Obras Urabá 33. Unión Temporal Bolívar en Paz 34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca para la Paz 35. Consorcio Choco 11 36. Consorcio Catatumbo	18 de octubre de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	<a href="#">ART</a>	\$ 151.723	37. Caja de Compensación Familiar del Choco – COMFACHOCO 38. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Montes de María 39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO 40. Consorcio EGA 41. Unión Temporal Enfoque Territorial 42. Unión Temporal Alto Patía 43. SANGEM S.A.S. 44. Unión Temporal Obras de Paz 45. Consorcio Proyectos Montes de María 46. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 47. Unión Temporal Obras PDET 48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 OHAL – CONSUCOL 49. Unión Temporal Obras PDET 2019	18 de octubre de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	<a href="#">ART</a>	\$ 151.723	50. Unión Temporal GHM Arauca 51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 54. Electrizable S.A.S. 55. Consorcio Arauca FCP 2019 56. Unión Temporal Desarrollo Sierra Nevada 57. Unión Temporal PDET Arauca 2019 58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019 59. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Sierra Nevada 60. Consorcio EGA 61. Constructora INCO S.A.S. 62. Consorcio Paz S.A.S. 63. Consorcio EGA	18 de octubre de 2019*

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría	<a href="#">ART</a>	\$ 22.177	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consorcio V-2C-I</li> <li>2. Consorcio PDET INCO – NOG</li> <li>3. Consorcio Nueva Alianza</li> <li>4. Consorcio JMS</li> <li>5. Consorcio Interobras 2019</li> <li>6. Consorcio Interproyectos 20109</li> <li>7. Grupo Solutions S.A.S.</li> <li>8. Consorcio Tecni ART</li> <li>9. Consorcio Bienestar Comunitario</li> <li>10. Consorcio Interproyectos DMCT 2019</li> <li>11. Consorcio Territorios – ART</li> <li>12. Consorcio Territorios – ART</li> <li>13. Consorcio Comunitario 2019</li> <li>14. Consorcio Comunitario 2019</li> </ol>	Suspendida





Planeación


Convocatoria

Evaluación  
\$ 173.900

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría	<a href="#">ART</a>	\$ 22.177	15. Sociedad Técnica Sota Ltda. 16. 360 Mantenimiento y Construcción S.A.S. 17. J.A.H. Ingeniería Industrial S.A.S. 18. Unión Temporal Colombia en Paz 19. Unión Temporal Vive Colombia 20. Consorcio PDET INCO – NOG	Suspendida





Planeación


Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 2.477

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Transporte Público	<a href="#">ART</a>	Transportes Especializados JR S.A.S	\$ 2.477	15 de octubre de 2019



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 151.655

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$22.330	Feb18 – Oct19	64%
	Consortio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$22.084	Mar18 – Oct19	64%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	May18 – Oct19	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$16.132	Mar18 – Oct19	49%
	Consortio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$13.890	Feb18 – Oct19	60%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	<a href="#">456-18</a>	\$8.769	May18 – Oct19	32%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$8.424	Feb18 – Oct19	64%
	Consortio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$5.612	Feb18 – Suspendido	63%
	Consortio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588	Feb18 – Nov19	60%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$2.759	Mar18 – Oct19	74%
	Consortio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.848	Abr18 – Suspendido	57%
Interventoría PIC II	Consortio GOC- NOGAAL	<a href="#">1086-18</a>	\$5.405	Ene19 – Dic19	4%
	U.T. Inter Infraestructura Social	<a href="#">1085-18</a>	\$5.254	Ene19 – Dic19	8%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	<a href="#">157-19</a>	\$ 5.187	Jul19– Jul20	30%
Prestación de Servicios	102 OPS	N/A	\$5.188	Abr19 –Jul20	30%

\$151.655\*

65%

EJECUCIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 151.655

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Hoja de ruta	Deloitte Asesores y Consultores LTDA	<a href="#">209-19</a>	\$ 1.965	Ago19 – Feb20	10%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	<a href="#">160-19</a>	\$ 1.916	Jul19 – Jul20	11%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	<a href="#">2-19</a>	\$1.036	Feb19 – Nov19	50%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	<a href="#">886-18</a>	\$990	Ago18 – Oct19	73%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	<a href="#">57-19</a>	\$440	Jun19 – Dic19	3%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$370	N/A	50%

\$151.655\*

65%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 74.101

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$56.149	feb-19	En proceso de liquidación
881 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 17.545	feb-19	En proceso de liquidación
17 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 396	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 68.685

Convocatoria

\$ 11.883

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 274.967

Terminado

\$ 12.907

# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 68.685

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 68.685

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria  
\$ 11.883

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Viveres Secos	<a href="#">ARN</a>	\$ 11.883	15 de Octubre 2019

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 274.967

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$ 215.208	Sep 2017 Sep 2020	96%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 25.220	Sep 2017 Oct 2019	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 18.218	Jun 2018 N/A	96%
Viveres Secos y Viveres Frescos	Integral Servicios S.AS.	<a href="#">42-19</a>	\$ 12.219	May 2019 Oct 2019	67%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa	<a href="#">142-19</a>	\$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	47%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	<a href="#">2-19</a>	\$ 526	Feb 2019 Nov 2019	50%

\$274.967\*

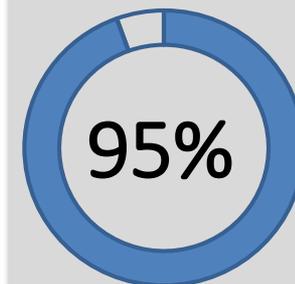

EJECUCIÓN

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 12.907

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	<a href="#">550-17</a>	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	<a href="#">12-19</a>	\$ 4.037	may-19	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	<a href="#">3-19</a>	\$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-18</a>	\$1.050	jun-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación  
\$ 1.737

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 17.319

Terminado  
\$ 25.161

# Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación  
\$ 1.737

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	\$ 1.548
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 189

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 17.319

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	<a href="#">168-19</a>	\$9.139	Ago2019 Ago2020	0%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	<a href="#">56-19</a>	\$5.376	Jul2019 Mar2022	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	20	N/A	\$1.695	Nov 2018 Ago 2020	26%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	<a href="#">897-18</a>	\$584	Ene 2019 Suspendido	40%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$363	May 2018 Oct 2019	90%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	Jun 2018 Oct 2019	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$17.319\*

61%

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 25.161

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	<a href="#">572-17</a>	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
102 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 4.391	dic-18	En proceso de liquidación
116 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 4.744	nov-18	Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	<a href="#">793-18</a>	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	<a href="#">794-18</a>	\$ 614	jul-18	Liquidado
Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791-18</a>	\$485	abr-19	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	<a href="#">1082-18</a>	\$ 200	mar-19	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	<a href="#">795-18</a>	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 8.779

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ 1.004

Asignación

\$ 2.675

Ejecución

\$ 2.945

Terminado

\$ 5.148

# Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 8.779

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.716
Modalidad Familiar	\$ 2.942
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	\$ 1.100
Por asignar Primera Infancia	\$ 968
Contratos de prestación de servicios	\$ 53

PRIMERA INFANCIA



Planeación


Convocatoria

Evaluación  
\$ 1.004

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	<a href="#">Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia</a>	\$ 1.004	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fundación Caminemos Juntos FCJ</li> <li>2. Corporación Educativa Colegio Gran Colombia</li> <li>3. UT FI-FCP 2019</li> <li>4. Fundación para el Desarrollo Social, Económica y Ambiental de Hato Nuevo (Corozal) FUNDESHAT</li> <li>5. Fundación ONG La Red</li> </ol>	15 de octubre de 2019

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 2.675

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Implementación oferta complementaria “Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida”, en municipios PDET	<a href="#">Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia</a>	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	\$ 2.675	15 de octubre de 2019

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 2.945

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Sep 2019 Ago 2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	17	N/A	\$945	Ene 2019 Mar 2020	36%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$341	N/A	0,2%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	<a href="#">57-19</a>	\$160	Jun 2019 Dic 2019	0,4%

\$ 2.945\*

68%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 5.148

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
29 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 874	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 18

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.852

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 18

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT	\$ 18

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.852

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
72 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.515	dic-18	En proceso de liquidación
17 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 332	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 4.671

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 24.132

Terminado

\$ 8.439

# Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación  
\$ 4.671

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 4.671

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 24.132

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001-18</a>	\$ 9.571	Abr18 - Oct19	61%
Nómina	N/A	N/A	\$ 5.305	Sep17 - Oct19	77%
Nómina	Gente Oportuna S.A.S.	<a href="#">43-19</a>	\$ 4.076	May19 - Feb20	49%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 1.919	Nov18 - Oct19	2%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	<a href="#">40-19</a>	\$ 1.585	May19 - Feb20	35%
Auditoría	Ernst & Young	<a href="#">55-19</a>	\$ 643	May19 - Mar20	20%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	<a href="#">1085A-18</a>	\$ 564	Dic18 - Dic20	39%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	<a href="#">57-2019</a>	\$200	Jun19 - Dic19	2%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	<a href="#">44-19</a>	\$ 79	May19 - May20	28%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	Ene18 - Oct19	34%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	<a href="#">1-19</a>	\$ 29	Feb19 - Dic19	11%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 28	N/A	77%
Adecuaciones	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">255-19</a>	\$ 34	Oct19 - Nov19	0%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	<a href="#">108-19</a>	\$ 15	Jun19 – N/A	64%
Servicios	Irotama SAS	<a href="#">280-19</a>	\$ 7	Sep19 - Sep19	96%

\$24.132\*

66%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 8.439

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
U.T. Itelcom- FP 2017	<a href="#">765-18</a>	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	<a href="#">397-18</a>	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	<a href="#">1093-18</a>	\$ 605	Jul19	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 335	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334-17</a>	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 308	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4-17</a>	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">33-18</a>	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3-17</a>	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerisis	<a href="#">541-18</a>	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">533-18</a>	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122-17</a>	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 8.439

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	<a href="#">121-17</a>	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335-17</a>	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125-17</a>	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	<a href="#">896-18</a>	\$ 7	jun-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126-17</a>	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	<a href="#">59-19</a>	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.A.S.	<a href="#">60-19</a>	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado

FUNCIONAMIENTO





Planeación  
\$ 1.557

Convocatoria  
\$ 1.800

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 3.714

Terminado  
\$ 7.125

# Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación  
\$ 1.557

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 1.365
Contratos de prestación de servicios	\$ 192

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria  
\$ 1.800

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador Logístico	<a href="#">Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación</a>	\$ 1.800	15 de Octubre 2019

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 3.714

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	22	N/A	\$2.341	Dic 2018 Sep 2020	27%
Campaña de Desminado	Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	<a href="#">616-18</a>	\$ 991	Feb 2018 Suspendido	50%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	<a href="#">57-19</a>	\$ 300	Jun 2019 Dic 2019	2%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 68	N/A	70%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 14	N/A	76%

\$ 3.714\*

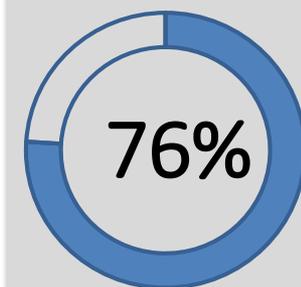

EJECUCIÓN

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 7.125

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 799	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$ 251	jul-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 164	jun-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565-17</a>	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	<a href="#">13-19</a>	\$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559-17</a>	\$16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

# Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En liquidación



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	<a href="#">059</a>	\$ 1.820	Abr 2019	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

# Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

**Nota:** Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	<a href="#">786-18</a>	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">784-18</a>	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">787-18</a>	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	<a href="#">785-18</a>	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783-18</a>	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  
\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación  
\$ 96.040

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 845

Terminado  
\$ -

# BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



Planeación  
\$ 96.040

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 94.405
Interventoría	\$ 882
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 377
Auditoría	\$ 375

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 845

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Contratos de Prestación de Servicios	37	N/A	\$723	Ago 2019 Oct 2019	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	Ago 2019 Jun 2020	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 29	Ago 2019 Oct 2019	100%

\$ 845\*

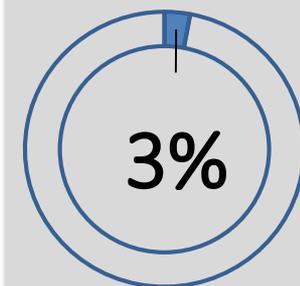

EJECUCIÓN

BID PRÉSTAMO





Planeación  
\$ 9.593

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 57

Terminado  
\$ -

## BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



Planeación  
\$ 9.593

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad Línea 13	\$ 9.593

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 57

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$ 46	Ago 2019 Ene 2020	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 11	Ago 2019 Dic 2019	0%

\$ 57\*

12%

EJECUCIÓN

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

# Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

# Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





# Fondos Multidonante para el Posconflicto



## Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.



<b>Nombre:</b>	<b>Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I</b>
<b>Sede:</b>	Nueva York
<b>Objetivo:</b>	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
<b>Duración:</b>	Febrero 2016 - Noviembre 2018
<b>Donantes:</b>	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
<b>Presupuesto Total (USD):</b>	\$ 85.668.040
<b>En ejecución (USD):</b>	\$ 80.9 millones
<b>Gastos administrativos</b>	\$3.064.073
<b>Ventanas de implementación</b>	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto  
Fase I

**USD 85.668.040**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Contribuciones pendientes

**USD**

Total movilizado





## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

111

Proyectos aprobados  
por USD \$83.7 M  
(2016, 2017, 2018 y  
2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
<b>Total:</b>	<b>USD 85.668.040*</b>

\*Con intereses Y devoluciones el total es de USD 87.2





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II</b>
<b>Sede:</b>	Nueva York
<b>Objetivo:</b>	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
<b>Duración</b>	Diciembre 2018- Diciembre 2022
<b>Donantes:</b>	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
<b>Presupuesto Total (USD):</b>	\$ 36.9 millones
<b>Presupuesto en ejecución (USD):</b>	\$ -
<b>Ventanas de implementación</b>	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto  
Fase II

**USD 24.510.530**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 5.082.231**

*Contribuciones pendientes*

**USD 36.9 mill**



## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 5.092.400	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
Noruega	USD 9.290.421	
Corea	USD 500.000	
Suecia		USD 4.719.455
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
Suiza	USD 491.592	USD 498.505
<b>Total:</b>	<b>USD 26.596.608</b>	<b>USD 10.300.191</b>

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia contribuirá con EUR 150.000
- PBF contribuirá USD 2.000.000 (para proyecto de la Comisión de la Verdad)





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial</b>
<b>Sede:</b>	Washington
<b>Objetivo:</b>	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
<b>Duración:</b>	2014-2019
<b>Donantes:</b>	Banco Mundial y Suecia
<b>Gobernanza:</b>	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
<b>Presupuesto total (dólares):</b>	\$ 7.100.000
<b>Presupuesto de ejecución (dólares):</b>	\$ 6.860.000
<b>Saldo disponible (dólares):</b>	\$ 80.000



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial  
para la Paz y el  
Posconflicto

**USD 7.100.000**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 0**

*Contribuciones pendientes*

**USD 7.100.000**

*Presupuesto total*





## Fondo para la Paz y el Posconflicto



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

**5**

Proyectos aprobados

Donante	Recursos Registrados
 <b>Banco Mundial</b>	USD 4.000.000
 <b>Suecia</b>	USD 3.100.000
<b>Total</b>	<b>USD 7.100.000</b>





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo Europeo para la Paz</b>
<b>Sede:</b>	Bélgica
<b>Objetivo:</b>	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
<b>Duración</b>	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)
<b>Donantes:</b>	Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
<b>Presupuesto Total (euros):</b>	124.840.000
<b>Presupuesto en ejecución:</b>	€ 69.817.234
<b>Monto Proyectos en fase administrativa*:</b>	8.800.000 (aproximadamente)
<b>Saldo disponible:</b>	43.222.765
<b>Gastos Administrativos:</b>	3.000.000
<b>Contribuciones pendientes desembolso:</b>	3.560.000



Fondo Europeo  
para la Paz

EUR 114.762.000

EUR 3.560.000

Contribuciones pendientes

EUR 124.840.000\*

Total Presupuesto Teórico

\* El desglose de esta información están pendiente de recibirse con actualización.





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

## Fondo Europeo para la Paz



27

Proyectos en ejecución  
por un total de  
€ 69.8\* millones

Donante	Contribuciones recibidas	Contribuciones pendientes
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comisión Europea	EUR 91.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 3.000.000	
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungría	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 2.250.000	EUR 750.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 40.000	
Luxemburgo	EUR 40.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 30.000	
Suecia	EUR 1.390.000	EUR 1.610.000
<b>CHILE</b>	<b>EUR 90.000</b>	
<b>Total:</b>	<b>EUR 118.381.319</b>	<b>EUR 3.560.000</b>





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo Colombia Sostenible</b>
<b>Sede:</b>	Washington
<b>Objetivo:</b>	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
<b>Duración:</b>	2017-2032
<b>Donantes:</b>	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
<b>Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):</b>	\$ 250.000.000
<b>Presupuesto en ejecución (dólares):</b>	\$ 8.540.000



BID Colombia  
Sostenible

**USD 19.658.355**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 12.000.000**

*Contribuciones pendientes a febrero 2019,  
correspondientes al POA 2019*

**USD 250.000.000**

*Presupuesto máximo para el pago por resultados en  
los diez años de vigencia del acuerdo con donantes*





## Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 ( líneas de trabajo 2018)



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS	US\$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US\$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US\$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US\$ 1.5 Millones
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 8.540.000</b>



## Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que inician ejecución física y financiera en Marzo 2019 \*



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US\$ 1.14 Millones
Promoción de Estrategias Innovadoras para el Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación Ambiental	US\$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de Proyectos e Innovación Territorial	US\$ 1.00 Millones
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 4.360.000</b>



## Fondo Colombia Sostenible



Donante	Recursos Desembolsados para el POA 2018	Recursos Desembolsados POA 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)* 	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
Suiza	USD 3.00.000	N/A
<b>Total:</b>		
<b>*Componente de pago por resultados</b>	<b>USD 19.658.355</b>	<b>USD 12.000.000</b>

\* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5,479,312 que pasa al POA 2019

- Noruega, anunció donación por USD\$ 11 millones
- Suecia, anunció la donación de USD \$ 1 millón
