



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Informe Semanal

13 al 17 de diciembre de 2021





Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Subcuentas Administradas



Reincorporación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Primera infancia



Sustitución



BID Préstamo



KfW



ICBF Sacúdete



Jurisdicción Especial de
Paz



Agencia Nacional de Tierras



Colombia Sostenible



Sociedad de Activos
Especiales



BID Facilidad



AFD



ZEII Catatumbo



Estabilización



Funcionamiento



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Herencia Colombia



Agencia Nacional de
Tierras 2019



Visión Amazonía



Catastro Multipropósito



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 4.542.864	\$ 4.251.115	\$ 291.749
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 4.112.545	\$ 3.870.030	\$ 242.515
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.559.732	\$ 2.535.255	\$ 24.477

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Contrapartidas subcuenta Sustitución por \$47.761 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$5.908 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$21.184 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$12.464./Aporte de contrapartidas OIM \$975/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Contrapartidas contratos subcuenta BID Facilidad \$7.703. /Contrapartidas contratos subcuenta BID Préstamo \$138.429/ Convenios Fondo Paz \$19.884/Otros ing. Sustitución UNODC \$5.944/ Convenio Visión Amazonía \$4.259./Convenio AFD \$1.772./Otros ing. Reincorporación Innpulsa \$16./ Contrapartidas MADS \$7.859/ Contrapartidas ICBF \$873.




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.267.217	\$ 2.196.812	97%	\$ 70.404	3%
Reincorporación	\$ 739.118	\$ 729.904	99%	\$ 9.214	1%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 633.783	\$ 547.516	86%	\$ 86.267	14%
BID Préstamo	\$ 434.521	\$ 286.440	66%	\$ 148.081	34%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 124.078	\$ 92.647	75%	\$ 31.430	25%
Funcionamiento	\$ 68.489	\$ 67.905	99%	\$ 584	1%
ICBF Sacúdete	\$ 60.873	\$ 31.472	52%	\$ 29.402	48%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.914	100%	\$ 151	0%
Estabilización	\$ 30.086	\$ 29.557	98%	\$ 528	2%
BID Facilidad	\$ 29.795	\$ 18.222	61%	\$ 11.573	39%
Primera Infancia	\$ 27.876	\$ 26.609	95%	\$ 1.266	5%
Herencia Colombia	\$ 23.244	\$ 13.987	60%	\$ 9.256	40%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 13.702	63%	\$ 8.001	37%
KFW	\$ 12.464	\$ 5.590	45%	\$ 6.874	55%
Catastro Multipropósito	\$ 7.647	\$ 0	0%	\$ 7.647	100%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 4.470	\$ 0	0%	\$ 4.470	100%
Visión Amazonía	\$ 4.259	\$ 900	21%	\$ 3.359	79%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.809	99%	\$ 38	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.772	\$ 0	0%	\$ 1.772	100%
TOTAL	\$ 4.542.864	\$ 4.112.545	91%	\$ 430.319	9%

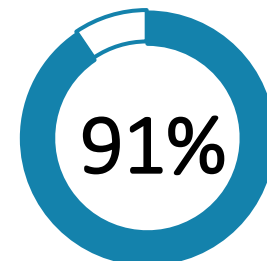




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapartidas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.196.812	\$ 1.373.917	62,5%	\$ 774.653	35,3%	\$ 48.243	2,2%
Reincorporación	\$ 729.904	\$ 636.301	87,2%	\$ 92.428	12,7%	\$ 1.175	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 547.516	\$ 297.166	54,3%	\$ 248.790	45,4%	\$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	\$ 286.440	\$ 81.774	28,5%	\$ 66.237	23,1%	\$ 138.429	48,3%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 92.647	\$ 5.630	6%	\$ 79.158	85%	\$ 7.859	8%
Funcionamiento	\$ 67.905	\$ 55.166	81%	\$ 12.739	19%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.914	\$ 42.480	97%	\$ 1.434	3%	\$ 0	0%
ICBF Sacúdete	\$ 31.472	\$ 184	1%	\$ 30.415	96,6%	\$ 873	2,8%
Estabilización	\$ 29.557	\$ 23.217	79%	\$ 6.341	21%	\$ 0	0%
Primera Infancia	\$ 26.609	\$ 20.870	78%	\$ 5.739	22%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 18.222	\$ 6.032	33,1%	\$ 4.487	24,6%	\$ 7.703	42,3%
Herencia Colombia	\$ 13.987	\$ 289	2%	\$ 13.698	98%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 13.702	\$ 9.053	66%	\$ 4.649	34%	\$ 0	0%
KFW	\$ 5.590	\$ 0	0%	\$ 5.590	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.809	\$ 2.804	100%	\$ 5	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	-\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 900	\$ 292	32%	\$ 608	68%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Catastro Multipropósito	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 4.112.545	\$ 2.559.732	62%	\$ 1.346.970	33%	\$ 205.843	5%

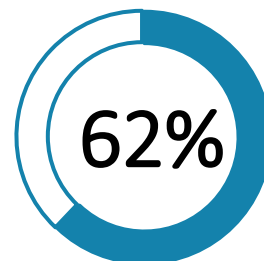




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Línea del Tiempo

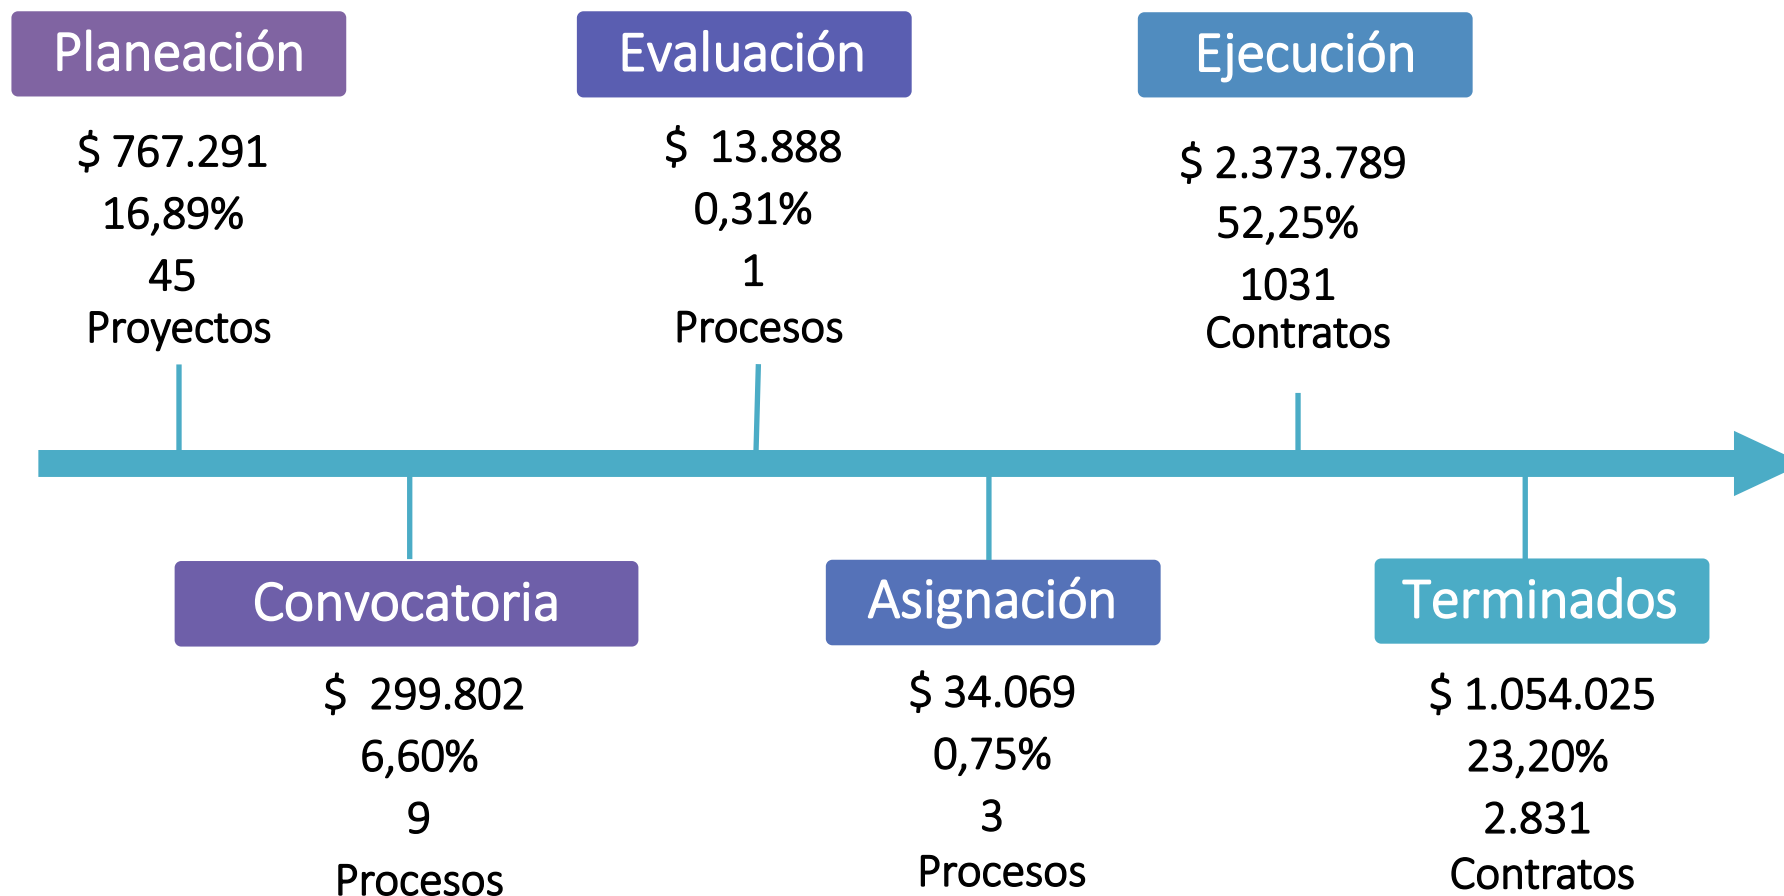



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 310.000

Convocatoria
\$ 275.083

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.137.137

Terminado
\$ 544.997

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 310.000

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	\$ 238.102
Disponible Sustitución	\$ 70.404
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 1.493

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 275.083

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador Logístico	ART	\$ 143.151	04 de enero de 2022
Operador Logístico	ART	\$ 131.932	06 de enero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.137.137

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$839.927	-	Nov17 - Dic22	100%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	FUPAD Colombia	1041-21	\$136.554	\$40.860	Dic21 - Dic23	0%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	\$ 25.855	-	Jun21 - Feb23	10%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	\$ 21.849	-	Jul21 - Mar23	10%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	\$ 15.066	-	Jul21 - Mar23	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	241 OPS	N/A	\$ 16.767	-	Nov20 - Dic22	42%
Operador Logístico	Situando SAS	927-21	\$ 6.957	-	Pendiente acta	0%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 8.696	-	Sep21 - Mar23	13%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 5.241	-	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$5.082	-	Jul21 - Ene23	10%

\$ 1.137.137*

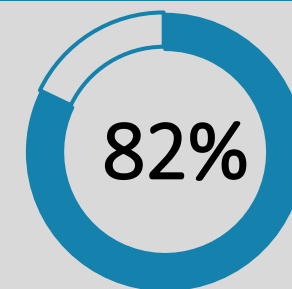

EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 4 OPS y pago de asistencia alimentaria.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.137.137

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador PNIS	COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	Ene21 - Ene22	10%
Arrendamientos	Situando SAS	928-21	\$ 3.046	-	Oct21 - Abr23	0%
Operador Logístico	Publica S.A.S.	984-21	\$ 2.500	-	Pendiente acta	0%
Transporte Público Terrestre	AS Transportes	28-21	\$ 2.392	-	Feb21 - Feb22	63%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.587	-	N/A	83%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	-	Dic19 - Mar22	38%

\$ 1.137.137*

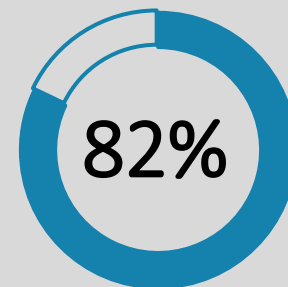

EJECUCIÓN

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 544.997

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	\$319.078	\$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
-OEI-	262-20	\$ 89.169	-	nov-21	En proceso de liquidación
UNODC	AF 001	\$ 67.177	-	dic-19	Liquidado
408 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 19.931	-	dic-18	Liquidado
Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	may-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
84 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 4.801	-	ago-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 8.643	\$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
Situando SAS	254-19	\$ 3.001		Oct-21	En proceso de liquidación
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 1.017	-	ene-20	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 880	-	Oct-19	En proceso de liquidación
Situando SAS	411-20	\$ 706		Oct-21	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	-	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 19	-	nov-20	Liquidado

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 94.487

Convocatoria
\$ 11.587

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 27.730

Ejecución
\$ 225.313

Terminado
\$ 274.665

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas
Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 94.487

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible PDET	\$ 86.267
Diseño Estrategia Recolección de Información	\$ 6.888
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 989
Proyectos de Generación de Ingresos	\$ 293
Tiquetes aéreos	\$ 50

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 11.587

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes aéreos	ART	\$ 300	22 de diciembre de 2021
Proyectos de Generación de Ingresos	ART	\$ 11.287	14 de enero de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 27.730

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Proyectos de Generación de Ingresos	ART	ZONA 1: UNION TEMPORAL E & C – COLOMBIA EN PAZ. ZONA 4: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CC	\$ 24.730	24 de diciembre de 2021
Servicio de transporte público terrestre	ART	UNION TEMPORAL TCSC – SABANA FCP	\$ 3.000	24 de diciembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 225.313

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - May22	2%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	-	Jul20 - Mar22	7%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Dic21	13%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - Mar22	18%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - Feb22	9%
	U.T. Futuro Pazcífico	110-20	\$ 11.137	-	Jul20 - May22	9%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	Jul20 - Dic21	29%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Feb22	8%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Feb22	20%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Feb22	2%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	-	Feb20 - Ene22	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - May22	9%

\$ 225.313*

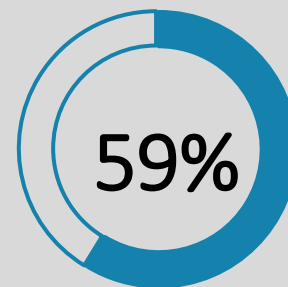

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS y adición al contrato 721-21

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 225.313

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	363 OPS	N/A	\$28.174	-	Sep20 - Dic22	34%
Implementación de proyectos de generación de ingresos	Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	\$ 8.860	-	Ago21 - Oct22	30%
Operador Logístico	Douglas Trade S.A.S.	721-21	\$ 8.321	-	Ago21 - Feb22	21%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - Mar22	28%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - May22	32%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Feb22	35%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 3.741	-	N/A	80%
Transporte Terrestre	Consorcio ART JRUNOA	200-21	\$ 2.004	-	Abr21 - Ene22	73%
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	Ago20 - Mar22	20%

\$ 225.313*

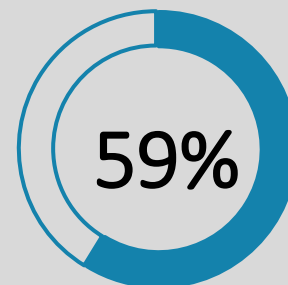

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS y adición al contrato 721-21

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 225.313

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos	Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.171	-	Feb21 - Abr22	40%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	\$ 889	-	Dic20 - Dic21	74%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 718	-	Jun19 - Ene22	89%
Ejecución de Planes de Negocio	Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	-	Mar21 - Dic21	35%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Ene21 - Nov22	100%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	\$ 350	-	May21 - May22	3%
Diseño línea base PDET	Proyectamos Colombia SAS	654-21	\$ 341	-	Ago21 - Feb22	10%
Interventoría Construcción de puente vehicular	Consorcio Intervial Antioquia	157-21	\$ 298	-	May21 - Nov21	0%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	\$ 12	-	Non21 - N/A	0%

\$ 225.313*

59%

EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS y adición al contrato 721-21

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 274.665

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	933 OPS	\$35.305	-	feb-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	611 OPS	\$17.013	-	jul-18	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$7.627	-	dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$7.525	-	ago-21	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	nov-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$3.156	-	abr-21	Liquidado
Norte Ingenieros Ltda.	167-21	\$ 2.282	-	nov-21	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 274.665

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	nov-21	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	-	ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	abr-21	En proceso de liquidación
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	oct-20	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	nov-19	Liquidado

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 63.488

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 13.888

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 588.135

Terminado
\$ 73.608

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 63.488

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Valor
Asignación Mensual	\$ 23.843
Proyectos Productivos	\$ 15.751
Disponible ARN	\$ 9.214
Renta Básica	\$ 9.259
BEPS y Pensión	\$ 3.688
Asignación Única	\$ 1.305
Gastos Bancarios	\$ 428



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 13.888

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Suministro Víveres Secos	ARN	\$ 13.888	1. UT T FCP 2022 2. INTEGRALSERVICIOS S.A.S 3. UINTEGRALSERVICIOS S.A.S 4. U.T SUMINISTROS DEL SUR	27 de enero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 588.135

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 459.422	-	Sep17 - Sep22	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 61.070	-	Jun18 - May22	99.9%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 31.848	-	Sep17 - May22	100%
Suministro de víveres secos	UT FCP 2021	217-21	\$ 25.546	-	May21 - Ene22	23%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	Nov20 - May22	73%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones	239-21	\$ 1.560	\$ 375	Jul21 - Jul22	12%
		245-20	\$ 1.500	\$ 600	Oct20 - Dic21	64%
Apoyo al Fortalecimiento Institucional	CODES	907-21	\$ 1.213	-	Oct21 - Jun22	0%
Prestación de Servicios	18 OPS	N/A	\$ 1.463	-	Ene21 - Ago22	62%
Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales	Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	\$ 514	-	Jul21 - Sep22	20%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 312	-	N/A	96%
Arrendamiento de Equipos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 223	-	Jul20 - Nov21	54%
Transporte Terrestre	TransMovilizando SAS	209-21	\$ 85	-	May21 - Abr22	45%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	286-21	\$ 85	-	Jun21 - Jun22	50%
licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS	608-21	\$ 45	-	Jul21 - Jul22	100%
	BIM Latinoamérica SAS	629-21	\$ 12	-	Jul21 - Jul22	100%

\$ 588.135*

96%

EJECUCIÓN

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de proyectos productivos, renta básica, asignaciones únicas y mensuales.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 73.608

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	-	abr-21	Liquidado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 1.977	\$ 200	ago-20	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 4 OPS	N/A	\$ 287	-	feb-20	En proceso de liquidación
Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	jul-21	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 17 OPS	N/A	\$ 894	-	feb-20	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	abr-20	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	\$ 82	-	may-21	En proceso de liquidación
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	jul-21	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 5.515

Terminado
\$ 38.398

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible JEP	\$ 151

Jurisdicción
Especial de
Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 5.515

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul19 - Mar22	83%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$57	N/A	100%

\$ 5.515

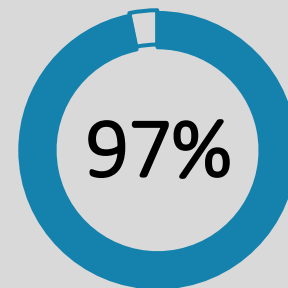

EJECUCIÓN

Jurisdicción
Especial de
Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 38.398

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	238 OPS	\$ 10.724	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1 OPS	\$ 12	dic-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Jurisdicción
Especial de
Paz





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.266

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 1.651

Ejecución
\$ 4.309

Terminado
\$ 20.649

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.266

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	\$ 1.266

Primera
Infancia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 1.651

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Dotación Pedagógica	<u>Consejería</u> <u>Presidencial para la</u> <u>Niñez y Adolescencia</u>	CONSORCIO PDET 2021	\$ 1.651	24 de diciembre de 2021

Primera
Infancia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 4.309

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicios técnicos y operativos para implementación de acción de fortalecimiento de la gestión territorial	Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	\$ 3.069	-	Pendiente acta	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 OPS	N/A	\$ 541	-	May21 - Nov22	38%
Interventoría	Consorcio S&T 2021	923-21	\$ 483	-	Oct21 - Sep22	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	-	Jun19 - Ene22	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$56	-	N/A	67%

\$ 4.309

84%

EJECUCIÓN

Primera
Infancia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 20.649

Primera
Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$3.877	nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	\$3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$3.074	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	ago-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	66 OPS	\$2.926	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.391	nov-20	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	3 OPS	\$142	sep-19	En proceso de liquidación
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	\$ -	nov-21	Liquidado



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ 2.809

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	\$ 38

Agencia
Nacional de
Tierras



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.809

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
78 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.372	jul-18	Liquidado
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 432	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Agencia
Nacional de
Tierras





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.779

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 34.047

Terminado
\$ 32.663

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.779

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Auditoría	\$ 807
Disponible Funcionamiento	\$ 584
Custodia de Documentos	\$ 227
Tiquetes aéreos	\$ 161

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 34.047

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 12.555	Oct19 - May22	75%
Nómina	Su Temporal SAS	166-21	\$ 8.169	May21 - May22	44%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 - May22	98%
Servicios TIC	IMPRETIC'S E.I.C.E	304-21	\$ 2.376	May21 - May22	9%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	\$ 947	Dic20 – Mar22	73%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 944	Nov18 - May22	96%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 659	Dic20 - Nov22	46%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$446	Jun19 - Ene22	76%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul21 - Jul22	100%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 215	May20 - Feb22	57%
Cartillas	Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	Mar21 - Dic21	63%
Aseo y Cafeteria	Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 90	Mar21 - Mar22	49%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales A&S SAS	549-21	\$ 90	Jun21 - May22	8%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	882-21	\$ 90	Oct21 - Oct22	0%
Página WEB	Nexura Internacional SAS	554-21	\$ 83	Jun21 - Feb22	80%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	89%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic21	9%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic21	49%
Póliza	Zurich Colombia Seguros SA	N/A	\$ 7	Jun21 - Jun22	100%

\$ 34.047*

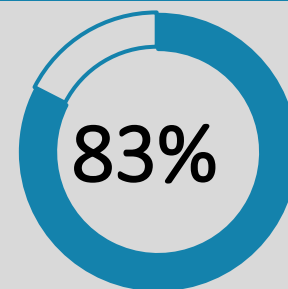

EJECUCIÓN

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a disminución en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.663

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 6.028	abr-21	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.284	may-21	En proceso de liquidación
Ernst & Young	55-19	\$ 964	dic-20	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 560	dic-20	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	jul-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.663

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 133	mar-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	\$ 31	sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	\$ 30	jul-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	oct-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.663

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	\$ 7	jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	\$ 5	ago-21	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	\$ 1	mar-20	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 726

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 14.409

Terminado
\$ 14.950

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 726

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Disponible Estabilización	\$ 528
Contratos de prestación de servicios	\$ 198



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 14.409

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	55 OPS	N/A	\$6.439	Oct20 - Oct22	45%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$2.550	Jul20 - Ene22	100%
		1002-21	\$1.300	Pendiente acta	0%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.950	Dic19 - Dic21	80%
Servicios Integrales de Comunicación	Infotic S.A.	238-21	\$ 840	May21 - Mar22	59%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 866	N/A	74%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun19 - Ene22	81%
		1029-21	\$ 91	Dic21 - Jun22	0%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun20 - Jun22	36%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 24	N/A	85%

\$ 14.409

79%

EJECUCIÓN

Estabilización



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 14.950

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	68 OPS	\$ 6.089	jun-18	Liquidado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	22 OPS	\$ 2.080	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 495	Jul-19	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	sep-21	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	\$ 3	jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Sociedad de
Activos
Especiales



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia
Sostenible



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 148.287

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 243.616

Terminado
\$ 42.617

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 148.287

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible BID Préstamo	\$ 148.081
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 125
Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales	\$ 81

BID Préstamo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 243.616

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 6.720	\$ 8.345	Nov20 - Ene23	16%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	12%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov20 - Nov22	14%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Nov20 - Sep22	12%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - Nov22	11%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	16%
	ASOHECA	859-20	\$ 777	\$ 4.014	Nov20 - May22	16%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Nov22	36%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Ene24	23%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.835	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	13%
	CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov20 - Nov22	12%
	ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Nov20 - May22	10%
	ONF Andina	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	21%
	CRC	905-21	\$ 1.966	\$ 1.091	Pendiente acta	0%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	\$ 1.207	\$ 990	Jun21 - Feb23	19%

\$ 243.616*

29%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a adición al contrato 831-20

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 243.616

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	\$ 2.293	\$ 2.221	May21 - Feb23	18%
	ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Nov20 - May22	25%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Nov22	8%
	CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Nov20 - May22	16%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Nov23	12%
	CORPOTUNIA	782-20	\$ 666	\$ 2.889	Nov20 - Mar22	13%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.010	\$ 1.338	Nov20 - Ene23	21%
	MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Nov20 - May22	17%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$ 2.398	Nov20 - Nov22	8%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	42%
	Fudesco	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov20 - Nov22	25%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov20 - Nov22	19%
	INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Nov20 - Mar22	16%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 572	\$ 1.676	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$ 1.832	Dic20 - Dic22	10%
	ASOGANADO	787-20	\$ 1.080	\$ 1.203	Nov20 - Nov22	17%
	CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Nov20 - May22	28%
	CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - Nov22	19%

\$ 243.616*

29%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a adición al contrato 831-20

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 243.616

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Nov22	15%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Nov20 - May22	20%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Nov22	21%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Nov22	16%
	FUN LATINO	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov20 - Nov22	18%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov20 - May22	20%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov20 - Nov22	16%
	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Nov20 - Feb22	36%
	Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Nov20 - Mar22	27%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Nov20 - Jul22	21%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	\$ 702	\$ 749	Nov20 - Ene24	0%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%

\$ 243.616*

29%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a adición al contrato 831-20

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 243.616

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Nov20 - Jul22	34%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Nov20 - Feb22	38%
	SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Nov20 - May22	0%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Nov22	20%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Nov22	21%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Nov20 - May22	25%
	CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Nov20 - Nov22	20%
	Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Nov20 - May22	42%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Nov20 - May22	21%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic20 - Dic21	42%
	FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Nov20 - Mar22	42%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Nov22	21%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Nov22	21%
Prestación de Servicios	28 OPS	N/A	\$ 3.385	-	Ene20 - May22	51%

\$ 243.616*

29%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a adición al contrato 831-20

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 243.616

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	024-21	\$ 343	-	Ene21-N/A	45%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	\$ 146	-	Pendiente acta	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Feb23	25%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 68	-	N/A	63%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 10	-	Nov20 - Abr22	34%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	\$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	100%

\$ 243.616*

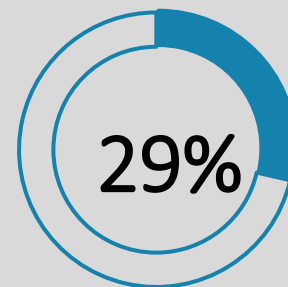

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a adición al contrato 831-20

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 42.617

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.479	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$1.438	-	May 2020	En proceso de Liquidación
51 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$3.086	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	\$ 1.350	\$ 1.386	Nov 2021	En proceso de Liquidación
UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.297	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$1.058	-	Jul 2020	Liquidado
Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
16 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 996	-	Oct 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

BID Préstamo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 42.617

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Universidad de los Andes	309-20	\$ 655	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	\$ 479	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep 2020	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.593

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 14.439

Terminado
\$ 3.763

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.593

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible BID Facilidad	\$ 11.573
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	\$ 20

BID Facilidad



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 14.439

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.550	\$ 1.931	Nov20 - Dic22	27%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 740	\$ 1.038	Ago20 - Sep22	12%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.037	\$ 717	Nov20 - Dic22	35%
Proyectos Productivos	Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	\$ 1.370	\$ 1.309	Feb21 - Nov23	31%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 595	\$ 1.942	Feb21 - Feb23	4%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 608	\$ 401	Sep20 - Oct22	22%
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	Corporación Colombiana internacional	844-21	\$ 427	\$ 366	Nov21 - Feb22	19%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 OPS	N/A	\$ 107	-	Ene20 - Jun22	26%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	\$ 154	-	Feb21 - N/A	33%
		44-20	\$ 100	-	Feb21 - N/A	40%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 24	-	Nov19 - Feb23	16%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 23	-	N/A	92%

\$ 14.439

33%

EJECUCIÓN

BID Facilidad



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.763

BID Facilidad

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	\$ 1.309	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
20 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 704	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	412-19	\$ 3	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 17.256

Convocatoria
\$ 330

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 4.688

Ejecución
\$ 970

Terminado
\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 17.256

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Herencia Colombia	\$ 9.256
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	\$ 6.200
Monitoreo de Actividades no permitidas en las áreas de Sistema de Parques	\$ 1.800

Herencia
Colombia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 330

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental	MADS	\$ 330	03 de enero de 2022

Herencia
Colombia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 4.688

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura	<u>MADS</u>	CONSORCIO INGEURBANO	\$ 4.688	24 de diciembre de 2021

Herencia
Colombia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 970

Terminados

Herencia
Colombia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	7 OPS	N/A	\$ 670	Feb21 - Feb22	43%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	N/A	0%

\$ 970

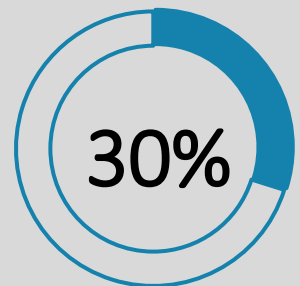

EJECUCIÓN



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 48.021

Convocatoria
\$ 10.846

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 64.939

Terminado
\$ 271

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 25% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 48.021

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 31.430
Adquisición de insumos para dotación de viveros	\$ 4.686
Adecuación Centro de información y monitoreo ambiental	\$ 4.106
Implementar acciones de restauración ecológica	\$ 2.975
Negocios verdes	\$ 1.300
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 1.123
Obtener información de la Biodiversidad presente en el Tejido Urbano	\$ 1.000
Generar información de emisiones atmosféricas	\$ 1.000
Comunicaciones	\$ 201
Producción de productos audiovisuales	\$ 200

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 10.846

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	MADS	\$ 3.342	07 de enero de 2022
	MADS	\$ 3.051	07 de enero de 2022
	MADS	\$ 1.659	07 de enero de 2022
	MADS	\$ 1.256	07 de enero de 2022
	MADS	\$ 595	07 de enero de 2022
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	MADS	\$ 286	06 de enero de 2022
	MADS	\$ 232	06 de enero de 2022
	MADS	\$ 188	06 de enero de 2022
	MADS	\$ 160	06 de enero de 2022
	MADS	\$ 75	06 de enero de 2022

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 64.939

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	c	-	Sep21 - Sep22	15%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	\$ 6.000	\$ 576	Nov21 - Nov22	0%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	\$ 6.000	\$ 2.572	Sep21 - Mar23	0%
		708-21	\$ 5.000	\$ 2.150	Sep21 - Mar23	14%
Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales	Masbosques	1047-21	\$ 9.990	\$ 190	Dic21 - Feb23	0%
	Corporación para el manejo sostenible de los bosques	774-21	\$ 4.000	\$ 172	Sep21 - Sep22	14%
Prestación de Servicios Persona Natural	82 OPS	N/A	\$ 5.564	-	Feb21 - Nov22	20%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	\$ 2.940	\$ 1.260	Jul21 - Mar23	28%
Suministro de materiales e insumos para construcción	Ecoflora SAS	772-21	\$ 2.463	-	Oct21 - Feb22	0%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	\$ 1.469	\$ 630	Nov21 - Mar23	0%

\$ 64.939*

9%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 64.939

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comunicaciones	Valencia Producciones FX	878-21	\$ 757	-	Oct21 - Abr22	0%
Membresía en modalidad de coworking	Wework	720-21	\$ 756	-	Sep21 - Ago22	0%
Alquiler de equipos de tecnología	EMTEL E.S.P.	906-21	\$ 600	-	Pendiente Acta	0%
Restauración Ecológica	Saving The Amazon	1027-21	\$ 510	\$ 219	Pendiente acta	0%
Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas	Policía Nacional	689-21	\$ 400		Pendiente acta	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	0%
Cartilla educativa	Fundación Natura	843-21	\$ 206	\$ 91	Pendiente Acta	0%
Operador Logístico	Pradilla Nuñez SAS	911-21	\$ 75	-	Oct21 - Dic21	100%
Apoyo a la Dirección de Ordenamiento Territorial y SINA	I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	\$ 50	-	Sep21 - Dic21	0%

\$ 64.939*

9%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 271

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural 2 OPS	N/A	\$ 126	Sep 21	En proceso de Liquidación
703 S.A.S.	709-21	\$ 91	Oct 21	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 1 OPS	N/A	\$ 54	Oct 21	Liquidado



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.001

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 13.627

Terminado
\$ 75

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.001

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible ANT 2019	\$ 8.001

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 13.627

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 8.750	N/A	100%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 2.230	Sep21 - Mar23	0%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 1.344	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 1.303	Jul21 - Ene23	9%

\$ 13.627

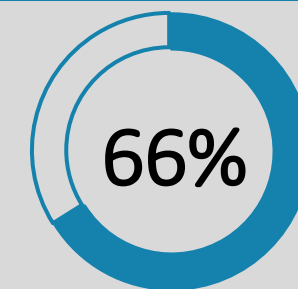

EJECUCIÓN

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 75

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 75	May 21	En proceso de Liquidación



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 12.464

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 12.464

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



Nombre corto	Valor
Disponible KFW	\$ 6.874
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	\$ 5.590



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

AFD



Nombre corto	Valor
Disponible AFD	\$ 1.772



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 3.359

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 900

Terminado
\$ -

VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 3.359

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Visión
Amazonía



Nombre corto	Valor
Disponible Visión Amazonía	\$ 3.359



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 900

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASOHECA	859-20	\$ 518	Nov20 - May22	31%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 382	Nov20 - Nov22	35%

\$ 900

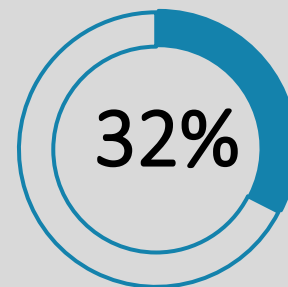

EJECUCIÓN

Visión
Amazonía



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 32.485

Convocatoria
\$ 1.956

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 26.432

Terminado
\$ -

ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: N/A





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 32.485

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible ICBF Sacúdete	\$ 29.402
Servicio Público de Bienestar Familiar	\$ 2.992
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 91

ICBF
Sacúdete



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 1.956

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



ICBF
Sacúdete

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Obtención de licencias para construir centros Sacúdete	ICBF	\$ 1.461	10 de diciembre de 2021
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	ICBF	\$ 495	13 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 26.432

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	Asociación Colombiana Renaciente	925-21	\$ 2.246	\$ 67	Pendiente Acta	0%
	Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	\$ 1.669	\$ 50	Nov21 - May22	0%
	CORPOASES	986-21	\$ 1.503	\$ 90	Pendiente Acta	0%
	FUNDAFES	968-21	\$ 1.298	\$ 39	Nov21 - May22	0%
	Fundación para el Desarrollo Social Integral	740-21	\$ 1.235	\$ 37	Sep21 - Abr22	0%
	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	\$ 1.108	\$ 33	Pendiente Acta	0%
	Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	\$ 995	\$ 38	Pendiente Acta	0%
	AEMG	987-21	\$ 856	\$ 26	Pendiente Acta	0%
	Corporación Oxsan	856-21	\$ 809	\$ 40	Oct21 - Abr22	0%
	CORPOASES	808-21	\$ 802	\$ 48	Oct21 - Abr22	0%
	Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	\$ 725	\$ 29	Sep21 - Abr22	0%
	Corporación Trigal del Norte	722-21	\$ 912	\$ 36	Sep21 - Mar22	0%
	Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	\$ 811	\$ 24	Pendiente Acta	0%
	Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	\$ 805	\$ 32	Ago21 - Mar22	0%
	Fundación Social Creciendo	698-21	\$ 794	\$ 24	Sep21 - Mar22	0%
	FAVANSO	855-21	\$ 647	\$ 32	Pendiente Acta	0%
	FUNDESOP	988-21	\$ 511	\$ 15	Pendiente Acta	0%
	Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	\$ 790	-	Sep21 - Abr22	0%

\$ 26.432*

1%

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a contrapartidas de los contratos 740 y 741 de 2021

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 26.432

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	812-21	\$ 651	\$ 20	Pendiente Acta	0%
		813-21	\$ 601	\$ 18	Pendiente Acta	0%
	Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	\$ 622	\$ 25	Oct21 - Abr22	0%
	Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	\$ 593	\$ 18	Sep21 - Abr22	0%
	Universidad del Magdalena	814-21	\$ 548	\$ 19	Pendiente Acta	0%
	Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	\$ 511	\$ 20	Sep21 - Mar22	0%
	Corpollanos	924-21	\$ 456	\$ 14	Pendiente Acta	0%
	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	\$ 400	\$ 12	Pendiente Acta	0%
	Fundalianza	914-21	\$ 367	\$ 11	Pendiente Acta	0%
	Fundalianza	908-21	\$ 210	\$ 6	Pendiente Acta	0%
Implementación Programa Generaciones Sacúdete	Universidad del Magdalena	724-21	\$ 1.232	\$ 43	Oct21 - Abr22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	7 OPS	N/A	\$ 644	-	Ago21 - Sep22	29%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 108	-	N/A	0%
Servicio Público de Bienestar Familiar	UT San Pedro	743-21	\$ 100	\$ 5	Pendiente Acta	0%

\$ 26.432*

1%

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a contrapartidas de los contratos 740 y 741 de 2021

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.470

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Planeación



Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.470

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Zona ZEII
Catatumbo

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo	\$ 4.470



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 7.647

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva



Estado: En Planeación



Temporalidad: Inicialmente por 2 años.

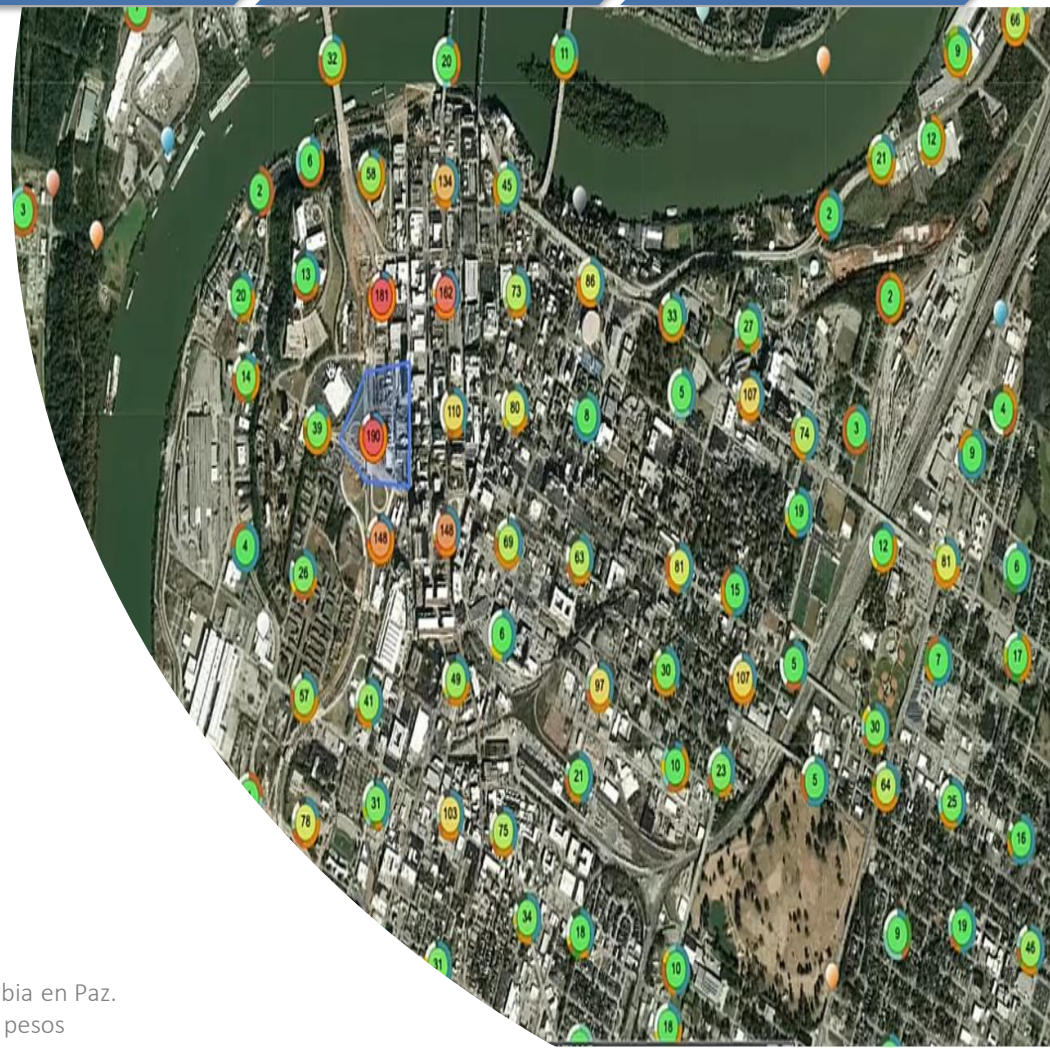



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 7.647

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Catastro
Multipropósito

Nombre corto	Valor
Disponible Catastro Multipropósito	\$ 7.647



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para
la Paz con
Legalidad



Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

<https://www.fondoounucol.org/>



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

87.029.345

Total movilizado

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2023
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz de ONU.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 91.004.575
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 85.322.960

Desembolsados al Fondo

USD 5.681.615

Contribuciones pendientes



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 18.805.460	
Chile	USD 120.000	
Alemania	USD 18.227.860	
Noruega	USD 31.058.368	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 4.213.462	USD 5.681.615
Canadá	USD 2.669.033	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 7.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 344.804	
Irlanda	USD 1.378.353	
Total:	USD 85.322.960	USD 5.681.615

Nota: En Comité Directivo del 27 de agosto de 2021, el Reino Unido anunció una nueva contribución por **USD 1.3 millones**





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para
la Paz con
Legalidad

Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2021
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.110.186
Saldo en ejecución (dólares):	\$ 557.661



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.110.186

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.110.186

Presupuesto total



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



7

Proyectos aprobados

Total U\$ 7.1
millones

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS	
	Banco Mundial	USD	4.000.000
	Suecia	USD	3.110.186
Total		USD	7.110.186



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, la decisión se comunicará en el 6° Comité Estratégico del Fondo (25.11.2021).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC-Colombia, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	€130.5 M.
Presupuesto asignado a proyectos:	€118.8 M contratados
Proyectos en ejecución:	veinticuatro (24)
Proyectos finalizados:	doce (12)
Gastos Administrativos:	€4.6 M.
Contribuciones pendientes desembolso:	No

<https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/>



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 130.5 M.

Pendientes



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondo Europeo para la Paz



24

Proyectos en ejecución

12

Proyectos finalizados

Total €130.5
millones



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Donante	Recursos aportados	Compromisos Pendientes
Alemania	€ 6.000.000	€ 0
Austria	€ 10.000	€ 0
Chile	€ 89.686	€ 0
Chipre	€ 10.000	€ 0
Comisión Europea	€ 90.000.000	€ 0
Croacia	€ 20.000	€ 0
Eslovaquia	€ 20.000	€ 0
Eslovenia	€ 12.000	€ 0
España	€ 4.500.000	€ 0
Finlandia	€ 150.000	€ 0
Francia	€ 3.000.000	€ 0
Holanda	€ 5.000.000	€ 0
Hungría	€ 20.000	€ 0
Irlanda	€ 3.750.000	€ 0
Italia	€ 5.000.000	€ 0
Letonia	€ 10.000	€ 0
Lituania	€ 46.000	€ 0
Luxemburgo	€ 35.000	€ 0
Malta	€ 10.000	€ 0
Portugal	€ 200.000	€ 0
Reino Unido	€ 1.510.000	€ 0
República Checa	€ 40.678	€ 0
Rumania	€ 25.000	€ 0
Suecia	€ 7.170.422	€ 70.160
UE-ECHO	€ 2.000.000	€ 0
EU (DCI admin)	€ 1.890.000	
Bank interests	€ 773	
TOTAL APORTES	€ 130.519.559	

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Colombia
Sostenible

USD 8.540.633

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 4.353.766

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 10.390.000

Suma de ocho proyectos aprobados 2020

USD 6.655.00

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Nombre:

Fondo Colombia Sostenible

Sede:

Washington D.C.

Objetivo:

Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local

Duración:

2017-2032

Donantes:

Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza

Gobernanza:

Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.

Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):

\$ 250.000.000

Monto proyectos aprobados (dólares):

\$29.939.399

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible



17

Proyectos aprobados

Total U\$ 29.9
millones



Noruega*

U\$ 26.395.961



Suecia

U\$ 4.281.488



Suiza

U\$ 5.000.000

TOTAL

U\$ 35.677.449

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención configurada por Noruega, Alemania y Reino Unido.



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 193
13 al 17 de diciembre de 2021

Fondos para
la Paz con
Legalidad

¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



@fcolombiapaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz

pdet
PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL
