



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Informe Semanal

13 al 17 de septiembre de
2021





Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Subcuentas Administradas



Reincorporación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Primera infancia



Sustitución



BID Préstamo



KfW



ICBF Sacúdete



Jurisdicción Especial de
Paz



Agencia Nacional de Tierras



Colombia Sostenible



Sociedad de Activos
Especiales



BID Facilidad



AFD



ZEII Catatumbo



Estabilización



Funcionamiento



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Herencia Colombia



Agencia Nacional de
Tierras 2019



Visión Amazonía



Catastro Multipropósito



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 4.474.793	\$ 4.251.115	\$ 223.678
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 3.314.161	\$ 3.119.250	\$ 194.911
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.413.265	\$ 2.391.515	\$ 21.750

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$5.727 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$21.194 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$12.464./Aporte de contrapartidas OIM \$975/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad \$7.338. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo \$135.952/ Convenio Fondo Paz \$889/Otros ing. Sustitución UNODC \$4.865/ Convenio Visión Amazonía \$4.259./Convenio AFD \$1.772./Otros ing. Reincorporación Innpulsa \$16./ Contrapartidas MADS \$6.154/ Contrapartidas ICBF \$56,




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.224.578	\$ 1.480.770	67%	\$ 743.808	33%
Reincorporación	\$ 739.118	\$ 717.320	97%	\$ 21.798	3%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 626.906	\$ 538.257	86%	\$ 88.648	14%
BID Préstamo	\$ 432.044	\$ 284.316	66%	\$ 147.728	34%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 122.373	\$ 43.268	35%	\$ 79.105	65%
Funcionamiento	\$ 68.314	\$ 66.611	98%	\$ 1.703	2%
ICBF Sacúdete	\$ 60.056	\$ 28.499	47%	\$ 31.557	53%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.914	100%	\$ 151	0%
Estabilización	\$ 30.086	\$ 27.461	91%	\$ 2.625	9%
BID Facilidad	\$ 28.532	\$ 17.811	62%	\$ 10.721	38%
Primera Infancia	\$ 27.876	\$ 27.573	99%	\$ 303	1%
Herencia Colombia	\$ 23.244	\$ 11.704	50%	\$ 11.540	50%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 13.702	63%	\$ 8.001	37%
KFW	\$ 12.464	\$ 5.590	45%	\$ 6.874	55%
Visión Amazonía	\$ 4.259	\$ 0	0%	\$ 4.259	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.809	99%	\$ 38	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.772	\$ 0	0%	\$ 1.772	100%
TOTAL	\$ 4.474.793	\$ 3.314.161	74%	\$ 1.160.631	26%

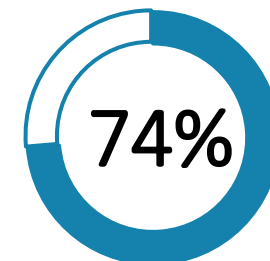




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapartidas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.480.770	\$ 1.330.538	89,9%	\$ 142.849	9,6%	\$ 7.383	0,5%
Reincorporación	\$ 717.320	\$ 593.890	82,8%	\$ 122.054	17,0%	\$ 1.375	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 538.257	\$ 265.502	49,3%	\$ 271.195	50,4%	\$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	\$ 284.316	\$ 68.838	24,2%	\$ 79.526	28,0%	\$ 135.952	47,8%
Funcionamiento	\$ 66.611	\$ 51.151	77%	\$ 15.460	23%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.914	\$ 41.117	94%	\$ 2.797	6%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 43.268	\$ 436	1%	\$ 36.677	85%	\$ 6.154	14%
ICBF Sacúdete	\$ 28.499	\$ 0	0%	\$ 28.443	99,8%	\$ 56	0,2%
Primera Infancia	\$ 27.573	\$ 20.731	75%	\$ 6.842	25%	\$ 0	0%
Estabilización	\$ 27.461	\$ 20.070	73%	\$ 7.391	27%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 17.811	\$ 5.151	28,9%	\$ 5.323	29,9%	\$ 7.338	41,2%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 13.702	\$ 8.296	61%	\$ 5.407	39%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 11.704	\$ 184	2%	\$ 11.520	98%	\$ 0	0%
KFW	\$ 5.590	\$ 0	0%	\$ 5.590	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.809	\$ 2.804	100%	\$ 5	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 3.314.161	\$ 2.413.265	73%	\$ 741.079	22%	\$ 159.818	5%

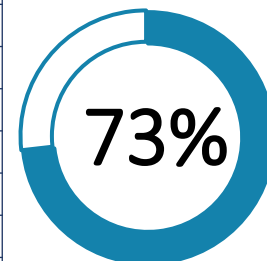




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Línea del Tiempo

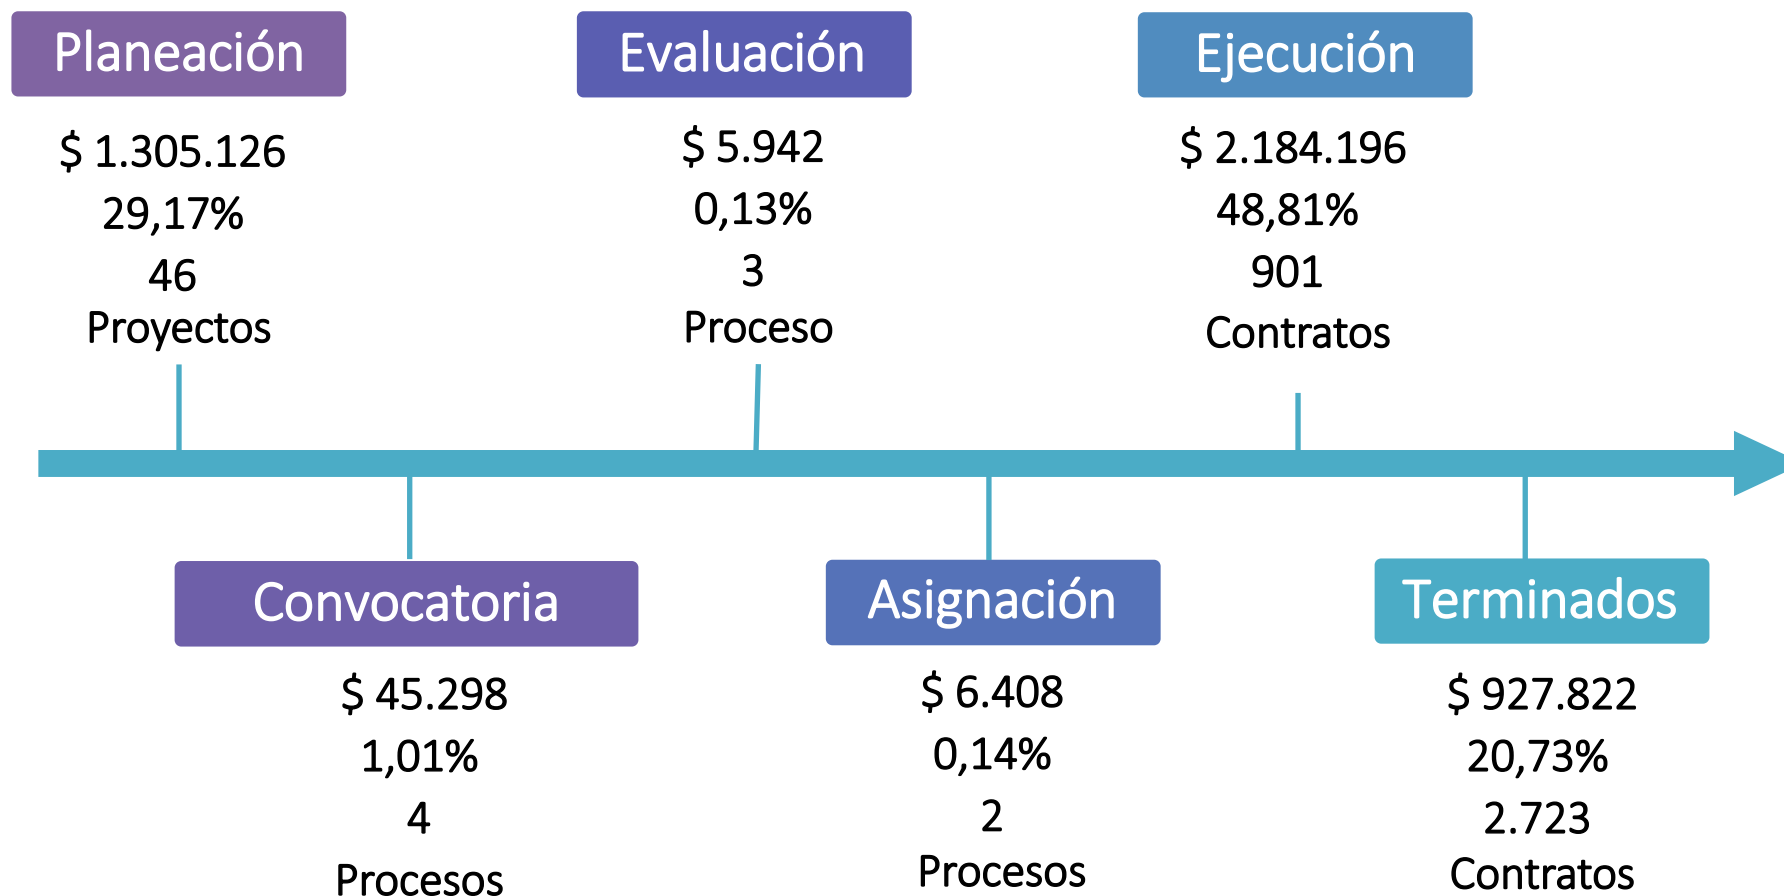

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 746.033

Convocatoria
\$ 2.500

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.026.044

Terminado
\$ 450.001

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 746.033


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 743.808
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 1.410
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	\$ 815

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 2.500

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador Logístico	ART	\$ 2.500	21 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.026.044

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$828.161	-	Nov17 - Dic21	99.9%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	\$ 89.169	-	Jun20 - Nov21	58%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	\$ 25.855	-	Jun21 - Feb23	0%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	\$ 21.849	-	Jul21 - Mar23	10%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	\$ 15.066	-	Jul21 - Mar23	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	220 OPS	N/A	\$ 14.940	-	Sep20 - Sep22	32%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 8.696	-	Sep21 - Mar23	0%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 5.241	-	Jul21 - Ene23	0%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$5.082	-	Jul21 - Ene23	0%

\$ 1.026.044*

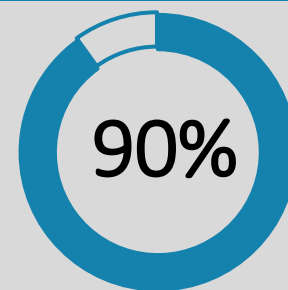

EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a terminación de 2 OPS

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.026.044

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador PNIS	COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	Ene21 - Ene22	10%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	-	Oct19 - Oct21	98%
		411-20	\$ 704	-	Ago20 - Oct21	86%
Transporte Público Terrestre	AS Transportes	28-21	\$ 2.392	-	Feb21 - Feb22	41%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.187	-	N/A	84%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	-	Dic19 - Mar22	25%

\$ 1.026.044*

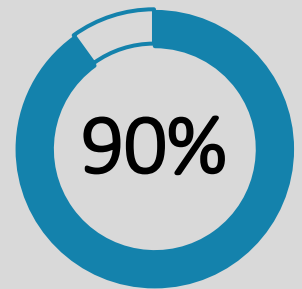

EJECUCIÓN

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 450.001

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	\$319.078	\$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
UNODC	AF 001	\$ 67.177	-	dic-19	Liquidado
232 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 13.865	-	ago-19	En proceso de liquidación
Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	may-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 8.643	\$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
219 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 8.745	-	dic-18	Liquidado
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 1.017	-	ene-20	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 880	-	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	-	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 19	-	nov-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Sustitución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 99.102

Convocatoria
\$ 36.310

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 5.926

Ejecución
\$ 228.637

Terminado
\$ 256.931

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 99.102

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 88.648
Diseño Estrategia Recolección de Información	\$ 6.888
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.633
Proyecto de Infraestructura Productiva	\$ 829
Interventoría Integral a contratos de Infraestructura	\$ 104

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 36.310

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Proyectos de Generación de Ingresos	<u>ART</u>	\$ 36.310	24 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 5.926

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Logístico	ART	Douglas Trade SAS	\$ 5.926	22 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 228.637

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - Nov21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	-	Jul20 - Mar22	2%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Nov21	0%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - Dic21	4%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - Feb22	1%
	U.T. Futuro Pazcífico	110-20	\$ 11.137	-	Jul20 - Dic21	0%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	Jul20 - Nov21	7%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Feb22	1%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Dic21	5%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Feb22	0%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	-	Feb20 - Dic21	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - Dic21	0%
	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	Jul20 - Nov21	1%

\$ 228.637*

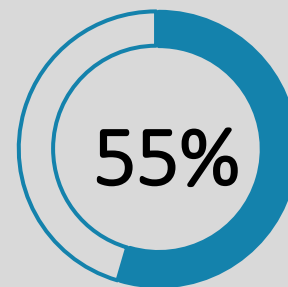

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 12 OPS e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 228.637

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	349 OPS	N/A	\$25.815	-	Jun20 - Oct22	22%
Implementación de proyectos de generación de ingresos	Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	\$ 8.860	-	Ago21 - Oct22	0%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - Mar22	22%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - Oct21	28%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Feb22	31%
Interventoría PIC II	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	Ene19 - Sep21	67%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 3.441	-	N/A	66%
Construcción de puente vehicular	Norte Ingenieros Ltda.	167-21	\$ 2.282	-	May21 - Nov21	0%
Transporte Terrestre	Consorcio ART JRUNOA	200-21	\$ 2.004	-	Abr21 - Ene22	38%
Convenio	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	Sep20 - Nov21	56%

\$ 228.637*

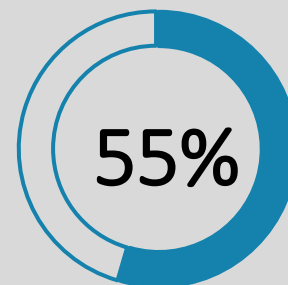

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 12 OPS e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 228.637

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	Ago20 - Mar22	20%
Proyectos Productivos	Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.171	-	Feb21 - Abr22	30%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	\$ 889	-	Dic20 - Dic21	22%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 718	-	Jun19 - Oct21	67%
Ejecución de Planes de Negocio	Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	-	Mar21 - Nov21	25%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Ene21 - Nov22	100%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	\$ 350	-	May21 - May22	0%
Diseño línea base PDET	Proyectamos Colombia SAS	654-21	\$ 341	-	Ago21 - Feb22	0%
Interventoría Construcción de puente vehicular	Consorcio Intervial Antioquia	157-21	\$ 298	-	May21 - Nov21	0%

\$ 228.637*

55%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 12 OPS e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 256.931

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1120 OPS	\$38.805	-	feb-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	391 OPS	\$10.094	-	jul-18	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 7.627	-	dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$ 7.525	-	ago-21	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	feb-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$3.156	-	abr-21	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	-	ago-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 256.931

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Consortio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	abr-21	En proceso de liquidación
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	ene-21	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	oct-20	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	nov-19	Liquidado

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 110.015

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 1.222

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 552.910

Terminado
\$ 74.972

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 110.015

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Asignación Mensual	\$ 51.288
Proyectos Productivos	\$ 20.931
Por asignar ARN	\$ 21.798
Renta Básica	\$ 9.846
BEPS y Pensión	\$ 4.213
Asignación Única	\$ 1.333
Gastos Bancarios	\$ 606

Reincorporación



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 1.222

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Apoyo al Fortalecimiento Institucional	<u>ARN</u>	\$ 1.222	1. CONSORCIO ASOCIADOS PARA EL PROGRESO 2. CONSORCIO PLANTTA PROYECTAMOS 3. CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI 4. CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA-CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA 5. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO 6. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO Y AGROEMPRESARIAL DE COLOMBIA FUNDAMCOL 7. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET 8. ORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL –PROHACIENDO 9. UNION TEMPORAL SOLIDARIA 10. CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO	30 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 552.910

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 431.184	-	Sep17 - Sep21	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 55.890	-	Jun18 - May22	99.8%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 31.324	-	Sep17 - May22	100%
Suministro de víveres secos	UT FCP 2021	217-21	\$ 25.546	-	May21 - Ene22	12%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	Nov20 - May22	27%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	239-21	\$ 1.560	\$ 375	Jul21 - Jul22	0%
		245-20	\$ 1.500	\$ 600	Oct20 - Oct21	46%
Prestación de Servicios	18 OPS	N/A	\$ 1.427	-	Ene21 - Jul22	39%
Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales	Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	\$ 514	-	Jul21 - Sep22	0%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 280	-	N/A	86%
Arrendamiento de Equipos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 223	-	Jul20 - Nov21	48%
Transporte Terrestre	TransMovilizando SAS	209-21	\$ 85	-	May21 - Abr22	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	286-21	\$ 85	-	Jun21 - Jun22	19%
licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS	608-21	\$ 45	-	Jul21 - Jul22	0%
	BIM Latinoamérica SAS	629-21	\$ 12	-	Jul21 - Jul22	0%

\$ 552.910*

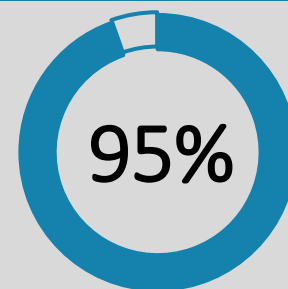

EJECUCIÓN

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de renta básica, asignación mensual, asignaciones únicas e incremento en CDP de gastos de desplazamiento.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 74.972

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	-	abr-21	En proceso de liquidación
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 3.376	\$ 200	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 14 OPS	N/A	\$ 892	-	feb-20	En proceso de liquidación
Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	jul-21	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 6 OPS	N/A	\$ 254	-	feb-20	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	abr-20	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	\$ 82	-	may-21	En proceso de liquidación
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	jul-21	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 7.065

Terminado
\$ 36.848

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	\$ 151

Jurisdicción
Especial de
Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 7.065

Terminados

Jurisdicción
Especial de
Paz

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul19 - Mar22	75%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb20 - Sep21	66%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$57	N/A	100%

\$7.065

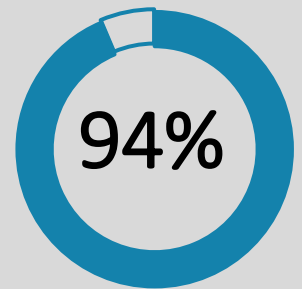

EJECUCIÓN



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 36.848

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	233 OPS	\$ 10.542	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	6 OPS	\$ 194	dic-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Jurisdicción
Especial de
Paz





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.312

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 4.720

Asignación
\$ 483

Ejecución
\$ 712

Terminado
\$ 20.649

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.312

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

Nombre corto	Valor
Fortalecimiento e Implementación de iniciativas artísticas y culturales	\$ 1.009
Por asignar Primera Infancia	\$ 303



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 4.720

Asignación

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Servicios técnicos y operativos para implementación de acción de fortalecimiento de la gestión territorial	Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	\$ 3.069	1. UT PRESENCIAS ETNICAS 2. FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 3. FUNDACION ONG LA RED 4. UT ENACORE - POR UN NUEVO MUNDO	23 de septiembre de 2021
Dotación Pedagógica	Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	\$ 1.651	1. CONSORCIO CK- FCP 2. CONSORCIO PDET 20-2 3. FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 4. URBANA EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 5. UNION TEMPORAL COLCONDI DMLL	24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 483

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Interventoría	<u>Consejería</u> <u>Presidencial para la</u> <u>Niñez y Adolescencia</u>	CONSORCIO S&T 2021	\$ 483	30 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 712

Terminados

Primera
Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	5 OPS	N/A	\$ 496	May21 - Sep22	13%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun19 - Oct21	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$56	N/A	67%

\$ 712

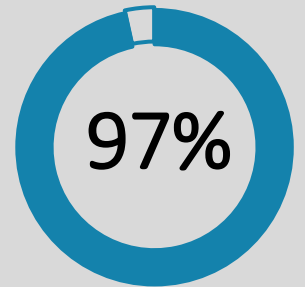

EJECUCIÓN



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 20.649

Primera
Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$3.877	nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	\$3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$3.074	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	ago-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	46 OPS	\$1.920	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.391	nov-20	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	23 OPS	\$1.147	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ 2.809

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Agencia Nacional de Tierras	\$ 38

Agencia
Nacional de
Tierras



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.809

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
78 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.372	jul-18	Liquidado
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 432	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Agencia
Nacional de
Tierras





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 2.019

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 33.663

Terminado
\$ 32.632

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 2.019

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 1.703
Auditoría	\$ 316



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 33.663

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 12.555	Oct19 - May22	69%
Nómina	Su Temporal SAS	166-21	\$ 8.169	May21 - May22	14%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 - May22	98%
Servicios TIC	IMPRETIC'S E.I.C.E	304-21	\$ 2.376	May21 - May22	0%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 885	Nov18 - May22	96%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 659	Dic20 - Nov22	35%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	\$ 631	Dic20 - Oct21	80%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	\$446	Jun19 - Oct21	53%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 375	N/A	79%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul21 - Jul22	100%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 186	May20 - Feb22	65%
Cartillas	Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	Mar21 - Nov21	63%
Aseo y Cafeteria	Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 90	Mar21 - Mar22	26%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales A&S SAS	549-21	\$ 90	Jun21 - May22	0%
Página WEB	Nexura Internacional SAS	554-21	\$ 83	Jun21 - Feb22	40%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	83%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic21	7%
Impresiones	Pronto Printer SAS	710-21	\$ 31	Sep21 - Sep21	0%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic21	49%
Póliza	Zurich Colombia Seguros SA	N/A	\$ 7	Jun21 - Jun22	100%

\$ 33.663

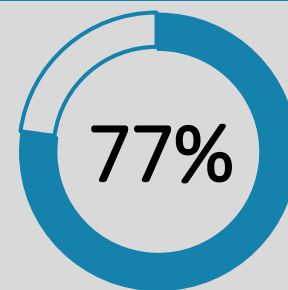

EJECUCIÓN

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.632

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 6.028	abr-21	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.284	may-21	En proceso de liquidación
Ernst & Young	55-19	\$ 964	dic-20	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 560	dic-20	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	jul-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.632

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 133	mar-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	\$ 30	jul-21	En proceso de liquidación
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	oct-20	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.632

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	\$ 7	jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	\$ 5	ago-21	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	\$ 1	mar-20	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 3.529

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 12.206

Terminado
\$ 14.351

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 3.529

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 2.625
Contratos de prestación de servicios	\$ 904



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 12.206

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	49 OPS	N/A	\$5.856	Sep20 - Sep22	42%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$2.550	Jul20 - Ene22	100%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic19 - Dic21	29%
Servicios Integrales de Comunicación	Infotíc S.A.	238-21	\$ 840	May21 - Mar22	22%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 666	N/A	71%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun19 - Oct21	55%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	Mar20 - Sep21	94%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun20 - Jun22	36%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 24	N/A	85%

\$ 12.206*

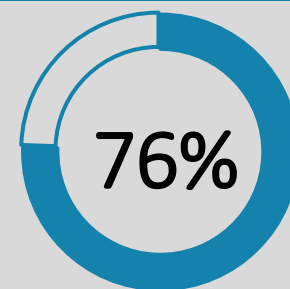

EJECUCIÓN

Estabilización



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 14.351

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	49 OPS	\$ 5.139	ago-18	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	33 OPS	\$ 2.055	jun-18	Liquidado
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	\$ 3	jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Sociedad de
Activos
Especiales



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia
Sostenible



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151.125

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 247.289

Terminado
\$ 33.629

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151.125

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 147.728
Proyectos productivos	\$ 2.384
Proyectos de Restauración Ecológica	\$ 932
Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales	\$ 81

BID Préstamo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.289

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 6.720	\$ 8.345	Nov20 - Ene23	16%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	6%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov20 - Nov22	7%
	Fundación Chocolate tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Nov20 - Sep22	12%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - Nov22	11%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	16%
	ASOHECA	859-20	\$ 1.296	\$ 4.014	Nov20 - May22	9%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Ene24	23%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.835	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	13%
	CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov20 - Nov22	6%
	ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Nov20 - May22	10%
	ONF ANDINA	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	21%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	\$ 1.207	\$ 990	Jun21 - Feb23	19%

\$ 247.289*

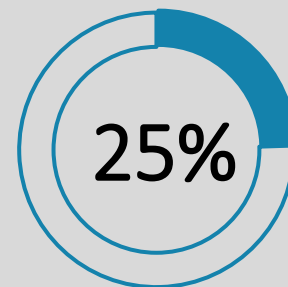

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 247.289

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	\$ 2.293	\$ 2.221	May21 - Feb23	18%
	ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Nov20 - May22	12%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Nov22	8%
	CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Nov20 - May22	8%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Nov23	12%
	CORPOTUNIA	782-20	\$ 666	\$ 2.889	Nov20 - Nov21	7%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.010	\$ 1.338	Nov20 - Ene23	21%
	MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Nov20 - May22	17%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$ 2.398	Nov20 - Nov22	8%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	21%
	Fudesco	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov20 - Nov22	25%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov20 - Nov22	10%
	INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Nov20 - Nov21	8%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 954	\$ 1.676	Nov20 - Nov22	13%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$ 1.832	Dic20 - Dic22	10%
	ASOGANADO	787-20	\$ 1.080	\$ 1.203	Nov20 - Nov22	17%
	CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Nov20 - May22	14%
	CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - Nov22	19%

\$ 247.289*

25%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 247.289

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Nov22	15%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Nov20 - May22	20%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Nov22	21%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Nov22	16%
	FUN LATINO	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov20 - Nov22	18%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov20 - May22	20%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov20 - Nov22	16%
	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Nov20 - Nov21	18%
	Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Nov20 - Nov21	13%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Nov20 - Jul22	21%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	\$ 702	\$ 749	Nov20 - Ene24	17%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%

\$ 247.289*

25%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.289

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Nov20 - Jul22	34%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Nov20 - Nov21	19%
	SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Nov20 - May22	0%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Nov22	20%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Nov22	21%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Nov20 - May22	25%
	CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Nov20 - Nov22	20%
	Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Nov20 - May22	21%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Nov20 - May22	21%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic20 - Dic21	21%
	FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Nov20 - Nov21	21%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Nov22	21%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Nov22	21%
Roster de estructuración de proyectos	UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.297	-	Dic20 - Ago21	83%
Prestación de Servicios	24 OPS	N/A	\$ 3.244	-	Ene20 - May22	26%

\$ 247.289*

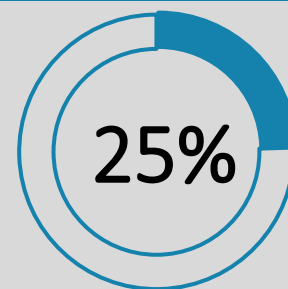

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 247.289

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Oct20 - Oct21	100%
Estructuración Integral de Proyectos	APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Nov20 - Oct21	85%
Interventoría	UT Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Dic20 - Ago21	75%
Interventoría	Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Dic20 - Ago21	45%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 479	-	Oct20 - Oct21	19%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	\$ 655	-	Jun20 - Oct21	43%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	-	Ene21-N/A	45%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Feb23	16%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 42	-	N/A	88%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 7	-	Nov20 - Nov21	50%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	\$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	100%

\$ 247.289*

25%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 33.629

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.479	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	\$1.438	-	May 2020	En proceso de Liquidación
50 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$2.980	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$1.058	-	Jul 2020	Liquidado
Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
16 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 996	-	Oct 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 33.629

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep 2020	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.162

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 17.004

Terminado
\$ 367

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.162

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	\$ 10.721
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	\$ 427
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 14

BID Facilidad



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 17.004

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.550	\$ 1.931	Nov20 - Dic22	27%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 740	\$ 1.038	Ago20 - Sep22	12%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.037	\$ 717	Nov20 - Dic22	35%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Oct20 - Oct21	54%
Proyectos Productivos	Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	\$ 1.370	\$ 1.309	Feb21 - Nov23	10%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 595	\$ 1.942	Feb21 - Feb23	4%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	\$ 1.309	-	Oct20 - Ago21	93%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 608	\$ 401	Sep20 - Oct22	22%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	\$ 400	-	Ene20 - Nov21	47%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	\$ 154	-	Feb21 - N/A	33%
		44-20	\$ 100	-	Feb21 - N/A	40%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 24	-	Nov19 - Feb23	16%
		412-19	\$ 9	-	Nov19 - Oct21	9%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 23	-	N/A	85%

\$ 17.004

30%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

BID Facilidad





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 367

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
17 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$367	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 16.330

Convocatoria
\$ 6.488

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 426

Terminado
\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 16.330

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

Nombre corto	Valor
Por asignar Herencia Colombia	\$ 11.540
Elaboración y Producción de una cartilla educativa	\$ 4.688
Contratos de prestación de servicio	\$ 102



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 6.488

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura	MADS	\$ 4.688	01 de octubre de 2021
Monitoreo de Actividades no permitidas en las áreas de Sistema de Parques	MADS	\$ 1.800	06 de octubre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 426

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	\$426	Feb21 – Feb22	43%

\$ 426

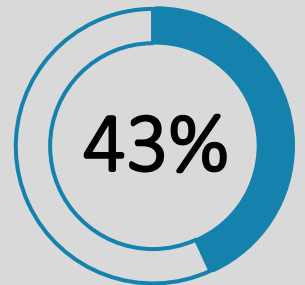

EJECUCIÓN

Herencia
Colombia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 82.272

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 40.101

Terminado
\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 82.272

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 79.105
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 1.566
Generar información de emisiones atmosféricas	\$ 1.000
Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas	\$ 400
Comunicaciones	\$ 201

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 40.101

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	\$ 10.000	-	Sep21 - Sep22	0%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	\$ 6.000	\$ 2.572	Sep21 - Mar23	0%
		708-21	\$ 5.000	\$ 2.150	Sep21 - Mar23	0%
Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales	Corporación para el manejo sostenible de los bosques	774-21	\$ 4.000	\$ 172	Sep21 - Sep22	0%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	\$ 2.940	\$ 1.260	Jul21 - Mar23	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	28 OPS	N/A	\$ 2.647	-	Feb21 - Jul22	16%
Suministro de materiales e insumos para construcción	Ecoflora SAS	772-21	\$ 2.463	-	Pendiente Acta	0%
Membresía en modalidad de coworking	Wework	720-21	\$ 756	-	Sep21 - Ago22	0%
Imagen institucional de la Escuela Nacional de educación Ambiental	703 S.A.S.	709-21	\$ 91	-	Sep21 - Oct21	0%
Apoyo a la Dirección de Ordenamiento Territorial y SINA	I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	\$ 50	-	Pendiente Acta	0%

\$ 40.101*

1%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 772-21, 774-21

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.001

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 13.627

Terminado
\$ 75

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.001

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 8.001

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 13.627

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 8.750	N/A	94%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 2.230	Sep21 - Mar23	0%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 1.344	Jul21 - Ene23	0%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 1.303	Jul21 - Ene23	0%

\$ 13.627

61%

EJECUCIÓN

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 75

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 75	May 21	En proceso de Liquidación



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 12.464

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 12.464

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	\$ 6.874
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	\$ 5.590



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

AFD



Nombre corto	Valor
Por asignar AFD	\$ 1.772



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.259

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.259

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Visión
Amazonía



Nombre corto	Valor
Por asignar Visión Amazonía	\$ 4.259



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 55.544

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 4.512

Terminado
\$ -

ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: N/A





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 55.544

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ICBF Sacúdete	\$ 31.557
Servicio Público de Bienestar Familiar	\$ 17.178
Implementación Programa Generaciones Sacúdete	\$ 6.709
Formulación de Proyectos de Vida	\$ 100

ICBF
Sacúdete



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 4.512

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	Corporación Trigal del Norte	722-21	\$ 912	-	Sep21 - Mar22	0%
	Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	\$ 805	\$ 32	Ago21 - Mar22	0%
	Fundación Social Creciendo	698-21	\$ 794	\$ 24	Pendiente Acta	0%
	Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	\$ 790	-	Pendiente Acta	0%
	Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	\$ 511	-	Sep21 - Mar22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	7 OPS	N/A	\$ 644	-	Ago21 - Sep22	0%

\$ 4.512*

0%

ICBF
Sacúdete



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Planeación



Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva



Estado: En Planeación



Temporalidad: Inicialmente por 2 años.

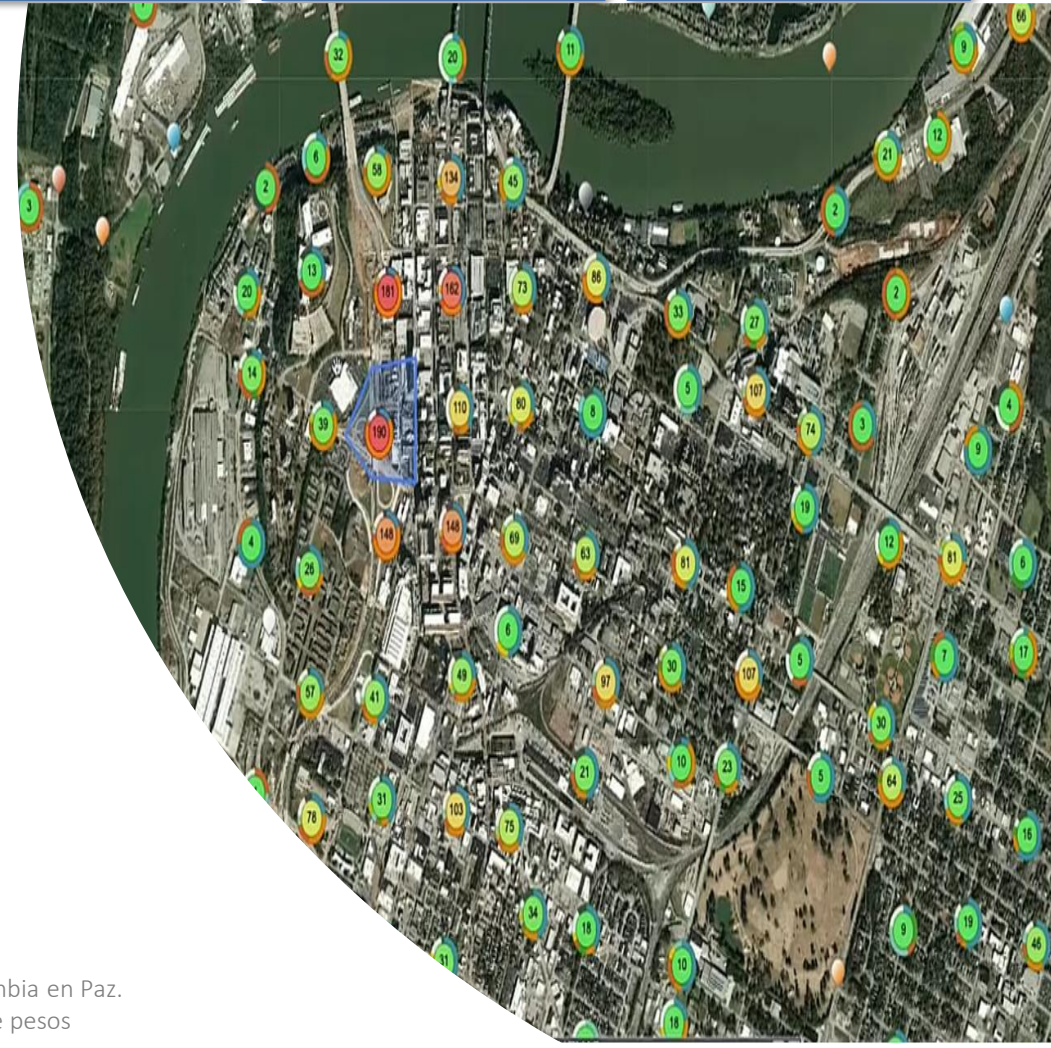



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

<https://www.fondoounucol.org/>



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021

Fondos para
la Paz con
Legalidad





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2023
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz de ONU.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 91.004.575
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 85.322.960

Desembolsados al Fondo

USD 5.681.615

Contribuciones pendientes



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 18.805.460	
Chile	USD 120.000	
Alemania	USD 18.227.860	
Noruega	USD 31.058.368	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 4.213.462	USD 5.681.615
Canadá	USD 2.669.033	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 7.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 344.804	
Irlanda	USD 1.378.353	
Total:	USD 85.322.960	USD 5.681.615

Nota: En Comité Directivo del 27 de agosto de 2021, el Reino Unido anunció una nueva contribución por **USD 1.3 millones**



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para
la Paz con
Legalidad

Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2021
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.110.186
Saldo en ejecución (dólares):	\$ 557.661



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.110.186

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.110.186

Presupuesto total



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



7

Proyectos aprobados

Total U\$ 7.1
millones

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS	
	Banco Mundial	USD	4.000.000
	Suecia	USD	3.110.186
Total		USD	7.110.186



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (enero/2021).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	€127.3 M.
Presupuesto asignado a proyectos:	€122.7 M contratados
Proyectos en ejecución:	veintiocho (28)
Proyectos próximos a cierre (2021):	trece (13)
Proyectos finalizados:	ocho (8)
Gastos Administrativos:	€4.6 M.
Contribuciones pendientes desembolso:	No

<https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/>



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 127.3 M.

Desembolsados al Fondo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondo Europeo para la Paz



28

Proyectos en ejecución

8

Proyectos finalizados

Total €122.7
millones



Donante	Recursos aportados	Compromisos Pendientes
Alemania	€ 6.000.000	€ 0
Austria	€ 10.000	€ 0
Chile	€ 89.686	€ 0
Chipre	€ 10.000	€ 0
Comisión Europea	€ 90.000.000	€ 0
Croacia	€ 20.000	€ 0
Eslovaquia	€ 20.000	€ 0
Eslovenia	€ 12.000	€ 0
España	€ 4.500.000	€ 0
Finlandia	€ 150.000	€ 0
Francia	€ 3.000.000	€ 0
Holanda	€ 5.000.000	€ 0
Hungría	€ 20.000	€ 0
Irlanda	€ 3.750.000	€ 0
Italia	€ 5.000.000	€ 0
Letonia	€ 10.000	€ 0
Lituania	€ 46.000	€ 0
Luxemburgo	€ 35.000	€ 0
Malta	€ 10.000	€ 0
Portugal	€ 200.000	€ 0
Reino Unido	€ 1.510.000	€ 0
República Checa	€ 40.678	€ 0
Rumania	€ 25.000	€ 0
Suecia	€ 7.170.422	€ 70.160
UE-ECHO	€ 2.000.000	€ 0
Bank interests	€ 773	
TOTAL APORTES	€ 128.629.559	



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Colombia
Sostenible

USD 8.540.633

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 4.353.766

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 10.390.000

Suma de ocho proyectos aprobados 2020

USD 6.655.00

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase
de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por
resultados en los diez años de vigencia del
acuerdo con donantes

Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$29.939.399

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 180
13 al 17 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible



17

Proyectos aprobados

Total U\$ 29.9
millones



Noruega*

U\$ 26.395.961



Suecia

U\$ 4.281.488



Suiza

U\$ 5.000.000

TOTAL

U\$ 35.677.449

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención configurada por Noruega, Alemania y Reino Unido.



¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



@fcolombiapaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz

pdet
PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL
