



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

# Informe Semanal

14 al 18 de junio de 2021





## Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



## Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

## Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial  
de Paz



Estabilización



Programas de Desarrollo  
con Enfoque Territorial



Agencia Nacional de  
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y Desarrollo  
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos  
Especiales



Herencia Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



Agencia Nacional de  
Tierras 2019



KfW



AFD



Visión Amazonía



ICBF Sacúdete



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

|                               | TOTAL        | PGN          | Otros recursos<br>(1) |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL    | \$ 3.809.991 | \$ 3.598.152 | \$ 211.839            |
| COMPROMISOS<br>PRESUPUESTALES | \$ 3.153.634 | \$ 2.975.121 | \$ 178.513            |
| TOTAL EJECUTADO               | \$ 2.306.595 | \$ 2.289.313 | \$ 17.282             |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$5.727 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$20.939 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$12.464./Aporte de contrapartida OIM \$600/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad \$7.338. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo \$132.740/ Convenio Fondo Paz \$889/Otros ing. Sustitución UNODC \$4.865. Convenio Visión Amazonía \$4.259.




La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

## Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

| Subcuentas                                             | Asignación<br>Presupuestal | Total Ejecución Presupuestal |            | Total Disponibilidad Presupuestal |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                                                        |                            | Valor                        | %          | Valor                             | %          |
| Sustitución de Cultivos                                | \$ 1.777.609               | \$ 1.463.962                 | 82%        | \$ 313.647                        | 18%        |
| Reincorporación                                        | \$ 738.728                 | \$ 715.379                   | 97%        | \$ 23.348                         | 3%         |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | \$ 517.006                 | \$ 487.534                   | 94%        | \$ 29.472                         | 6%         |
| BID Préstamo                                           | \$ 332.738                 | \$ 279.050                   | 84%        | \$ 53.689                         | 16%        |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible                       | \$ 116.218                 | \$ 4.560                     | 4%         | \$ 111.658                        | 96%        |
| Funcionamiento                                         | \$ 68.314                  | \$ 66.072                    | 97%        | \$ 2.242                          | 3%         |
| ICBF Sacúdete                                          | \$ 60.000                  | \$ 9.320                     | 16%        | \$ 50.680                         | 84%        |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP)                     | \$ 44.065                  | \$ 43.937                    | 100%       | \$ 128                            | 0%         |
| Estabilización                                         | \$ 30.086                  | \$ 25.630                    | 85%        | \$ 4.456                          | 15%        |
| BID Facilidad                                          | \$ 28.277                  | \$ 16.640                    | 59%        | \$ 11.637                         | 41%        |
| Primera Infancia                                       | \$ 27.876                  | \$ 21.361                    | 77%        | \$ 6.514                          | 23%        |
| Herencia Colombia                                      | \$ 23.244                  | \$ 426                       | 2%         | \$ 22.818                         | 98%        |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019                 | \$ 21.703                  | \$ 12.395                    | 57%        | \$ 9.308                          | 43%        |
| KFW                                                    | \$ 12.464                  | \$ 0                         | 0%         | \$ 12.464                         | 100%       |
| Visión Amazonía                                        | \$ 4.259                   | \$ 0                         | 0%         | \$ 4.259                          | 100%       |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT)                      | \$ 2.847                   | \$ 2.809                     | 99%        | \$ 38                             | 1%         |
| Colombia Sostenible                                    | \$ 2.738                   | \$ 2.738                     | 100%       | \$ 0                              | 0%         |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE)                   | \$ 1.820                   | \$ 1.820                     | 100%       | \$ 0                              | 0%         |
| AFD                                                    | \$ 0                       | \$ 0                         | 0%         | \$ 0                              | 0%         |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>\$ 3.809.991</b>        | <b>\$ 3.153.634</b>          | <b>83%</b> | <b>\$ 656.357</b>                 | <b>17%</b> |






La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

## Ejecución Financiera

| Subcuentas                                             | Total<br>Comprometido | Total Pagado        |            | Pendiente por Pagar |            |                   |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|
|                                                        |                       | Valor               | %          | Valor               | %          | Contrapagadas     | %         |
| Sustitución de Cultivos                                | \$ 1.463.962          | \$ 1.305.916        | 89,2%      | \$ 150.664          | 10,3%      | \$ 7.383          | 0,5%      |
| Reincorporación                                        | \$ 715.379            | \$ 556.721          | 77,8%      | \$ 157.658          | 22,0%      | \$ 1.000          | 0,1%      |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | \$ 487.534            | \$ 246.592          | 50,6%      | \$ 239.382          | 49,1%      | \$ 1.560          | 0,3%      |
| BID Préstamo                                           | \$ 279.050            | \$ 58.095           | 20,8%      | \$ 88.215           | 31,6%      | \$ 132.740        | 47,6%     |
| Funcionamiento                                         | \$ 66.072             | \$ 47.884           | 72%        | \$ 18.189           | 28%        | \$ 0              | 0%        |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP)                     | \$ 43.937             | \$ 37.116           | 84%        | \$ 6.820            | 16%        | \$ 0              | 0%        |
| Estabilización                                         | \$ 25.630             | \$ 17.270           | 67%        | \$ 8.359            | 33%        | \$ 0              | 0%        |
| Primera Infancia                                       | \$ 21.361             | \$ 20.015           | 94%        | \$ 1.347            | 6%         | \$ 0              | 0%        |
| BID Facilidad                                          | \$ 16.640             | \$ 2.138            | 12,9%      | \$ 7.164            | 43,1%      | \$ 7.338          | 44,1%     |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019                 | \$ 12.395             | \$ 7.310            | 59%        | \$ 5.084            | 41%        | \$ 0              | 0%        |
| ICBF Sacúdete                                          | \$ 9.320              | \$ 0                | 0%         | \$ 9.320            | 100%       | \$ 0              | 0%        |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible                       | \$ 4.560              | \$ 100              | 2%         | \$ 4.460            | 98%        | \$ 0              | 0%        |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT)                      | \$ 2.809              | \$ 2.804            | 100%       | \$ 5                | 0%         | \$ 0              | 0%        |
| Colombia Sostenible                                    | \$ 2.738              | \$ 2.738            | 100%       | \$ 0                | 0%         | \$ 0              | 0%        |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE)                   | \$ 1.820              | \$ 1.820            | 100%       | \$ 0                | 0%         | \$ 0              | 0%        |
| Herencia Colombia                                      | \$ 426                | \$ 75               | 18%        | \$ 351              | 82%        | \$ 0              | 0%        |
| KFW                                                    | \$ 0                  | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         | \$ 0              | 0%        |
| AFD                                                    | \$ 0                  | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         | \$ 0              | 0%        |
| Visión Amazonía                                        | \$ 0                  | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         | \$ 0              | 0%        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>\$ 3.153.634</b>   | <b>\$ 2.306.595</b> | <b>73%</b> | <b>\$ 697.018</b>   | <b>22%</b> | <b>\$ 150.021</b> | <b>5%</b> |






La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

## Línea del Tiempo

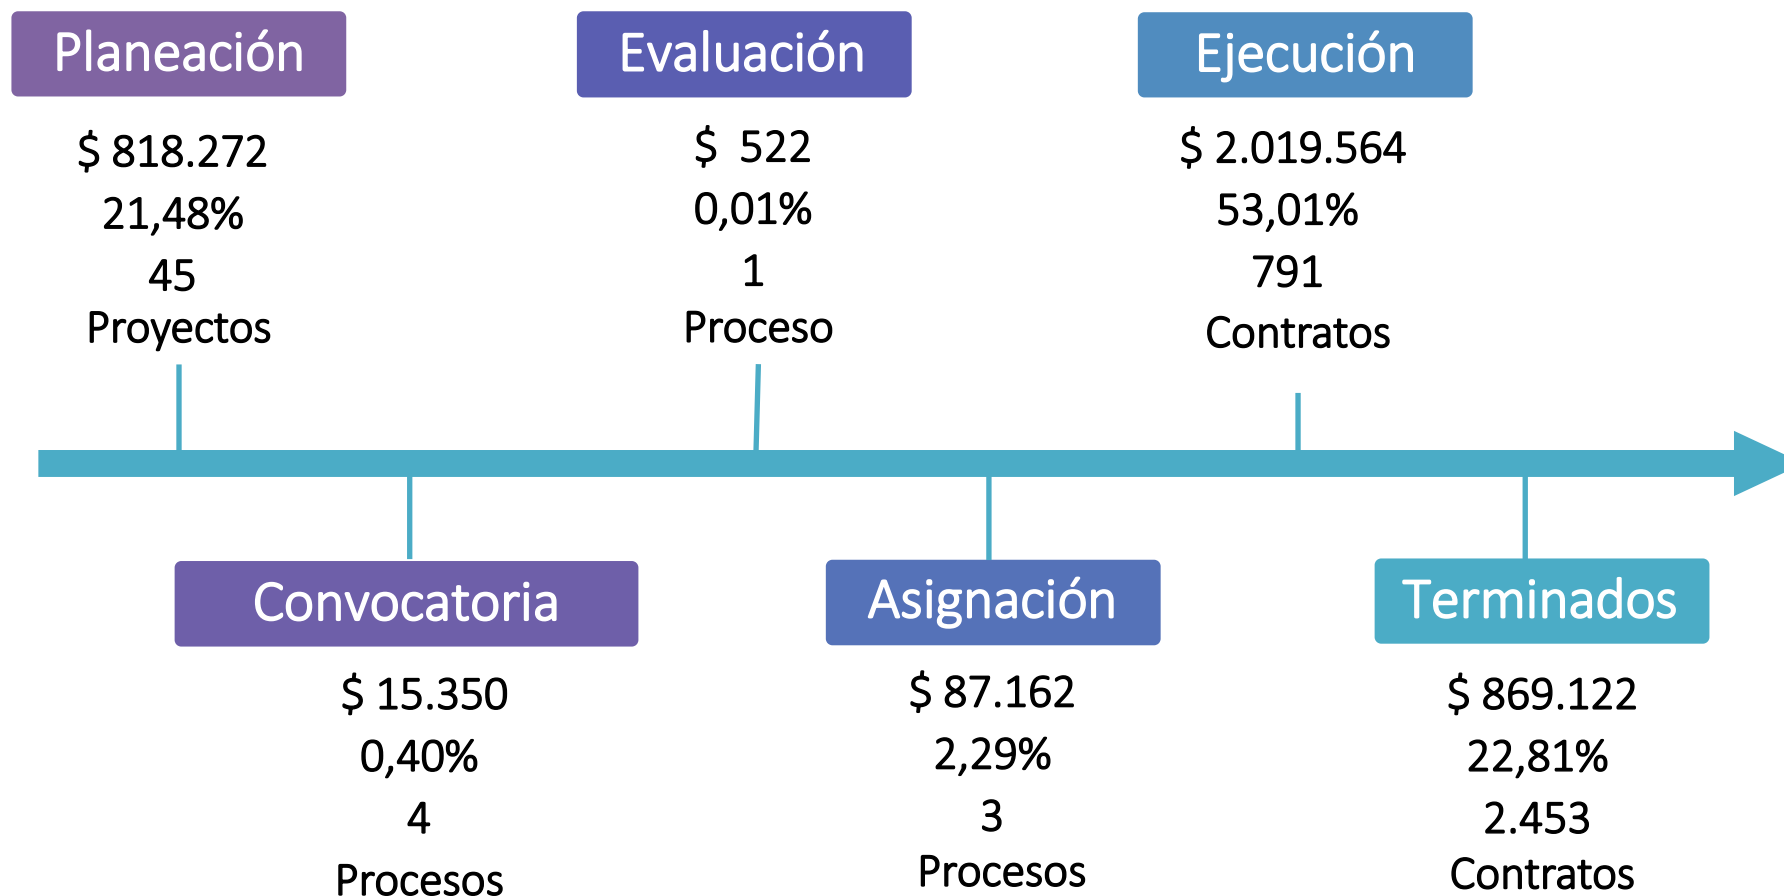

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 316.521

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ 82.261

Ejecución  
\$ 935.078

Terminado  
\$ 443.749

## Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 316.521

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor      |
|--------------------------------------|------------|
| Por asignar                          | \$ 313.647 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 2.765   |
| Asistencia Alimentaria               | \$ 110     |

Sustitución



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 82.261

Ejecución

Terminados



Sustitución

| Nombre corto                         | Entidad Solicitante | Contratista                                                                                                                                                             | Valor     | Fecha estimada inicio de contrato |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Atención Familias Vinculadas al PNIS | <u>ART</u>          | Grupo 1:<br>Consorcio Amazonía 2021<br><br>Grupo 2:<br>Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales<br><br>Grupo 3:<br>Unión Temporal Caribe en Paz 2021 | \$ 63.149 | 24 de junio de 2021               |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 82.261

Ejecución

Terminados



| Nombre corto       | Entidad Solicitante | Contratista                                                                                                                              | Valor     | Fecha estimada inicio de contrato |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Operador Ambiental | <u>ART</u>          | Grupo 1:<br>UT Desarrollo Rural 2021<br><br>Grupo 2:<br>Corporación Colombiana Internacional<br><br>Grupo 3:<br>Consortio Progreso Verde | \$ 19.112 | 24 de junio de 2021               |

Sustitución



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 935.078

Terminados

| Nombre corto                                                                   | Contratista           | # Contrato | Valor     | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos | Banco Agrario         | BAC 002    | \$819.032 | -             | Nov17 - Dic21        | 100%                   |
| Operador Logístico                                                             | -OEI-                 | 262-20     | \$ 89.169 | -             | Jun20 - Ago21        | 51%                    |
| Prestación de Servicios Persona Natural                                        | 227 OPS               | N/A        | \$ 14.893 | -             | May20- Jun22         | 50%                    |
| Operador PNIS                                                                  | COFESCO               | 896-20     | \$ 3.876  | -             | Ene21 - Ene22        | 10%                    |
| Arrendamientos                                                                 | Situando SAS          | 254-19     | \$ 2.945  | -             | Oct19 - Oct21        | 85%                    |
|                                                                                |                       | 411-20     | \$ 704    | -             | Ago20 - Oct21        | 64%                    |
| Transporte Público Terrestre                                                   | AS Transportes        | 28-21      | \$ 2.392  | -             | Feb21 - Feb22        | 21%                    |
| Gastos de Desplazamiento                                                       | N/A                   | N/A        | \$1.187   | -             | N/A                  | 71%                    |
| Tiquetes Aéreos                                                                | Festival Tours S.A.S. | 470-19     | \$ 881    | -             | Dic19 - Jun21        | 16%                    |

\$935.078\*

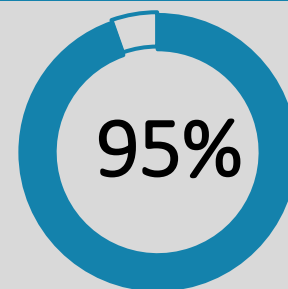

EJECUCIÓN

Sustitución



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 443.749

| Contratista                                                   | # Contrato | Valor*    | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| UNODC                                                         | AF 002     | \$319.078 | \$ 6.201      | dic-20            | En proceso de liquidación |
| UNODC                                                         | AF 001     | \$ 67.500 | -             | dic-19            | En proceso de liquidación |
| Fedecacao                                                     | 123-17     | \$ 11.554 | -             | may-21            | En proceso de liquidación |
| Federación Nacional de Cafeteros                              | 760-18     | \$ 10.946 | -             | nov-20            | En proceso de liquidación |
| Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA | 561-18     | \$ 8.643  | \$ 1.182      | sep-19            | En proceso de liquidación |
| 217 Prestación de Servicios Persona Natural                   | -          | \$ 8.643  | -             | dic-18            | Liquidado                 |
| 134 Prestación de Servicios Persona Natural                   | -          | \$ 7.391  | -             | dic-18            | En proceso de liquidación |
| Transportes Especiales ACAR S.A.                              | 1-20       | \$ 1.017  | -             | ene-20            | En proceso de liquidación |
| Ecomún                                                        | 771-18     | \$ 880    | -             | Oct-19            | En proceso de liquidación |
| Fundación Preservar Colombia                                  | 792-18     | \$ 695    | -             | dic-18            | En proceso de liquidación |
| Semillas Valle S.A.                                           | 76-20      | \$ 20     | -             | nov-20            | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

Sustitución



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 43.279

Convocatoria  
\$ 15.200

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 232.034

Terminado  
\$ 226.492

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 43.279

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor     |
|--------------------------------------|-----------|
| Por asignar ART                      | \$ 29.472 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 11.300 |
| Operador Logístico                   | \$ 2.508  |

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria  
\$ 15.200

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                                          | Entidad Solicitante | Valor    | Fecha cierre de recepción de propuestas |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------|
| Implementación de proyectos de generación de ingresos | <a href="#">ART</a> | \$ 8.933 | 18 de junio de 2021                     |
| Operador Logístico                                    | <a href="#">ART</a> | \$ 5.926 | 02 de julio de 2021                     |
| Diseño línea base PDET                                | <a href="#">ART</a> | \$ 341   | 25 de junio de 2021                     |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 232.034

Terminados

| Nombre corto  | Contratista                                           | # Contrato | Valor     | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Obras Civiles | Fundación Plan                                        | 436-19     | \$ 27.589 | -             | Feb20 - Nov21        | 0%                     |
|               | Fundación SOCYA                                       | 112-20     | \$ 18.641 | -             | Jul20 - Ago21        | 0%                     |
|               | Consorcio EGA                                         | 439-19     | \$15.017  | -             | Feb20 - Jun21        | 0%                     |
|               | Consorcio FAM                                         | 111-20     | \$14.746  | -             | Abr20 - Jul21        | 0%                     |
|               | Consorcio CEG-OME                                     | 162-20     | \$14.691  | -             | Abr20 - Ago21        | 0%                     |
|               | U.T. Futuro Pazcífico                                 | 110-20     | \$ 11.137 | -             | Jul20 - Ago21        | 0%                     |
|               | Corporación Ayuda Humanitaria                         | 109-20     | \$ 9.475  | -             | Jul20 - Ago21        | 0%                     |
|               | Consorcio M&M PDET                                    | 312-20     | \$ 9.465  | -             | Jul20 - Ago21        | 0%                     |
|               | Unión Temporal para el Desarrollo Territorial         | 438-19     | \$ 8.098  | -             | Feb20 - Jun21        | 0%                     |
|               | Consorcio M&M FAM                                     | 311-20     | \$ 6.893  | -             | Jul20 - Ago21        | 0%                     |
|               | Consorcio EGA                                         | 440-19     | \$ 5.646  | -             | Feb20 - Jun21        | 0%                     |
|               | Consorcio Construyendo Paz                            | 437-19     | \$ 4.136  | -             | Feb20 - Jun21        | 0%                     |
|               | U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima | 161-20     | \$ 3.250  | -             | Jul20 - Ago21        | 0%                     |

\$232.034\*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*La variación corresponde a suscripción de 21 OPS.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 232.034

Terminados

| Nombre corto                                                                                                                                                | Contratista                                         | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II | Unión Temporal Urabá en Desarrollo                  | 454-18     | \$22.330 | -             | Feb18 -Jul21         | 90%                    |
| Prestación de Servicios                                                                                                                                     | 278 OPS                                             | N/A        | \$17.269 | -             | Jun20 - Jun22        | 34%                    |
| Interventoría Obras PDET                                                                                                                                    | Consorcio Interobras 2019                           | 497-19     | \$ 7.805 | -             | Ene20 - Jul21        | 18%                    |
|                                                                                                                                                             | Consorcio Bienestar Comunitario                     | 496-19     | \$ 7.448 | -             | Jul20 - Oct21        | 12%                    |
|                                                                                                                                                             | Unión Temporal Vive Colombia                        | 495-19     | \$ 6.924 | -             | Ene20 - Ago21        | 17%                    |
| Operador Logístico                                                                                                                                          | Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS | 18-21      | \$ 5.017 | -             | Ene21 - Ene22        | 52%                    |
| Gastos de Desplazamiento                                                                                                                                    | Gastos de Desplazamiento                            | N/A        | \$ 2.464 | -             | N/A                  | 71%                    |
| Construcción de puente vehicular                                                                                                                            | Norte Ingenieros Ltda.                              | 167-21     | \$ 2.282 | -             | May21 - Nov21        | 0%                     |
| Transporte Terrestre                                                                                                                                        | Consorcio ART JRUNOA                                | 200-21     | \$ 2.004 | -             | Abr21 - Ene22        | 0%                     |

\$232.034\*

54%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*La variación corresponde a suscripción de 21 OPS.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 232.034

Terminados

| Nombre corto                                                 | Contratista                                                                   | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Convenio                                                     | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO | 355-20     | \$ 2.000 | \$ 1.560      | Sep20 - Nov21        | 45%                    |
| Plataforma Tecnológica                                       | Software Estratégico S.A.S.                                                   | 445-20     | \$ 1.532 | -             | Ago20 - Ago21        | 20%                    |
| Proyectos Productivos                                        | Unión Temporal Emprendimiento                                                 | 14-21      | \$ 1.171 | -             | Feb21 - Abr22        | 0%                     |
| Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó | COCOMACIA                                                                     | 821-20     | \$ 889   | -             | Dic20 - Dic21        | 0%                     |
| Tiquetes Aéreos                                              | Subatours Ltda.                                                               | 57-19      | \$ 718   | -             | Jun19 - Oct21        | 55%                    |
| Ejecución de Planes de Negocio                               | Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar                                   | 47-21      | \$ 643   | -             | Mar21 - Nov21        | 0%                     |
| Licencia plataforma tecnológica                              | ERSI Colombia S.A.S.                                                          | 858-20     | \$ 545   | -             | Ene21 - Nov22        | 100%                   |
| Servicios Integrales de comunicación                         | Radio Televisión Nacional de Colombia                                         | 91-21      | \$ 350   | -             | May21 - May22        | 0%                     |
| Interventoría Construcción de puente vehicular               | Consorcio Intervial Antioquia                                                 | 157-21     | \$ 298   | -             | May21 - Nov21        | 0%                     |

\$232.034\*

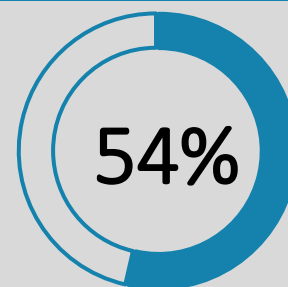

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*La variación corresponde a suscripción de 21 OPS.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 226.492

| Contratista                                     | # Contrato | Valor*    | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado                    |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Carvajal Tecnología y Servicios                 | 124-17     | \$52.764  | -             | feb-19            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios Persona Natural         | 1011 OPS   | \$33.062  | -             | feb-19            | En proceso de liquidación |
| Consorcio Infraestructura Sostenible            | 408-18     | \$22.084  | -             | feb-20            | En proceso de liquidación |
| Federación de Cafeteros de Colombia             | 455-18     | \$16.467  | -             | feb-20            | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Guanga                           | 534-18     | \$16.132  | -             | mar-20            | En proceso de liquidación |
| Consorcio Caguan 2018                           | 538-18     | \$ 13.890 | -             | ene-20            | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural         | 380 OPS    | \$9.875   | -             | jul-18            | Liquidado                 |
| Federación de Cafeteros de Colombia             | 456-18     | \$8.769   | -             | dic-20            | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Renacer 2017                     | 537-18     | \$8.424   | -             | dic-19            | En proceso de liquidación |
| Sociedad Hotelera Tequendama S.A.               | 157-19     | \$ 7.780  | -             | dic-20            | En proceso de liquidación |
| Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi | 409-18     | \$5.612   | -             | dic-19            | En proceso de liquidación |
| Consorcio Chocó 2017                            | 539-18     | \$5.588   | -             | feb-20            | En proceso de liquidación |
| Consorcio GOC- NOGAAL                           | 1086-18    | \$5.272   | -             | mar-21            | En proceso de liquidación |
| U.T. Inter Infraestructura Social               | 1085-18    | \$5.225   | -             | feb-21            | En proceso de liquidación |
| Transportes Especializados JR S.A.S.            | 292-19     | \$3.156   | -             | abr-21            | En proceso de liquidación |
| Corporación Prohaciendo                         | 542-18     | \$2.759   | -             | dic-19            | En proceso de liquidación |
| Deloitte Asesores y Consultores Ltda.           | 209-19     | \$ 1.965  | -             | Jun-20            | Liquidado                 |
| Situando S.A.S                                  | 160-19     | \$ 1.837  | -             | ago-20            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 226.492

| Contratista                                         | # Contrato | Valor*   | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Consortio Edificando Paz                            | 535-18     | \$1.848  | -             | nov-19            | En proceso de liquidación |
| Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.             | 489-19     | \$ 1.230 | -             | abr-21            | En proceso de liquidación |
| Corporación para el desarrollo de las Microempresas | 519-19     | \$ 1.142 | -             | ene-21            | En proceso de liquidación |
| Rafael Poveda Televisión S.A.S.                     | 886-18     | \$973    | -             | nov-19            | Liquidado                 |
| Controles Empresariales S.A.S                       | 412-20     | \$ 628   | -             | oct-20            | Liquidado                 |
| Gastos Varios                                       | -          | \$ 10    | -             | feb-19            | Liquidado                 |
| BMC S.A. – BMC EXCHANGE                             | 2-19       | \$0      | -             | nov-19            | Liquidado                 |

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 146.183

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ 522

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 517.588

Terminado  
\$ 74.435

## Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 146.183

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                        | Valor     |
|-------------------------------------|-----------|
| Asignación Mensual                  | \$ 78.910 |
| Proyectos Productivos               | \$ 24.603 |
| Por asignar ARN                     | \$ 23.348 |
| Renta Básica                        | \$ 10.489 |
| BEPS y Pensión                      | \$ 4.796  |
| Coordinación Proyectos Productivos  | \$ 1.560  |
| Asignación Única                    | \$ 1.356  |
| Gastos Bancarios                    | \$ 784    |
| Contratos de prestación de servicio | \$ 94     |
| Servicio de transporte terrestre    | \$ 85     |
| Tiquetes Aéreos                     | \$ 85     |
| Arrendamiento de Equipos            | \$ 74     |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 522

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

| Nombre corto                                                     | Entidad Solicitante | Valor  | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha publicación informe final de evaluación |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales | <u>ART</u>          | \$ 522 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. C&amp;TH S.A.S</li><li>2. Asociación de Ingenieros Agrónomos de Uraba</li><li>3. Asociación de Productores Agropecuarios Colombianos</li><li>4. Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Uraba Antonio Roldan Betancur</li><li>5. Federación de Ganaderos del Cesar</li></ol> | 01 de julio de 2021                           |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 517.588

Terminados

| Nombre corto                                 | Contratista                                           | # Contrato | Valor      | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas   | Banco Agrario                                         | BAC 001    | \$ 402.720 | -             | Sep17 - Sep21        | 100%                   |
| Beneficios económicos: Proyectos productivos | N/A                                                   | N/A        | \$ 52.218  | -             | Jun18 - May22        | 99.8%                  |
| Pagos de pensión y BEPS                      | N/A                                                   | N/A        | \$ 30.740  | -             | Sep17 - May22        | 100%                   |
| Suministro de víveres secos                  | UT FCP 2021                                           | 217-21     | \$ 25.546  | -             | May21 - Ene22        | 0%                     |
| Convenio                                     | Innpulsa Colombia                                     | 613-20     | \$ 2.060   | \$ 200        | Nov20 - May22        | 27%                    |
| Coordinación proyectos productivos           | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | 245-20     | \$ 1.500   | \$ 600        | Oct20 - Oct21        | 25%                    |
| Prestación de Servicios                      | 15 OPS                                                | N/A        | \$ 1.182   | -             | Ene21 - Abr22        | 23%                    |
| Kits de Asepsia                              | Experiencia S.A.S                                     | 925-20     | \$ 400     | -             | Ene21 - Ene22        | 75%                    |
| Arrendamiento Equipos Tecnológicos           | Geoscan Ingeniería S.A.S.                             | 123-20     | \$ 149     | -             | Jul20 - Nov21        | 70%                    |
| Gastos de desplazamiento                     | N/A                                                   | N/A        | \$ 230     | -             | N/A                  | 93%                    |
| Suscripción AROGIS DESKTOP                   | ESRI Colombia S.A.S.                                  | 163-20     | \$ 42      | -             | Jun20 - Jun21        | 100%                   |

\$517.588\*

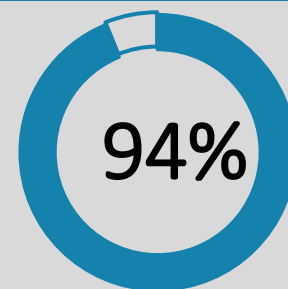

EJECUCIÓN

Reincorporación



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 74.435

| Contratista                       | # Contrato | Valor*    | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Integral Servicios SAS            | 125-20     | \$ 30.447 | -             | abr-21            | En proceso de liquidación |
| Consortio Semillas para Alimentar | 374-19     | \$13.902  | -             | mar-20            | Liquidado                 |
| Integral Servicios S.AS.          | 42-19      | \$12.219  | -             | nov-19            | Liquidado                 |
| Fundapanaca                       | 550-17     | \$ 3.500  | \$ 1.500      | mar-18            | Liquidado                 |
| Fundación Caminemos Juntos F.C.J. | 12-19      | \$ 4.037  | -             | may-19            | Liquidado                 |
| Innpulsa Colombia                 | 142-19     | \$ 3.376  | \$ 200        | ago-20            | En proceso de liquidación |
| Soluciones J.R. E.U.              | 3-19       | \$ 2.820  | -             | mar-19            | Liquidado                 |
| ALECOP S Coop. Sucursal Colombia  | 617-18     | \$ 1.050  | -             | jun-18            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios 13 OPS    | N/A        | \$ 798    | -             | feb-20            | En proceso de liquidación |
| Conincag S.A.S.                   | 143-20     | \$ 251    | -             | abr-20            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios 6 OPS     | N/A        | \$ 254    | -             | feb-20            | Liquidado                 |
| Subatours S.A.S                   | 24-20      | \$ 82     | -             | may-21            | En proceso de liquidación |
| BMC S.A. – BMC Exchange           | 2-19       | \$ 0      | -             | nov-19            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ 128

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 7.088

Terminado

\$ 36.848

## Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 128

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto    | Valor  |
|-----------------|--------|
| Por asignar JEP | \$ 128 |

Jurisdicción  
Especial de  
Paz



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 7.088

Terminados

| Nombre corto                                   | Contratista                          | # Contrato | Valor    | Inicio -<br>Terminación | % Ejecución<br>Financiera |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Sistemas de información                        | Servisoft S.A.                       | 56-19      | \$5.376  | Jul19 - Mar22           | 67%                       |
| Digitalización Archivo General<br>de la Nación | Archivo General de la<br>Nación      | 498-19     | \$ 1.550 | Feb20 - Jun21           | 43%                       |
| ARL                                            | Positiva Compañía de<br>Seguros S.A. | N/A        | \$82     | N/A                     | 94%                       |
| Gastos de Desplazamiento                       | N/A                                  | N/A        | \$80     | N/A                     | 71%                       |

\$7.088



EJECUCIÓN

Jurisdicción  
Especial de  
Paz



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 36.848

| Contratista                             | # Contrato | Valor*    | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Juan Gaviria Restrepo & Cía.            | 572-17     | \$ 11.740 | jun-18            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 231 OPS    | \$ 10.377 | nov-18            | Liquidado                 |
| Softplan Sistemas Colombia              | 168-19     | \$9.139   | ene-21            | En proceso de liquidación |
| U.T. Convencionales Blindados 2018      | 788-18     | \$ 1.333  | ago-18            | Liquidado                 |
| U.T. L&K                                | 793-18     | \$ 768    | dic-18            | Liquidado                 |
| SICMES S.A.S.                           | 794-18     | \$ 614    | jul-18            | Liquidado                 |
| Password Consulting Services S.A.S.     | 897-18     | \$584     | mar-20            | Liquidado                 |
| Universidad de los Andes                | 402-18     | \$ 553    | nov-18            | Liquidado                 |
| UNIPAR alquiler de computadores S.A.    | 791-18     | \$ 485    | abr-19            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 8 OPS      | \$ 359    | dic-18            | En proceso de liquidación |
| IFX Networks Colombia SAS               | 796-18     | \$ 363    | oct-79            | Liquidado                 |
| Solution Copy Ltda.                     | 1082-18    | \$ 200    | mar-19            | Liquidado                 |
| Aon Risk Services                       | N/A        | \$ 156    | jun-18            | En proceso de liquidación |
| Grupo Coral Ingenieros S.A.S.           | 789-18     | \$ 100    | sep-18            | Liquidado                 |
| Solution Copy Ltda.                     | 795-18     | \$ 72     | dic-18            | Liquidado                 |
| Servicios Públicos                      | -          | \$ 6      | dic-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 6.744

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 563

Terminado  
\$ 20.568

## Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 6.744

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor    |
|--------------------------------------|----------|
| Por asignar Primera Infancia         | \$ 6.514 |
| Contratos de prestación de servicios | \$ 229   |

Primera  
Infancia



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$ 563

Terminados

Primera  
Infancia

| Nombre corto                            | Contratista     | # Contrato | Valor | Inicio –<br>Terminación | % Ejecución<br>Financiera |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------|---------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 4 OPS           | N/A        | \$347 | Oct20 - Sep22           | 19%                       |
| Tiquetes Aéreos                         | Subatours Ltda. | 57-19      | \$160 | Jun19 - Oct21           | 15%                       |
| Gastos de Desplazamiento                | N/A             | N/A        | \$56  | N/A                     | 67%                       |

\$ 563

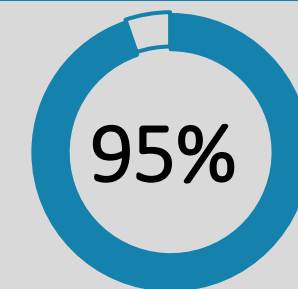

EJECUCIÓN



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 20.568

Primera  
Infancia

| Contratista                                                        | # Contrato | Valor*  | Fecha Terminación | Estado                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------------------|
| Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación | 500-19     | \$3.877 | nov-20            | Liquidado                 |
| Save the Children                                                  | 540-18     | \$3.198 | jul-18            | Liquidado                 |
| Unión Temporal Risas Latinas para la Paz                           | 233-19     | \$3.074 | nov-20            | En proceso de liquidación |
| Fundación de Atención a la Niñez                                   | 213-19     | \$2.076 | ago-20            | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural                            | 46 OPS     | \$1.920 | feb-19            | Liquidado                 |
| C & M Consultores S.A.                                             | 117-19     | \$1.499 | dic-20            | En proceso de liquidación |
| Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia                         | 471-19     | \$1.391 | nov-20            | Liquidado                 |
| Fundación Hogar Juvenil                                            | 211-19     | \$1.390 | ago-20            | En proceso de liquidación |
| Fundación Promoción y Gestión Social                               | 782-18     | \$1.076 | ago-18            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios Persona Natural                            | 22 OPS     | \$1.066 | sep-19            | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 38

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ -

Terminado  
\$ 2.809

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 38

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                            | Valor |
|-----------------------------------------|-------|
| Por asignar Agencia Nacional de Tierras | \$ 38 |

Agencia  
Nacional de  
Tierras



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.809

| Contratista                                   | # Contrato | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 78 Prestación de Servicios<br>Persona Natural | -          | \$ 2.372 | jul-18            | Liquidado                 |
| 11 Prestación de Servicios<br>Persona Natural | -          | \$ 432   | dic-18            | En proceso de liquidación |
| Gastos de Viajes                              | -          | \$ 5     | abr-18            | Liquidado                 |
| Gastos Varios                                 | -          | \$ 0,17  | mar-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 2.465

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 33.387

Terminado  
\$ 32.462

## Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 2.465

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



### Funcionamiento

| Nombre corto                     | Valor    |
|----------------------------------|----------|
| Por asignar Funcionamiento       | \$ 2.242 |
| Servicio de transporte terrestre | \$ 90    |
| Página Web                       | \$ 83    |
| Custodia de Documentos           | \$ 43    |
| Pólizas                          | \$ 7     |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 33.387

Terminados

| Nombre corto             | Contratista                      | # Contrato | Valor     | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Comisión Fiduciaria      | Fiduprevisora                    | CF001-19   | \$ 12.555 | Oct19 - May22       | 59%                    |
| Nómina                   | Su Temporal SAS                  | 166-21     | \$ 8.169  | May21 - May22       | 0%                     |
| Nómina                   | N/A                              | N/A        | \$ 6.614  | Sep17 - May22       | 98%                    |
| Servicios TIC            | IMPRETIC'S E.I.C.E               | 304-21     | \$ 2.376  | May21 - May22       | 0%                     |
| Asunción de Gastos       | N/A                              | N/A        | \$ 828    | Nov18 - May22       | 98%                    |
| Arrendamiento            | Tecnología Inmobiliaria S.A.     | 535-20     | \$ 659    | Dic20 - Nov22       | 26%                    |
| Auditoría                | Ernst & Young                    | 867-20     | \$ 631    | Dic20 - Oct21       | 50%                    |
| Tiquetes Aéreos          | Subatours Ltda.                  | 57-20      | \$446     | Jun19 - Oct21       | 50%                    |
| Gastos de Desplazamiento | N/A                              | N/A        | \$ 375    | N/A                 | 79%                    |
| Custodia de Documentos   | Protech Ingeniería S.A.S.        | 107-20     | \$ 143    | May20 - Jun21       | 83%                    |
| Póliza                   | Liberty Seguros                  | N/A        | \$ 188    | Jul20 - Jul21       | 100%                   |
| Cartillas                | Fenix Media Group SAS            | 123-21     | \$ 122    | Mar21 - Nov21       | 0%                     |
| Aseo y Cafeteria         | Grupo Empresarial SEISO          | 67-21      | \$ 90     | Mar21 - Mar22       | 0%                     |
| Gastos varios            | N/A                              | N/A        | \$ 77     | N/A                 | 76%                    |
| Traducciones             | English Link Global S.A.S.       | 922-20     | \$ 50     | Dic20 - Dic21       | 7%                     |
| Adecuaciones             | Arquiredes Construcciones S.A.S. | 510-21     | \$ 30     | Jun21 - Jul21       | 0%                     |
| Suministro Papelería     | Grupo Los Lagos S.A.S.           | 1-19       | \$ 29     | Feb19 - Dic21       | 43%                    |
| Póliza                   | Equidad Seguros                  | N/A        | \$ 7      | Jun20 - Jun21       | 100%                   |

\$33.387



EJECUCIÓN

Funcionamiento



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 32.462

| Contratista                                | # Contrato | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|--------------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Comisión Fiduciaria                        | CF001-18   | \$ 6.619 | sep-19            | Liquidado                 |
| Gente Oportuna S.A.S.                      | 43-19      | \$ 6.062 | Jun-20            | Liquidado                 |
| Su Temporal S.A.S.                         | 335-20     | \$ 6.028 | abr-21            | En proceso de liquidación |
| Linktic S.AS.                              | 40-19      | \$ 2.298 | Jun-20            | En proceso de liquidación |
| U.T. Itelcom- FP 2017                      | 765-18     | \$ 2.101 | may-19            | Liquidado                 |
| Fiducoldex                                 | 124-17     | \$ 1.536 | mar-18            | Liquidado                 |
| Ernst & Young                              | N/A        | \$ 1.397 | may-19            | Liquidado                 |
| Linktic S.AS.                              | 372-20     | \$ 1.284 | may-21            | En proceso de liquidación |
| Ernst & Young                              | 55-19      | \$ 964   | dic-20            | Liquidado                 |
| Juan Gaviria Restrepo & Cía.               | 397-18     | \$ 778   | dic-18            | Liquidado                 |
| Ernst & Young                              | 1093-18    | \$ 605   | Jul19             | Liquidado                 |
| Tecnología Inmobiliaria S.A.               | 1085A-18   | \$ 560   | dic-20            | Liquidado                 |
| Unión Temporal Itelcom - FP 2017           | 334-17     | \$ 400   | dic-17            | En proceso de liquidación |
| 20 Prestación de Servicios Persona Natural | -          | \$ 555   | nov-18            | Liquidado                 |
| Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.          | 4-17       | \$ 212   | ene-18            | Liquidado                 |
| De Vivero & Asociados S.A.                 | 33-18      | \$ 163   | may-18            | Liquidado                 |
| Mundo Limpieza Ltda.                       | 44-19      | \$ 135   | mar-21            | En proceso de liquidación |
| De Vivero & Asociados S.A.                 | 3-17       | \$ 117   | dic-17            | Liquidado                 |
| Synersis                                   | 541-18     | \$ 96    | abr-18            | Liquidado                 |
| 2 Prestación de Servicios Persona Natural  | -          | \$ 66    | jun-18            | En proceso de liquidación |
| Dattis Comunicaciones S.A.S.               | 533-18     | \$ 80    | may-18            | Liquidado                 |
| Arquiredes Construcciones S.A.S.           | 122-17     | \$ 69    | nov-17            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 32.462

| Contratista                               | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado    |
|-------------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Eminser S.A.S.                            | 781-18     | \$ 65  | may-19            | Liquidado |
| Armtrans Ltda.                            | 121-17     | \$ 41  | dic-17            | Liquidado |
| Servicios Públicos                        | -          | \$ 38  | abr-19            | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S.          | 255-19     | \$ 33  | jun-20            | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S.          | 335-17     | \$ 33  | nov-17            | Liquidado |
| MCH Traducciones S.A.S                    | 108-19     | \$ 22  | jun-20            | Liquidado |
| Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.       | 125-17     | \$ 21  | dic-17            | Liquidado |
| Rumbos S.A.S.                             | 790-18     | \$ 15  | may-18            | Liquidado |
| Arquiredes                                | 608-20     | \$14   | oct-20            | Liquidado |
| Irotama SAS                               | 280-19     | \$ 7   | nov-19            | Liquidado |
| MCH Traducciones S.A.S                    | 253-20     | \$ 6   | oct-20            | Liquidado |
| PEC Servicios Especializados Ltda.        | 896-18     | \$ 6   | jun-19            | Liquidado |
| ABM Comercializadora S.A.S.               | 126-17     | \$ 6   | dic-17            | Liquidado |
| Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.       | 59-19      | \$ 6   | jun-19            | Liquidado |
| English Link Global S.A.S.                | 60-19      | \$ 5   | jun-19            | Liquidado |
| Gastos Admin. y de Operación              | N/A        | \$ 5   | dic-18            | Liquidado |
| Vector Ltda.                              | 375-19     | \$ 5   | nov-19            | Liquidado |
| Casa Editorial el Tiempo                  | 98-20      | \$ 5   | mar-20            | Liquidado |
| Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. | 820-20     | \$ 4   | dic-20            | Liquidado |
| Comunican S.A                             | 99-20      | \$ 1   | mar-20            | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 6.629

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 10.251

Terminado  
\$ 13.205

## Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 6.629

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



### Estabilización

| Nombre corto                         | Valor    |
|--------------------------------------|----------|
| Por asignar Estabilización           | \$ 4.456 |
| Transporte Aéreo                     | \$ 850   |
| Servicios Integrales de Comunicación | \$ 840   |
| Contratos de prestación de servicios | \$ 480   |
| Memorias USB                         | \$ 3     |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 10.251

Terminados

| Nombre corto                            | Contratista                                                  | # Contrato | Valor   | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 46 OPS                                                       | N/A        | \$5.791 | Jun20 - May22       | 36%                    |
| Operador Logístico                      | Imagen & Color Publicitario S.A.S                            | 434-19     | \$1.800 | Dic19 - Dic21       | 19%                    |
| Helicóptero                             | Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía | 183-20     | \$1.700 | Jul20 - Jul21       | 100%                   |
| Gastos de Desplazamiento                | N/A                                                          | N/A        | \$ 416  | N/A                 | 75%                    |
| Tiquetes Aéreos                         | Subatours Ltda.                                              | 57-19      | \$ 300  | Jun19 - Oct21       | 46%                    |
| Monitoreo de Medios                     | Mercar Internet Ltda.                                        | 53-20      | \$ 120  | Mar20 - Sep21       | 77%                    |
| Gastos Varios                           | N/A                                                          | N/A        | \$ 74   | N/A                 | 27%                    |
| Servicios de traducción                 | Consulting & Translation Company S.A.S.                      | 296-20     | \$ 50   | Jun20 - Jun21       | 33%                    |

\$10.251\*

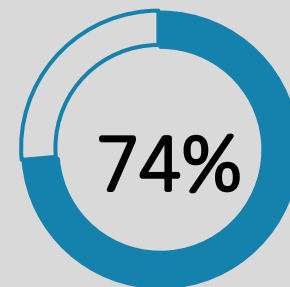

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*La variación corresponde a suscripción de 1 contrato de OPS

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 13.205

| Contratista                                       | # Contrato | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural           | 40 OPS     | \$ 4.099 | ago-18            | En proceso de liquidación |
| Propaís                                           | 403-18     | \$ 2.991 | jul-18            | Liquidado                 |
| J. Walter Thompson Colombia S.A.S.                | 558-18     | \$ 2.770 | jul-18            | Liquidado                 |
| Prestación de Servicios Persona Natural           | 31 OPS     | \$1.954  | jun-18            | Liquidado                 |
| Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM | 616-18     | \$ 991   | Jul-19            | En proceso de liquidación |
| Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.        | 532-18     | \$ 251   | jul-18            | Liquidado                 |
| Dattis Comunicaciones S.A.S.                      | 565-17     | \$ 71    | dic-17            | Liquidado                 |
| Ortegón Pulido Asociados S.A.S                    | 13-19      | \$ 62    | Sep-19            | Liquidado                 |
| Salamarquez S.A.S.                                | 559-17     | \$16     | dic-17            | Liquidado                 |
| Gastos Bancarios                                  | N/A        | \$0,01   | nov-17            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

## Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.820

| Contratista | # Contrato | Valor *  | Fecha Terminación | Estado    |
|-------------|------------|----------|-------------------|-----------|
| SAE         | 059        | \$ 1.820 | Abr 2019          | Liquidado |

Sociedad de  
Activos  
Especiales



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

# Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.738

| Contratista                               | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado    |
|-------------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Economía Urbana Ltda.                     | 786-18     | \$505  | dic-18            | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018           | 784-18     | \$503  | dic-18            | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018           | 787-18     | \$503  | dic-18            | Liquidado |
| OPTIM Consult SAS                         | 785-18     | \$497  | nov-18            | Liquidado |
| Consorcio Escuela Galán - JPC             | 783-18     | \$ 490 | dic-18            | Liquidado |
| 4 Prestación de Servicios Persona Natural | -          | \$ 240 | feb-17            | Liquidado |

Colombia  
Sostenible



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 60.528

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 258.571

Terminado  
\$ 13.640

## BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 60.528

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                          | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| Por asignar BID Préstamo              | \$ 53.688 |
| Proyectos productivos                 | \$ 5.085  |
| Proyectos de Restauración Ecológica   | \$ 1.731  |
| Roster de Estructuración de Proyectos | \$ 24     |

BID Préstamo



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.571

Terminados

| Nombre corto                                      | Contratista                                                  | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Conservation International                                   | 740-20     | \$ 6.720 | \$ 8.345      | Nov20 - Ene23        | 16%                    |
|                                                   | ECODELCA                                                     | 850-20     | \$ 5.497 | \$ 7.544      | Nov20 - Nov22        | 15%                    |
|                                                   | Misión Verde                                                 | 726-20     | \$ 1.926 | \$ 9.275      | Nov20 - Ene23        | 6%                     |
|                                                   | Corponariño                                                  | 848-20     | \$ 5.482 | \$ 3.791      | Nov20 - Nov22        | 0%                     |
|                                                   | Fundación Proterritorio                                      | 744-20     | \$ 1.873 | \$ 7.358      | Nov20 - Nov22        | 7%                     |
|                                                   | Fundación Chocolate tumaco                                   | 861-20     | \$ 4.499 | \$ 4.353      | Nov20 - Nov22        | 18%                    |
|                                                   | Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación | 785-20     | \$ 5.135 | \$ 2.355      | Nov20 - Ene23        | 24%                    |
|                                                   | Fundación Ayuda en Acción                                    | 762-20     | \$ 3.528 | \$ 2.781      | Nov20 - Ene23        | 20%                    |
|                                                   | ASOCAFE                                                      | 779-20     | \$ 1.089 | \$ 5.148      | Nov20 - Sep22        | 6%                     |
|                                                   | FESU                                                         | 734-20     | \$ 1.817 | \$ 3.815      | Nov20 - Nov22        | 11%                    |
|                                                   | HEVEANCOR                                                    | 793-20     | \$ 2.546 | \$ 2.871      | Nov20 - Ene23        | 16%                    |
|                                                   | ASOHECA                                                      | 859-20     | \$ 1.296 | \$ 4.014      | Nov20 - May22        | 9%                     |
|                                                   | Campodulce                                                   | 845-20     | \$ 2.718 | \$ 2.510      | Nov20 - Nov22        | 18%                    |
|                                                   | Fundación con vida                                           | 852-20     | \$ 3.397 | \$ 1.776      | Nov20 - Ene24        | 23%                    |
|                                                   | Universidad Nacional                                         | 737-20     | \$ 1.835 | \$ 3.211      | Nov20 - Ene23        | 13%                    |
|                                                   | CCI                                                          | 739-20     | \$ 828   | \$ 3.998      | Nov20 - Nov22        | 6%                     |
|                                                   | ONF Andina                                                   | 727-20     | \$ 1.332 | \$ 3.492      | Nov20 - May22        | 10%                    |
|                                                   | ONF ANDINA                                                   | 765-20     | \$ 2.753 | \$ 1.835      | Nov20 - Ene23        | 21%                    |

\$ 258.571

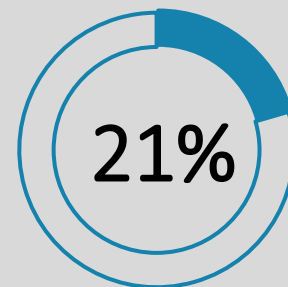

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 258.571

Terminados

| Nombre corto                                               | Contratista                                                          | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio -<br>Terminación | % Ejecución<br>Financiera |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Proyectos<br>Productivos y de<br>Restauración<br>Ecológica | ACAMAFRUT                                                            | 778-20     | \$ 1.593 | \$ 2.902      | Nov20 - May22           | 12%                       |
|                                                            | Patrimonio Natural Fondo para la<br>Biodiversidad y áreas Protegidas | 728-20     | \$ 2.459 | \$ 1.556      | Nov20 - Nov22           | 21%                       |
|                                                            | Fundación Crecer en Paz                                              | 735-20     | \$ 883   | \$ 3.006      | Nov20 - Nov22           | 8%                        |
|                                                            | CAFISUR                                                              | 742-20     | \$ 899   | \$ 2.916      | Nov20 - May22           | 8%                        |
|                                                            | SMURFIT                                                              | 795-20     | \$ 1.233 | \$ 2.375      | Nov20 - Nov23           | 12%                       |
|                                                            | CORPOTUNIA                                                           | 782-20     | \$ 666   | \$ 2.889      | Nov20 - Nov21           | 7%                        |
|                                                            | Corporación para estudios<br>Interdisciplinarios y asesoría técnica  | 764-20     | \$ 2.010 | \$ 1.338      | Nov20 - Ene23           | 21%                       |
|                                                            | MCC                                                                  | 786-20     | \$ 1.530 | \$ 1.683      | Nov20 - May22           | 17%                       |
|                                                            | COOBRA                                                               | 781-20     | \$ 765   | \$ 2.398      | Nov20 - Nov22           | 8%                        |
|                                                            | Funmineros                                                           | 923-20     | \$ 1.854 | \$ 1.243      | Dic20 - Feb23           | 21%                       |
|                                                            | Fudesco                                                              | 733-20     | \$ 1.071 | \$ 1.986      | Nov20 - Nov22           | 12%                       |
|                                                            | Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC                                         | 777-20     | \$ 833   | \$ 2.171      | Nov20 - Nov22           | 10%                       |
|                                                            | INPROSEC                                                             | 784-20     | \$ 639   | \$ 2.173      | Nov20 - Nov21           | 8%                        |
|                                                            | CORPOJAGUAR                                                          | 789-20     | \$ 954   | \$ 1.676      | Nov20 - Nov22           | 13%                       |
|                                                            | Fundación Trópico                                                    | 794-20     | \$ 709   | \$ 1.832      | Dic20 - Dic22           | 10%                       |
|                                                            | ASOGANADO                                                            | 787-20     | \$ 1.080 | \$ 1.203      | Nov20 - Nov22           | 17%                       |
|                                                            | CAFISUR                                                              | 741-20     | \$ 900   | \$ 1.383      | Nov20 - May22           | 14%                       |
|                                                            | CETEC                                                                | 743-20     | \$ 1.170 | \$ 991        | Nov20 - Nov22           | 19%                       |

\$ 258.571

21%

EJECUCIÓN



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 258.571

Terminados

| Nombre corto                                      | Contratista                                                                                   | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE                           | 738-20     | \$ 900   | \$ 1.214      | Nov20 - Nov22        | 15%                    |
|                                                   | Cabildo mayor indígena de Chigorodó                                                           | 846-20     | \$ 1.065 | \$ 1.001      | Nov20 - Nov22        | 18%                    |
|                                                   | Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana                             | 847-20     | \$ 1.125 | \$ 859        | Nov20 - May22        | 20%                    |
|                                                   | Fundación Caicedo González Riopaila Castilla                                                  | 792-20     | \$ 1.133 | \$ 839        | Nov20 - Nov22        | 20%                    |
|                                                   | Fundación Salva Terra                                                                         | 730-20     | \$ 1.125 | \$ 781        | Nov20 - Nov22        | 21%                    |
|                                                   | Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua | 856-20     | \$ 810   | \$ 953        | Nov20 - Nov22        | 16%                    |
|                                                   | FUN LATINO                                                                                    | 783-20     | \$ 888   | \$ 856        | Nov20 - Nov22        | 18%                    |
|                                                   | Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra                      | 844-20     | \$ 990   | \$ 757        | Nov20 - May22        | 20%                    |
|                                                   | Federación Campesina del Cauca FCC                                                            | 790-20     | \$ 792   | \$ 931        | Nov20 - Nov22        | 16%                    |
|                                                   | Fundación Suyusama                                                                            | 851-20     | \$ 1.160 | \$ 550        | Nov20 - Nov22        | 24%                    |
|                                                   | Fundación Ayudar                                                                              | 729-20     | \$ 790   | \$ 767        | Nov20 - Nov21        | 18%                    |
|                                                   | Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH                         | 780-20     | \$ 585   | \$ 943        | Nov20 - Nov21        | 13%                    |
|                                                   | Corporación Colombia Internacional CCI                                                        | 763-20     | \$ 899   | \$ 604        | Nov20 - Jul22        | 21%                    |
|                                                   | Fundación Preservar Colombia                                                                  | 855-20     | \$ 702   | \$ 749        | Nov20 - Ene24        | 17%                    |
|                                                   | Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó                                 | 853-20     | \$ 929   | \$ 398        | Nov20 - Ene23        | 25%                    |

\$ 258.571

21%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.571

Terminados

| Nombre corto                                      | Contratista                                                                       | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab                                        | 843-20     | \$ 630   | \$ 679        | Nov20 - Jul22       | 17%                    |
|                                                   | Fundación ayudar en Acción                                                        | 736-20     | \$ 657   | \$ 565        | Nov20 - Nov21       | 19%                    |
|                                                   | SEPAS - DIPAL                                                                     | 826-20     | \$ 621   | \$ 583        | Nov20 - May22       | 0%                     |
|                                                   | COPEX                                                                             | 788-20     | \$ 594   | \$ 583        | Nov20 - Nov22       | 18%                    |
|                                                   | Corporación Nueva Ruralidad                                                       | 791-20     | \$ 665   | \$ 474        | Nov20 - Nov22       | 20%                    |
|                                                   | Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre | 860-20     | \$ 661   | \$ 448        | Nov20 - Nov22       | 21%                    |
|                                                   | Asociación el futuro del mañana                                                   | 862-20     | \$ 773   | \$ 331        | Nov20 - May22       | 25%                    |
|                                                   | CORURAL                                                                           | 797-20     | \$ 639   | \$ 454        | Nov20 - Nov22       | 20%                    |
|                                                   | Campodulce                                                                        | 825-20     | \$ 628   | \$ 421        | Nov20 - May22       | 21%                    |
|                                                   | Corporación grupo trópico diverso                                                 | 857-20     | \$ 614   | \$ 416        | Nov20 - May22       | 21%                    |
|                                                   | Corporación Colombia Agropecuaria                                                 | 929-20     | \$ 612   | \$ 408        | Dic20 - Dic21       | 21%                    |
|                                                   | FMEPAC                                                                            | 854-20     | \$ 530   | \$ 355        | Nov20 - Nov21       | 21%                    |
|                                                   | Microempresas de Colombia MICROL                                                  | 796-20     | \$ 603   | \$ 412        | Nov20 - Nov22       | 21%                    |
|                                                   | Corporación Colombia Internacional CCI                                            | 761-20     | \$ 323   | \$ 216        | Nov20 - Nov22       | 21%                    |
| Roster de estructuración de proyectos             | Consorcio Agroproyectos 2018                                                      | 915-20     | \$ 1.603 | -             | Dic20 - Jun21       | 30%                    |
|                                                   | Prodesarrollo Limitada                                                            | 918-20     | \$ 1.597 | -             | Dic20 - Jun21       | 50%                    |
|                                                   | Corporación Colombia Internacional CCI                                            | 913-20     | \$ 1.577 | -             | Dic20 - Jun21       | 30%                    |
|                                                   | ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional                               | 917-20     | \$ 1.479 | -             | Dic20 - Jun21       | 48%                    |

\$ 258.571

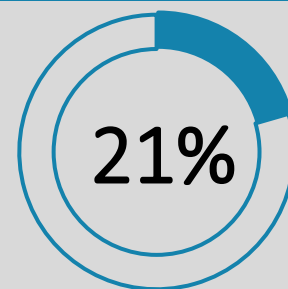

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.571

Terminados

| Nombre corto                                                 | Contratista                                                              | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Roster de estructuración de proyectos                        | UT Inerco Optim Estructuradores                                          | 926-20     | \$ 1.476 | -             | Dic20 - Jul21        | 30%                    |
|                                                              | UT Preservar Carbo Espira                                                | 927-20     | \$ 1.273 | -             | Dic20 - Jun21        | 50%                    |
| Prestación de Servicios                                      | 25 OPS                                                                   | N/A        | \$ 3.322 | -             | Ene20 - Feb22        | 55%                    |
| Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte | Viveka S.A.S.                                                            | 681-20     | \$ 1.117 | -             | Oct20 - Oct21        | 87%                    |
| Estructuración Integral de Proyectos                         | APCA Consorcio Sostenible 2020                                           | 842-20     | \$ 1.094 | -             | Nov20 - Jun21        | 30%                    |
|                                                              | Fundación SOCYA                                                          | 832-20     | \$ 1.078 | -             | Nov20 - Jun21        | 55%                    |
|                                                              | APCA Fundación Natura y Cadena de Valor                                  | 833-20     | \$ 1.074 | -             | Nov20 - Jul21        | 55%                    |
|                                                              | Proterritorio                                                            | 838-20     | \$ 1.047 | -             | Nov20 - Jun21        | 55%                    |
|                                                              | Portafolio Verde                                                         | 840-20     | \$ 1.040 | -             | Nov20 - Jun21        | 30%                    |
|                                                              | Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua                   | 839-20     | \$ 979   | -             | Nov20 - Jun21        | 55%                    |
|                                                              | Fundación Natura                                                         | 834-20     | \$ 793   | -             | Dic20 - Jun21        | 30%                    |
|                                                              | Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC | 841-20     | \$ 941   | -             | Nov20 - Jun21        | 55%                    |
|                                                              | APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia           | 836-20     | \$ 940   | -             | Nov20 - Jun21        | 55%                    |

\$ 258.571

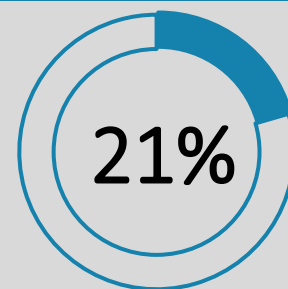

EJECUCIÓN

BID Préstamo



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.571

Terminados

| Nombre corto                                                | Contratista                                                                                                                | # Contrato | Valor  | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|----------------------|------------------------|
| Estructuración Integral de Proyectos                        | Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina | 837-20     | \$ 924 | -             | Nov20 - Jun21        | 30%                    |
|                                                             | Ecosimple                                                                                                                  | 835-20     | \$ 885 | -             | Nov20 - Jul21        | 30%                    |
| Interventoría                                               | U.T. Colombia en Paz Siempre                                                                                               | 919-20     | \$ 780 | -             | Dic20 - Jun21        | 55%                    |
|                                                             | Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario                                                            | 914-20     | \$ 745 | -             | Dic20 - Jun21        | 30%                    |
|                                                             | Fundación Colombia Nueva                                                                                                   | 916-20     | \$ 677 | -             | Dic20 - Jun21        | 30%                    |
| Estructuración de proyectos de infraestructura productiva   | Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA                                                      | 680-20     | \$ 479 | -             | Oct20 - Oct21        | 19%                    |
| Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible | Universidad de los Andes                                                                                                   | 309-20     | \$ 471 | -             | Jun20 - Jun21        | 60%                    |
| Auditoría                                                   | Deloitte & Touche Ltda.                                                                                                    | 24-21      | \$ 343 | -             | Ene21-N/A            | 45%                    |
| Tiquetes                                                    | Subatours SAS                                                                                                              | 214-19     | \$ 93  | -             | Ago19 - Jun21        | 14%                    |
| Gastos de Desplazamiento                                    | N/A                                                                                                                        | N/A        | \$ 37  | -             | N/A                  | 100%                   |
| Portal WEB                                                  | High Quality Solutions la E.U.                                                                                             | 831-20     | \$ 7   | -             | Nov20 - Nov21        | 50%                    |

\$ 258.571

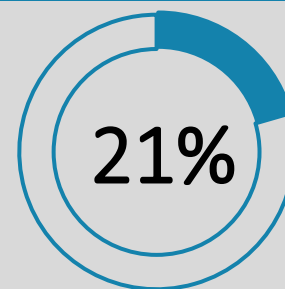

EJECUCIÓN

BID Préstamo



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 13.640

| Contratista                                         | # Contrato | Valor * | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Corporación Colombia Internacional                  | 399-19     | \$2.031 | -             | May 2020          | En proceso de Liquidación |
| ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional | 397-19     | \$1.929 | -             | May 2020          | En proceso de Liquidación |
| U.T. Inerco-Optim Estructuradores                   | 422-19     | \$1.927 | -             | May 2020          | En proceso de Liquidación |
| Prodesarrollo Ltda.                                 | 411-19     | \$1.538 | -             | May 2020          | En proceso de Liquidación |
| Consorcio Agroproyectos 2018                        | 421-19     | \$1.527 | -             | May 2020          | En proceso de Liquidación |
| U.T. Preservar – Carbo-Espira                       | 423-2019   | \$1.438 | -             | May 2020          | En proceso de Liquidación |
| 39 Contratos de Prestación de Servicios             | -          | \$1.118 | -             | Oct 2019          | En proceso de Liquidación |
| U.T. Colombia en Paz Siempre                        | 398-19     | \$1.058 | -             | Jul 2020          | Liquidado                 |
| 16 Contratos de Prestación de Servicios             | -          | \$ 996  | -             | Oct 2019          | Liquidado                 |
| Deloitte & Touche                                   | 97-20      | \$ 71   | -             | Jun 2020          | Liquidado                 |
| Publicaciones Semana S.A.                           | 563-20     | \$ 6    | -             | Sep 2020          | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 11.675

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 16.322

Terminado  
\$ 280

## BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

**Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 11.675

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                        | Valor     |
|-------------------------------------|-----------|
| Por asignar BID Facilidad           | \$ 11.637 |
| Contratos de Prestación de Servicio | \$ 38     |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 16.322

Terminados

| Nombre corto                                                 | Contratista                                                  | # Contrato | Valor    | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles               | Amazon Corporation Team                                      | 524-20     | \$ 1.530 | \$ 1.931      | Nov20 - Dic22        | 6%                     |
|                                                              | Fundación Preservar                                          | 523-20     | \$ 720   | \$ 1.038      | Ago20 - Sep22        | 12%                    |
|                                                              | Corpoamazonia                                                | 525-20     | \$ 1.017 | \$ 717        | Nov20 - Dic22        | 12%                    |
| Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte | Viveka S.A.S.                                                | 681-20     | \$ 1.748 | -             | Oct20 - Oct21        | 0%                     |
| Proyectos Productivos                                        | Interchurch Organization for Development Cooperation         | 57-21      | \$ 1.350 | \$ 1.309      | Feb21 - Nov23        | 10%                    |
|                                                              | Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco     | 928-20     | \$ 575   | \$ 1.942      | Feb21 - Feb23        | 4%                     |
| Consultoría                                                  | Fundación un Mundo sin Frontera                              | 522-20     | \$ 588   | \$ 401        | Sep20 - Oct22        | 23%                    |
| Estructuración de proyectos de infraestructura productiva    | Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca | 680-20     | \$ 748   | -             | Oct20 - Oct21        | 54%                    |
| Prestación de Servicios Persona Natural                      | 4 OPS                                                        | N/A        | \$ 331   | -             | Ene20 - Ago21        | 36%                    |
| Auditoría                                                    | Deloitte & Touche Ltda                                       | 45-20      | \$ 154   | -             | Feb21 - N/A          | 33%                    |
|                                                              |                                                              | 44-20      | \$ 100   | -             | Feb21 - N/A          | 20%                    |
| Tiquetes Aéreos                                              | Subatours S.A.S.                                             | 413-19     | \$ 51    | -             | Nov19 - Jun21        | 7%                     |
|                                                              |                                                              | 412-19     | \$ 48    | -             |                      | 2%                     |
| Gastos de Desplazamiento                                     | N/A                                                          | N/A        | \$ 24    | -             | N/A                  | 78%                    |

\$ 16.322\*

13%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

\*La variación corresponde a la adición de 1 contrato de OPS

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

BID Facilidad



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 280

| Contratista                             | # Contrato | Valor * | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 16 Contratos de Prestación de Servicios | N/A        | \$280   | -             | Nov 2019          | En proceso de Liquidación |
| Interchurch Organization For            | 593-20     | -       | -             | Ene 2021          | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 22.818

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 426

Terminado  
\$ -

## Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y  
otras estrategias de conservación, esta  
destinación es el 5% del recaudo del impuesto  
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 22.818

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                  | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Por asignar Herencia Colombia | \$ 22.818 |

Herencia  
Colombia



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 426

Terminados

| Nombre corto                            | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –<br>Terminación | % Ejecución<br>Financiera |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------|---------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 4 OPS       | N/A        | \$426 | Feb21 – Feb22           | 18%                       |

\$ 426

18%

EJECUCIÓN

Herencia  
Colombia



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 115.233

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 986

Terminado  
\$ -

## Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 115.233

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                                               | Valor      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible               | \$ 111.658 |
| Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia | \$ 2.940   |
| Contratos de Prestación de Servicio                        | \$ 635     |

Ambiente y  
Desarrollo  
Sostenible  
MADS



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 986

Terminados

| Nombre corto                            | Contratista | # Contrato | Valor  | Inicio –<br>Terminación | % Ejecución<br>Financiera |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 9 OPS       | N/A        | \$ 986 | Feb21 – Mar22           | 10%                       |

\$ 986

10%

EJECUCIÓN

Ambiente y  
Desarrollo  
Sostenible  
MADS



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 9.308

Convocatoria  
\$ 150

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ 4.901

Ejecución  
\$ 7.269

Terminado  
\$ 75

# Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 9.308

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto         | Valor    |
|----------------------|----------|
| Por asignar ANT 2019 | \$ 9.308 |

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria  
\$ 150

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto

Entidad Solicitante

Valor

Fecha cierre de recepción de  
propuestas

Avalúo comercial de predios

ANT

\$ 150

06 de julio de 2021

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 4.901

Ejecución

Terminados



| Nombre corto       | Entidad Solicitante | Contratista                                                                                                                              | Valor    | Fecha estimada inicio de contrato |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Operador Ambiental | <u>ANT</u>          | Grupo 1:<br>UT Desarrollo Rural 2021<br><br>Grupo 2:<br>Corporación Colombiana Internacional<br><br>Grupo 3:<br>Consortio Progreso Verde | \$ 4.901 | 24 de junio de 2021               |

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$ 7.269

Terminados

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019

| Nombre corto      | Contratista | # Contrato | Valor    | Inicio –<br>Terminación | % Ejecución<br>Financiera |
|-------------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Compra de Predios | Varios      | -          | \$ 7.269 | N/A                     | 100%                      |

\$ 7.269



EJECUCIÓN



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 75

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019

| Contratista                                                                 | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------------------|
| Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz | 244-20     | \$ 75   | May 21            | En proceso de Liquidación |



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 12.464

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ -

Terminado  
\$ -

# KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 12.464

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



| Nombre corto    | Valor     |
|-----------------|-----------|
| Por asignar KFW | \$ 12.464 |



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

## AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 4.259

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ -

Terminado  
\$ -

## VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible  
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria  
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020  
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 4.259

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Visión  
Amazonía



| Nombre corto                | Valor    |
|-----------------------------|----------|
| Por asignar Visión Amazonía | \$ 4.259 |



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 60.000

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ -

Terminado  
\$ -

## ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: Activa / Creada el 25 de Febrero de 2021



Temporalidad: N/A





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

Planeación  
\$ 60.000

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

ICBF  
Sacúdete



| Nombre corto                                  | Valor     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Por asignar ICBF Sacúdete                     | \$ 50.680 |
| Implementación Programa Generaciones Sacúdete | \$ 9.220  |
| Formulación de Proyectos de Vida              | \$ 100    |



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

# FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                    | <b>Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sede:</b>                      | Nueva York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo:</b>                  | Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico. |
| <b>Duración:</b>                  | Febrero 2016 - Diciembre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Donantes:</b>                  | Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS                                                                                                        |
| <b>Gobernanza:</b>                | Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Presupuesto Total (USD):</b>   | \$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>En ejecución (USD):</b>        | \$ 85.913.937 (Asignado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gastos administrativos</b>     | \$3.564.976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ventanas de implementación</b> | Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.<br>Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras.<br>*La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF                    |



NACIONES UNIDAS

## Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

**USD 86.233.309**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Contribuciones pendientes

**USD 87.029.345**

Total movilizado



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados  
(2016, 2017, 2018 y 2019)

| Donante                               | Contribuciones |
|---------------------------------------|----------------|
| Alemania                              | USD 7.295.170  |
| Canadá                                | USD 15.229.371 |
| Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU | USD 15.000.000 |
| Women's peace and humanitarian Fund   | USD 2.000.000  |
| Irlanda                               | USD 1.169.412  |
| Reino Unido                           | USD 19.961.745 |
| Noruega                               | USD 9.634.951  |
| Suecia                                | USD 9.492.667  |
| Suiza                                 | USD 3.090.580  |
| SDG Fund                              | USD 1.500.000  |
| Nueva Zelanda                         | USD 140.605    |
| Cooperación Catalana                  | USD 363.245    |
| Portugal                              | USD 72.120     |
| Emiratos Árabes Unidos                | USD 1.000.000  |
| Filantropía                           | USD 283.443    |
| <b>Total: USD 86.233.309</b>          |                |

\*Con intereses el total es de USD 87.029.345





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                    | <b>Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sede:</b>                      | Nueva York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo:</b>                  | La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET. |
| <b>Duración</b>                   | Diciembre 2018- Diciembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Donantes:</b>                  | Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gobernanza:</b>                | Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Presupuesto Total (USD):</b>   | \$ 82.142.789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ventanas de implementación</b> | Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.                                                                                                                                                                                                                                                                                |



NACIONES UNIDAS

## Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 76.461.174

*Desembolsados al Fondo*

USD 5.681.615

*Contribuciones pendientes*



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

## Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

| Donante                       | Contribuciones        | Compromisos firmados |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reino Unido                   | USD 18.805.460        |                      |
| Chile                         | USD 120.000           |                      |
| Alemania                      | USD 18.227.860        |                      |
| Noruega                       | USD 26.869.159        |                      |
| Corea                         | USD 500.000           |                      |
| Suecia                        | USD 4.213.462         | USD 5.681.615        |
| Canadá                        | USD 2.669.033         |                      |
| Fondo Consolidación de la Paz | USD 7.000.000         |                      |
| Suiza                         | USD 1.005.620         |                      |
| Finlandia                     | USD 344.804           |                      |
| Irlanda                       | USD 901.026           |                      |
| <b>Total:</b>                 | <b>USD 80.656.424</b> | <b>USD 5.681.615</b> |

Nota: En Comité Directivo del 18 de diciembre de 2020, Noruega, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia, Chile y el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz confirmaron nuevas contribuciones para seguir apoyando la consolidación de la paz, adicionando así \$ 83 mil millones de pesos (**US\$ 23,9 millones**) al presupuesto del Fondo.



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                       | <b>Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sede:</b>                         | Washington D.C.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objetivo:</b>                     | Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas |
| <b>Duración:</b>                     | 2014-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Donantes:</b>                     | Banco Mundial y Suecia                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gobernanza:</b>                   | APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Presupuesto total (dólares):</b>  | \$ 7.110.186                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Saldo en ejecución (dólares):</b> | \$ 557.661                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial  
para la Paz y el  
Posconflicto

**USD 7.110.186**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 0**

*Contribuciones pendientes*

**USD 7.110.186**

*Presupuesto total*



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

## Fondo Para la Paz y el Posconflicto



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7

Proyectos  
aprobados

| DONANTE       |  | RECURSOS REGISTRADOS |           |
|---------------|--|----------------------|-----------|
| Banco Mundial |  | USD                  | 4.000.000 |
| Suecia        |  | USD                  | 3.110.186 |
| Total         |  | USD                  | 7.110.186 |





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                                  | <b>Fondo Europeo para la Paz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sede:</b>                                    | Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo:</b>                                | Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos |
| <b>Duración</b>                                 | 2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)<br><b>En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)</b> se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (enero/2021).                                                                                              |
| <b>Donantes:</b>                                | Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO                                                                                                            |
| <b>Gobernanza:</b>                              | Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Presupuesto Total (euros):</b>               | €127.3 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Presupuesto en ejecución:</b>                | €121.3 M contratados (29 proyectos en ejecución, 6 proyectos finalizados).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Monto Proyectos en fase administrativa*:</b> | €1.5 M en contratación (1 contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Saldo disponible:</b>                        | no reporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gastos Administrativos:</b>                  | €4.6 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contribuciones pendientes desembolso:</b>    | En Comité Estratégico del Fondo del 22/01/2021 se anunciaron nuevas contribuciones por parte de Irlanda (750.000 EUR) y Suecia (2,5 M EUR)                                                                                                                                                                                                                   |



Fondo Europeo  
para la Paz

**EUR 127.3 M.**

Desembolsados al Fondo

**Pendientes**

Irlanda (750.000 EUR)  
Suecia (2,5 M EUR)



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

## Fondo Europeo para la Paz



29

Proyectos en ejecución

6

Proyectos finalizados

Total €121.3  
millones

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad



| Donante          | Recursos Registrados   | Compromisos |
|------------------|------------------------|-------------|
| Alemania         | EUR 6.000.000          |             |
| Chipre           | EUR 10.000             |             |
| Comisión Europea | EUR 90.000.000         |             |
| Croacia          | EUR 20.000             |             |
| UE-ECHO          | EUR 2.000.000          |             |
| Eslovaquia       | EUR 20.000             |             |
| Eslovenia        | EUR 12.000             |             |
| España           | EUR 4.500.000          |             |
| Francia          | EUR 3.000.000          |             |
| Holanda          | EUR 5.000.000          |             |
| Hungría          | EUR 20.000             |             |
| Irlanda          | EUR 3.000.000          |             |
| Italia           | EUR 5.000.000          |             |
| Letonia          | EUR 10.000             |             |
| Lituania         | EUR 46.000             |             |
| Luxemburgo       | EUR 35.000             |             |
| Malta            | EUR 10.000             |             |
| Portugal         | EUR 200.000            |             |
| Reino Unido      | EUR 1.510.000          |             |
| República Checa  | EUR 40.678             |             |
| Suecia           | EUR 4.770.422          |             |
| Chile            | EUR 89.686             |             |
| Austria          | EUR 10.000             |             |
| Finlandia        | EUR 150.000            |             |
| Bank interests   | EUR 773                |             |
| <b>Total:</b>    | <b>EUR 127.344.561</b> |             |



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz

|                                                                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                                                                               | <b>Fondo Colombia Sostenible</b>                                                                                                              |
| <b>Sede:</b>                                                                                 | Washington D.C.                                                                                                                               |
| <b>Objetivo:</b>                                                                             | Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local |
| <b>Duración:</b>                                                                             | 2017-2032                                                                                                                                     |
| <b>Donantes:</b>                                                                             | Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza                                                                                                |
| <b>Gobernanza:</b>                                                                           | Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.                                                         |
| <b>Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):</b> | \$ 250.000.000                                                                                                                                |
| <b>Monto proyectos aprobados (dólares):</b>                                                  | \$12,894,399                                                                                                                                  |



BID Colombia  
Sostenible

**USD 19.658.355**

*Contribuciones correspondientes al  
POA 2018*

**USD 12.000.000**

*Contribuciones correspondientes al  
POA 2019*

**USD 250.000.000**

*Presupuesto máximo para el pago  
por resultados en los diez años de  
vigencia del acuerdo con donantes*

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible

| DONANTES                                                                   | RECURSOS DESEMBOLSADOS<br>POA 2018 | RECURSOS DESEMBOLSADOS<br>POA 2019** |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><br><br>Declaración Conjunta<br>(Noruega,<br>Alemania<br>Reino Unido)* | USD 15.000.000                     | USD 11.000.000                       |
| <br>Suecia                                                                 | USD 1.658.355                      | USD 1.000.000                        |
| <br>Suiza                                                                  | USD 3.000.000                      | N/A                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                               | USD 19.658.355                     | USD 12.000.000                       |

\* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

\*\* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Fondo Colombia Sostenible POA 2019

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

| Líneas de inversión del POA 2019                                                                                                               | Presupuesto en USD  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Línea 1.</b> Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación                                                   | \$2,710,000         |
| <b>Línea 2.</b> Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación | \$9,095,000         |
| <b>Línea 3.</b> Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques     | \$4,820,000         |
| Actividades de apoyo para la gestión de la UTC                                                                                                 | \$420,000           |
| <b>Total presupuesto POA 2019</b>                                                                                                              | <b>\$17,045,000</b> |
| Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos                                             | \$183,209           |
| <b>Total disponible para POA 2019</b>                                                                                                          | <b>\$17,228,209</b> |

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 167  
14 al 18 de junio de 2021

# ¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



@fcolombiapaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz
