



FONDO COLOMBIA EN PAZ



Fondo Colombia en Paz

Informe semanal 250

Fondo Colombia en Paz

16 al 20 de enero de 2023



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP y CRP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o actividades que ya cuentan con respaldo presupuestal.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

En trámite: Corresponde a los contratos y/o actividades en proceso de perfeccionamiento que no están vinculadas a convocatorias.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación del proceso contractual: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Adjudicación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas



Reincorporación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Primera infancia



Sustitución



BID Préstamo



KFW



ICBF Sacúdete



Jurisdicción Especial de
Paz



Agencia Nacional de Tierras



Colombia Sostenible



Sociedad de Activos
Especiales



BID Facilidad



AFD



Zona ZEII Catatumbo



Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Estabilización



Funcionamiento



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Herencia Colombia



Agencia Nacional de
Tierras 2019



Visión Amazonía



Catastro Multipropósito

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)	Contrapartidas (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 5.726.087	\$ 5.113.732	\$ 182.707	\$ 429.648
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 4.901.806	\$ 4.413.495	\$ 58.663	\$ 429.648
TOTAL EJECUTADO	\$ 3.531.868	\$ 3.474.374	\$ 40.148	\$ 17.345


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de \$3.500 del Convenio 550 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 de Cenit / Capitalización de Rendimientos por \$6.629 / Otros ingresos Funcionamiento por \$202 / Aporte BID Facilidad por \$22.667 / Otros ingresos - Sustitución por \$6.129 / Otros ingresos - Reincorporación por \$23 /Otros ingresos PDET por \$10 / Aporte KFW \$53.447/ Convenios Fondo Paz \$71.918/ Convenio Visión Amazonía \$8.374./ Convenio AFD \$1.772./ Convenio de aportes Sustitución \$700 / Otros ingresos MADS \$37.

(2) A continuación se indica valor total de contrapartidas por cada subcuenta: Reincorporación \$4.542/ Sustitución \$90.707/ PDET \$1.560/ BID Facilidad \$12.635/ BID Préstamo \$304.637/ MADS \$11.894/ ICBF \$1.014/ HECO \$2.658.


Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.602.314	\$ 2.277.166	88%	\$ 325.148	12%
Reincorporación	\$ 944.740	\$ 924.673	98%	\$ 20.067	2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 842.353	\$ 620.762	74%	\$ 221.591	26%
BID Préstamo	\$ 660.277	\$ 610.620	92%	\$ 49.657	8%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 128.149	\$ 126.538	99%	\$ 1.611	1%
Funcionamiento	\$ 96.946	\$ 87.495	90%	\$ 9.451	10%
ICBF Sacúdete	\$ 91.014	\$ 32.257	35%	\$ 58.757	65%
Primera Infancia	\$ 67.877	\$ 27.801	41%	\$ 40.076	59%
KFW	\$ 53.447	\$ 6.563	12%	\$ 46.883	88%
Catastro Multipropósito	\$ 52.647	\$ 16.493	31%	\$ 36.154	69%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.906	99,6%	\$ 159	0,4%
Estabilización	\$ 40.088	\$ 38.188	95%	\$ 1.900	5%
BID Facilidad	\$ 35.333	\$ 31.182	88%	\$ 4.150	12%
Herencia Colombia	\$ 25.902	\$ 21.566	83%	\$ 4.336	17%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.710	\$ 18.859	87%	\$ 2.851	13%
Visión Amazonía	\$ 8.374	\$ 7.454	89%	\$ 920	11%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.804	98%	\$ 43	2%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.772	\$ 1.323	75%	\$ 449	25%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 1.354	\$ 1.275	94%	\$ 78	6%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 320	\$ 320	100%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 5.726.087	\$ 4.901.806	86%	\$ 824.280	14%

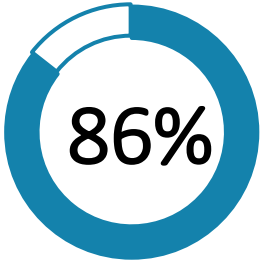


Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapartidas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.277.166	\$ 1.713.356	75%	\$ 483.909	21%	\$ 79.900	3,5%
Reincorporación	\$ 924.673	\$ 839.602	91%	\$ 82.830	9%	\$ 2.242	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 620.762	\$ 452.425	73%	\$ 166.777	27%	\$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	\$ 610.620	\$ 202.113	33%	\$ 108.091	18%	\$ 300.417	49%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 126.538	\$ 70.919	56%	\$ 43.725	35%	\$ 11.894	9%
Funcionamiento	\$ 87.495	\$ 77.023	88%	\$ 10.472	12%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.906	\$ 43.906	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Estabilización	\$ 38.188	\$ 34.076	89%	\$ 4.112	11%	\$ 0	0%
ICBF Sacúdete	\$ 32.257	\$ 18.232	57%	\$ 13.029	40%	\$ 996	3%
BID Facilidad	\$ 31.182	\$ 14.930	48%	\$ 3.617	12%	\$ 12.635	41%
Primera Infancia	\$ 27.801	\$ 27.670	100%	\$ 131	0%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 21.566	\$ 8.652	40%	\$ 10.256	48%	\$ 2.658	12%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 18.859	\$ 13.380	71%	\$ 5.479	29%	\$ 0	0%
Catastro Multipropósito	\$ 16.493	\$ 1.395	8,5%	\$ 15.098	91,5%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 7.454	\$ 5.845	78%	\$ 1.609	22%	\$ 0	0%
KFW	\$ 6.563	\$ 709	11%	\$ 5.854	89%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.804	\$ 2.804	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.323	\$ 206	16%	\$ 1.117	84%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 1.275	\$ 0	0%	\$ 1.275	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 320	\$ 66	21%	\$ 254	79%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 4.901.806	\$ 3.531.868	72%	\$ 957.635	20%	\$ 412.303	8%

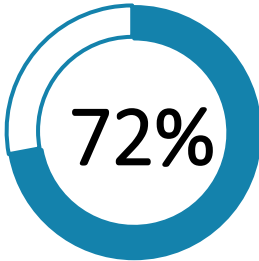


Línea del Tiempo

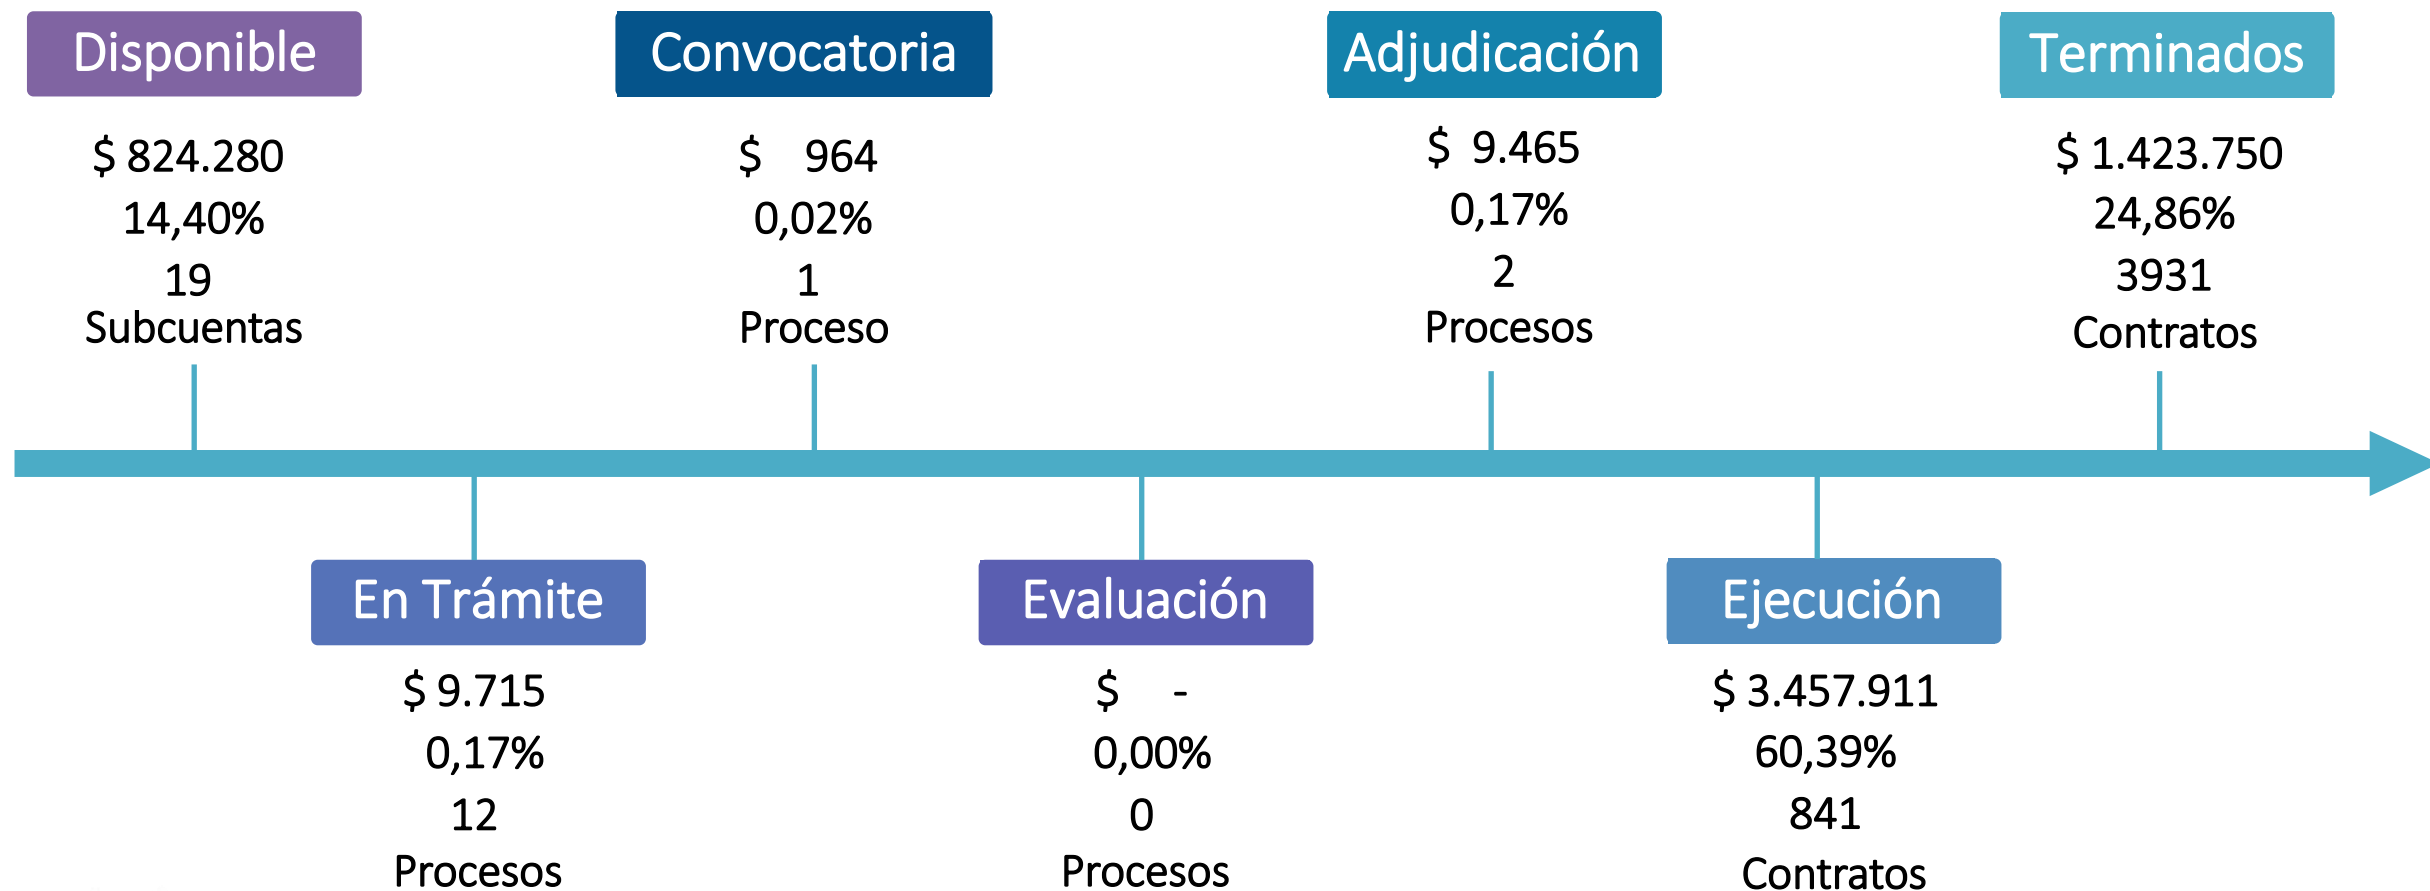

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*Línea basada en recursos comprometidos con CDP



Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)




Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Sustitución




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Sustitución	\$ 325.148

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Mejoramiento de las líneas productivas de café, fresa, granadilla, ganadería	\$ 4.563
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.355
Tiquetes aéreos	\$ 900

Sustitución




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$853.048	-	Nov17 - Abr23	100%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	UNODC	1092-21	\$ 157.898	\$21.379	Ene22 - Ene24	44%
	Fupad Colombia	1041-21	\$ 136.554	\$40.860	Dic21 - Dic23	46%
	OEI	1091-21	\$ 79.389	\$15.912	Ene22 - Ene24	33%
	Departamento Vichada, municipio de Cumaribo	671-21	\$ 815	-	Oct21 - Oct23	0%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	\$ 25.855	-	Jun21 - Feb23	50%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	\$ 21.849	-	Jul21 - Mar23	70%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	\$ 15.066	-	Jul21 - Mar23	50%
Servicios Persona Natural	187 CPS	N/A	\$ 6.097	-	Feb21 - May23	59%

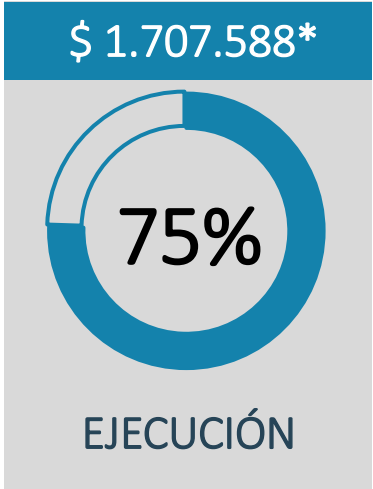

Sustitución




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Consorcio construyendo proyectos sostenibles	364-22	\$ 24.573	-	Jul22 - Oct23	10%
	Consorcio Meta incluyente	405-22	\$ 23.283	-	Pendiente acta	0%
	Unión temporal selva social	373-22	\$ 31.145	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio desarrollo rural zona 3	375-22	\$ 30.693	-	Jun22 - Sep23	50%
	Consorcio productivo Caquetá 4	377-22	\$ 28.919	-	Jun22 - Sep23	50%
	Consorcio grupo Max de Orinoquia	366-22	\$ 27.681	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio construyendo proyectos PNIS	365-22	\$ 31.629	-	Jul22 - Oct23	10%
	UT para la Paz 2022	359-22	\$ 24.411	-	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio familias productivas por la paz 2022	402-22	\$ 20.520	-	Sep22 - Dic23	10%
	Corporación para impulsar el desarrollo ambiental “CIDMAG”	404-22	\$ 17.539	-	Ago22 - Nov23	10%
	UT Caquetá avanza	403-22	\$ 13.456	-	Ago22 - Nov23	10%
	Situando SAS	927-21	\$ 6.957	-	Dic21 - Jun23	66%
	Publica S.A.S.	984-21	\$ 2.500	-	Nov21 - Mar23	52%

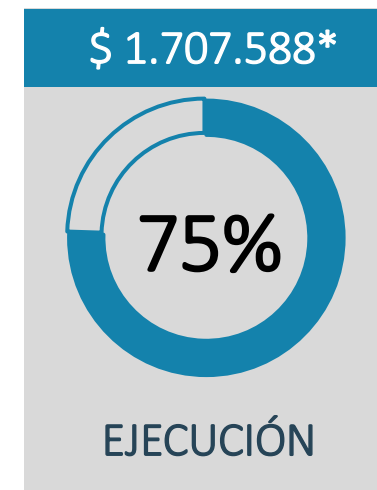

Sustitución



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	DCO Ingeniería & Servicios SAS	371-22	\$ 9.655	-	May22 - Sep23	46%
	DCO Ingeniería & Servicios SAS	372-22	\$ 8.898	-	Jun22 - Oct23	32%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 8.696	-	Sep21 - Mar23	50%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 5.241	-	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 5.082	-	Jul21 - Ene23	10%
Arrendamientos	Situando SAS	928-21	\$ 3.046	-	Oct21 - Abr23	61%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 2.617	-	N/A	92%
Transporte Público Terrestre	UT Dapre OS 2022	354-22	\$ 2.575	-	Abr22 - Abr23	60%
Implementación de modelos productivos asociativos sostenibles	Gran Tierra Colombia INC Sucursal	1124-21	\$ 2.000	\$ 1.750	Dic21 - Dic25	0%

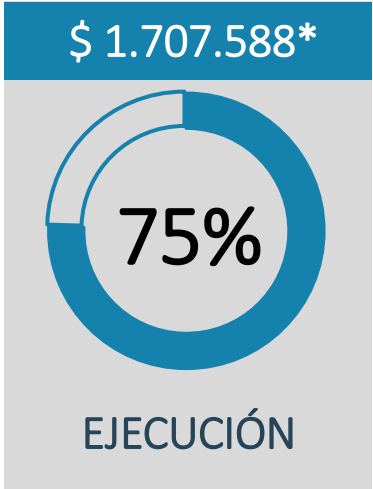

Sustitución



Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF002	\$309.350	\$ 10.807	Dic-20	Liquidado
-OEI-	262-20	\$ 89.169	-	Nov-21	En proceso de liquidación
UNODC	AF001	\$ 67.177	-	Dic-19	Liquidado
519 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 25.036	-	Dic-17	Liquidado
Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	May-21	En proceso de liquidación
225 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 21.181	-	Ago-19	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 9.226	-	Nov-20	Liquidado
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 4.850	-	Sep-19	Liquidado
COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	Jun-22	En proceso de liquidación
Situando SAS	254-19	\$ 3.001	-	Oct-21	Liquidado
AS Transportes	28-21	\$ 2.383	-	Abr22	Liquidado
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 992	-	Ene-21	Liquidado
Festival Tours S.A.S	470-19	\$ 881	-	Dic-22	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 871	-	Oct-19	Liquidado





Sustitución



Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Situando SAS	411-20	\$ 706	-	Oct-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 682	-	Dic-18	Liquidado
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 19	-	Nov-20	Liquidado
UNODC - Departamento de Nariño - Municipio de Buesaco	227-22	-	-	May-22	Liquidado
UNODC - Municipio de Campamento	225-22	-	-	May-22	Liquidado
Municipio de la Cruz	154-22	-	-	Jun-22	Liquidado
Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego	180-22	-	-	May-22	Liquidado
Municipio el Tablón de Gomez	153-22	-	-	May-22	Liquidado
UNODC-Municipio de Valdivia	226-22	-	-	May-22	Liquidado





Fondo Colombia en Paz

Disponible
\$ 221.591

En Trámite
\$ 149

Convocatoria
\$ 964

Evaluación
\$ -

Adjudicación
\$ 9.465

Ejecución
\$ 240.733

Terminado
\$ 369.450

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y los Programas de Obras de Infraestructura.



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible PDET	\$ 221.591

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 149

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Adquisición de licenciamiento para la plataforma AZURE	<u>ART</u>	\$ 964	26 de enero de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET




Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico	ART	UT FORTALECIMIENTO TERRITORIAL	\$ 8.965	23 de enero de 2023
Tiquetes Aéreos	ART	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO S.A.S.	\$ 500	24 de enero de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - Feb23	55%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Feb23	26%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - Feb23	89%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - Abr23	31%
	Unión Temporal Futuro Pazcifico	110-20	\$11.137	-	Jul20 - Mar23	49%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Ene23	59%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Feb23	67%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Feb23	78%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - Feb23	52%

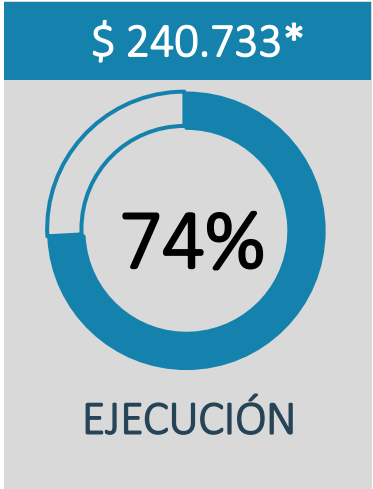

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	159 CPS	N/A	\$8.748	-	Jun21 - Dic23	66%
Ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo social y económico	OR Construcciones e ingeniería SAS	433-22	\$22.604	-	Sep22 - Sep23	0%
Proyectos de Generación de Ingresos	UT E&C - Colombia en Paz	1068-21	\$14.437	-	Dic21 - Feb23	70%
	UT por la Paz 2022	360-22	\$10.892	-	Jun22 - Ago23	30%
	Corporación Colombia Internacional CCI	1042-21	\$10.293	-	Dic21 - Feb23	70%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	358-22	\$13.496	-	Abr22 - Abr23	28%
	Proyectamos Colombia SAS	436-22	\$ 3.053	-	Ago22 - Abr23	10%
Interventoría	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - May23	44%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - Jun23	58%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Ene23	58%
	Velnec S.A.	437-22	\$ 4.064	-	Sep22 - Oct23	0%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA LTDA	393-22	\$ 85	-	Jun22 - Ene23	0%

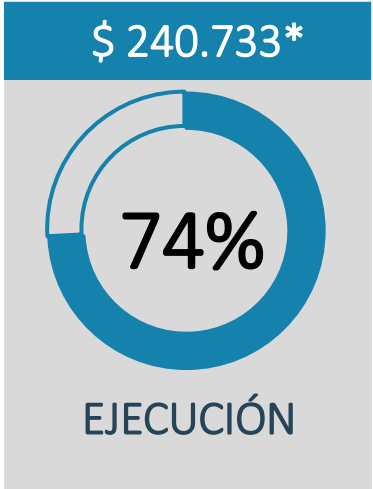

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 6.038	-	N/A	85%
Servicio de transporte público terrestre	Transportes Especiales A & S S.A.S.	73-23	\$ 3.377	-	Pendiente acta	0%
	U.T. TCSC - Sabana FCP	1073-21	\$ 3.000	-	Ene22 - Ene23	91%
Adquisición y entrega de dotación	Inversiones BlucherS.A.S	463-22	\$ 2.693	-	Sep22 - Ene23	100%
		464-22	\$ 1.698	-	Sep22 - Ene23	100%
Ejecutar proyecto de infraestructura productiva	Consorcio Eres 2022	417-22	\$ 678	-	Ago22 - Mar23	0%
Adquisición licenciamiento plataforma ARCGIS	ESRI Colombia S.A.S.	563-22	\$ 640	-	Nov22 - Nov23	0%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	\$ 525	-	May21 - Ene23	79%
Tiquetes Aéreos	Novatours Ltda.	315-22	\$ 450	-	Mar22 - Ene23	91%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	\$ 12	-	Nov21 - N/A	100%

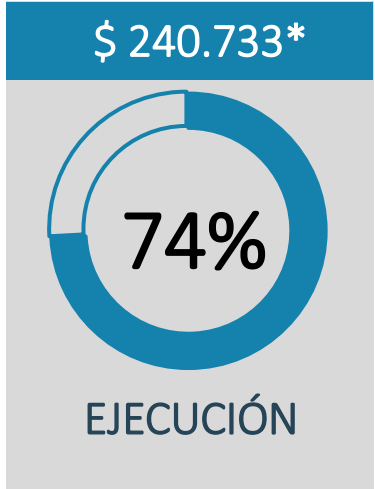

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 369.450

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	Feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	867 CPS	\$51.826	-	Dic-17	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	1064 CPS	\$35.785	-	Dic-17	Liquidado
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	Jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	Feb-20	En proceso de liquidación
Fundación SOCYA	112-20	\$18.641	-	Nov-22	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	Feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	Feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguán 2018	538-18	\$13.890	-	Ene-20	En proceso de liquidación
Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	Abr-22	En proceso de liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	\$ 8.860	-	Oct-22	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	Dic-20	En proceso de liquidación
Douglas Trade S.A.S.	721-21	\$8.705	-	Abr-22	Liquidado
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	Dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$7.627	-	Dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$6.651	-	Ago-21	Liquidado
Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	-	May-22	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	Dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	Feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	Feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	Sep-21	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 369.450

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	Nov-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$3.154	-	Abr-21	Liquidado
Norte Ingenieros Ltda.	167-21	\$ 2.981		Sep-22	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	Dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio ART JRUNOA	200-21	\$ 2.004	-	Ene-22	Liquidado
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	Nov-21	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	-	Ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	Ago-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.169	-	Jun-22	Liquidado
Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	Mar-22	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	Abr-21	Liquidado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	Ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	Nov-19	Liquidado
COCOMACIA	821-20	\$ 885	-	Feb-22	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$ 798	-	Sep-22	En proceso de liquidación
Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	-	Dic-21	Liquidado
ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Nov-22	Liquidado


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	Oct-20	Liquidado
Consorcio Intervial Antioquia	157-21	\$ 422	-	Oct-22	En proceso de liquidación
Proyectamos Colombia SAS	654-21	\$ 341	-	Feb-22	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	Feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	Nov-19	Liquidado



Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Reincorporación




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Reincorporación	\$ 20.067

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 205
Adecuación espacio físico de Bodegas de MercaNeiva	\$ 15

Reincorporación



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 627.591	-	Sep17 - Abr23	95%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 94.483	-	Jun18 - Abr23	88%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 35.536	-	Sep17 - Abr23	95%
Suministros víveres secos	Integralservicios SAS	493-22	\$ 25.535	-	Oct22 - May23	0%
Interventoría	CISP	520-22	\$ 3.265	\$ 1.467	Oct22 - Oct24	0%
Fortalecimiento y Comercialización de Proyectos Productivos	Fiducoldex, vocera del fideicomiso Innpulsa Colombia	438-22	\$ 2.000	\$ 200	Jul22 - Ene24	45%
Apoyo fortalecimiento institucional	CODES	548-22	\$ 1.316	-	Nov22 - Sep23	0%
Prestación de Servicios	12 CPS	N/A	\$ 1.054	-	Nov22 - Nov23	3%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 377	-	N/A	99%
Adecuación espacio físico acopio, preservación y conservación de productos agropecuarios	Monval Ingeniería S.A.S.	490-22	\$ 205	-	Sep22 - Feb23	0%
Transporte Terrestre	Transportes especiales F.S.G. SAS.	430-22	\$ 100	-	Ago22 - Feb23	0%
Licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS.	435-22	\$ 47	-	Jul22 - Jul23	0%

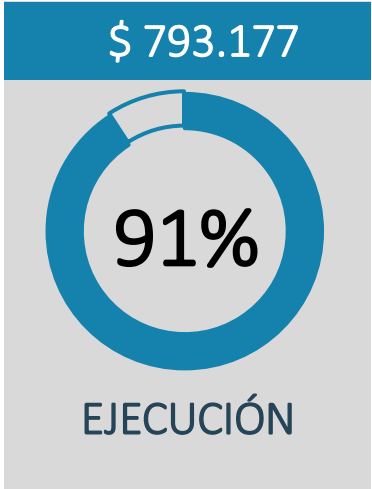



Reincorporación

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 131.277

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	-	Abr-21	Liquidado
UT FCP 2021	217-21	\$ 25.546	-	Mar-22	En proceso de liquidación
Integralservicios SAS	261-22	\$ 20.447	-	Oct-22	En proceso de liquidación
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	Mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	Nov-19	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	May-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	Mar-18	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	239-21	\$ 2.528	\$ 375	Dic-22	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	Mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios 22 CPS	N/A	\$ 2.383	-	Dic-20	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	Jul-22	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 1.977	\$ 200	Ago-20	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	245-20	\$ 1.500	\$ 600	Dic-21	Liquidado
CODES	907-21	\$ 1.213	-	Ago-22	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	Jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 20 CPS	N/A	\$ 971	-	Feb-20	Liquidado
Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	\$ 514	-	Oct-22	En proceso de liquidación
Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	Jul-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Reincorporación

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 131.277

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	Abr-20	Liquidado
Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 223	-	Dic-22	En proceso de liquidación
Subatours SAS	381-22	\$ 100	-	Dic-22	En proceso de liquidación
Subatours SAS	286-21	\$ 84	-	Jun-22	Liquidado
Transporte Terrestre	209-21	\$ 71		Abr-22	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	\$ 60	-	May-21	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S	608-22	\$ 45	-	Jul-22	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	Jul-21	Liquidado
BIM Latinoamérica SAS	629-21	\$ 12	-	Ago-22	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ -	-	Nov-19	Liquidado



Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En proceso de cierre



Temporalidad: 2019



Jurisdicción Especial para la Paz



Nombre corto	Valor
Disponible JEP	\$ 159

Jurisdicción Especial para la Paz

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución


Terminados
\$ 43.906

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	Jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	239 CPS	\$ 10.733	Nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ene-21	Liquidado
Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jun-22	Liquidado
Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	Ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	Dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	Jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$ 584	Mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	Nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	Abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	Oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	Mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	Jun-18	Liquidado
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	Sep-18	Liquidado
Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$77	May-22	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	Dic-18	Liquidado
Gastos de Desplazamiento	N/A	\$57	Jul-22	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	Dic-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 250
16 al 20 de enero de 2023



Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería para la Reconciliación Nacional.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Primera Infancia




Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	\$ 40.076

Primera Infancia



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 53	-	N/A	89%

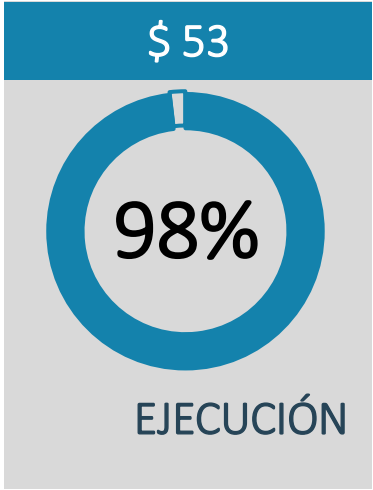

Primera Infancia

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación


Ejecución

Terminados
\$ 27.748

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$3.877	Nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	\$3.198	Jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$3.052	Nov-20	Liquidado
Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	\$2.574	Jul-22	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	Ago-20	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	68 CPS	\$2.999	Feb-19	Liquidado
Consortia PDET 2021	1123-21	\$1.895	Oct-22	En proceso de liquidación
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.391	Nov-20	Liquidado
Asesoría y Gestión CÍA SAS	306-22	\$1.342	Sep-22	En proceso de liquidación
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.387	Ago-20	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.076	Ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	9 CPS	\$ 693	May-21	En proceso de liquidación
Consortio S&T 2021	923-21	\$ 528	Oct-22	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	57-19	\$ 160	Sep-22	En proceso de liquidación
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	\$ -	Nov-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Agencia Nacional de Tierras



Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	\$ 43



Agencia Nacional de Tierras




Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	89 CPS	\$ 2.799	Jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	Abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	Mar-18	Liquidado





Fondo Colombia en Paz



Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos





Funcionamiento



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Funcionamiento	\$ 9.451


En Trámite	
Nombre corto	Valor
Póliza	\$ 0,06



Funcionamiento




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 18.049	Oct19 - Abr23	84%
Nómina	Su Temporal S.A.S	166-21	\$ 9.838	May21 - May23	97%
Nómina	PEC y CIA. S.A.S.	383-22	\$ 8.773	Jun22 - Abr23	56%
Servicios TIC	IMPRETIC'S E.I.C.E	416-22	\$ 2.508	Ago22 - Ago23	23%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 1.192	Nov18 - Abr23	99%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 937	Dic20 - Mar23	71%
Auditoría	Ernst & Young S.A.S.	380-22	\$ 707	Jun22 - Abr23	60%
Custodia de Documentos	PGD procesos de gestión documental SAS	439-22	\$ 518	Ago22 - Ago23	64%
Tiquetes aéreos	Novatours LTDA	356-22	\$ 300	May22 - May23	20%
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty Seguros S.A.	Póliza	\$ 232	Jul22 - Jul23	100%
Arrendamientos	Inversiones contadora SAS Y Deissy Alexandra Betancur Yepes	521-22	\$ 184	Oct22 - Oct24	17%
Aseo y Cafetería	Grupo empresarial SEISO S.A.S.	465-22	\$ 115	Sep22 - Sep23	18%

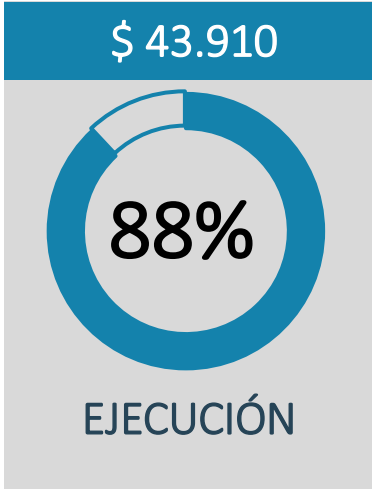

Funcionamiento



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Transporte Terrestre	Transportes Especiales Nueva Era SAS	379-22	\$ 100	Jun22 - Jun23	36%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	89%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic23	17%
Adquisición equipo de computo	Comunitic S.A.S.	591-22	\$ 10	Nov22 - Dic22	100%
Adecuación mobiliario e instalación de redes	Arquiredes Construcciones S.A.S.	694-22	\$ 8	Dic22 - Ene23	0%
Póliza	Zurich Colombia seguros S.A.	Póliza	\$ 7	Jul22 - Jul23	100%
Conceptualización y estructuración grafica pagina web	José Leandro Londoño Henao	624-22	\$ 7	Nov22 - Feb23	0%

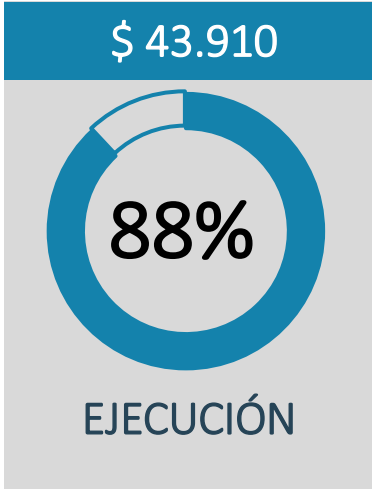



Funcionamiento

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 43.585

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	Sep-19	Liquidado
Nomina	N/A	\$ 6.510	Jul-22	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 5.701	Abr-21	Liquidado
IMPRETIC'S E.I.C.E	304-21	\$ 2.376	Jul-22	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	May-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	Mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	May-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.249	May-21	Liquidado
Ernst & Young	55-19	\$ 964	Dic-20	Liquidado
Ernst & Young	867-20	\$ 947	Abr22	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	Dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 560	Dic-20	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$471	Sep-22	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	Feb-1	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	Nov-18	Liquidado
Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 222	Ago-22	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	Ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 43.585

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul-22	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	May-18	Liquidado
Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 119	Sep-22	Liquidado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 133	Mar-21	Liquidado
Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	Dic-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	Dic-17	Liquidado
Imagroup Colombia SAS	882-21	\$ 100	Oct-22	En proceso de liquidación
Syneris	541-18	\$ 96	Abr-18	Liquidado
Nexura Internacional SAS	554-21	\$ 83	Feb-22	En proceso de liquidación
Transportes Especiales A&S SAS	549-21	\$ 82	May-22	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	May-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	Nov-17	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	Jun-18	En proceso de liquidación
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	May-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	Dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	Abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	Jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	Nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	\$ 31	Sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	\$ 30	Jul-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	Jun-20	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 43.585

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	Dic-17	Liquidado
Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 19	Sep-22	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	522-22	\$ 19	Nov-22	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	May-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	Oct-20	Liquidado
Godoy & Hoyos Abogados S.A.S.	571-22	\$10	Dic-22	En proceso de liquidación
Zurich Colombia Seguros SA	N/A	\$ 8	Jul-22	Liquidado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	Nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	\$ 7	Jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	Oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	Jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	Dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	Jun-19	Liquidado
Arquiredes construcciones S.A.S.	462-22	\$ 6	Ago-22	En proceso de liquidación
English Link Global S.A.S.	60-19	\$ 5	Jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	Dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	Nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	Mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	\$ 5	Ago-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.




Funcionamiento



Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
C J Motors LTDA	525-22	\$ 5	Nov-22	En proceso de liquidación
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	Dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	\$ 1	Mar-20	Liquidado





Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Oficina del Alto Comisionado de Paz – Unidad de Implementación



Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Implementación de la OACP.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Estabilización



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Estabilización	\$ 1.900

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 48

Estabilización



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	38 CPS	N/A	\$4.362	Mar21 - Ene24	60%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.416	N/A	66%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	1002-21	\$1.300	Dic21 - Jun23	100%
Operador Logístico	Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S.	427-22	\$1.050	Sep22 - Sep23	38%
Tiquetes aéreos	Publica S.A.S.	572-22	\$ 315	Nov22 - Nov23	3%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 18	N/A	100%





Estabilización

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación


Ejecución

Terminados
\$ 29.679

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	100 CPS	\$ 9.057	Dic-17	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	60 CPS	\$ 5.813	Oct-19	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	\$ 2.991	Jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	Jul-18	Liquidado
Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$ 2.548	Ago-22	Liquidado
Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$ 2.550	Ene-22	En proceso de liquidación
Infotoc S.A.	238-21	\$ 1.254	Ago-22	Liquidado
Sociedad hotelera Tequendama SA	428-22	\$ 1.170	Oct-22	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 495	Jul-19	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$ 365	Sep-22	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	Jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	Sep-21	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	1029-21	\$ 91	Jun-22	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	Dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun-22	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$ 16	Dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	\$ 3	Jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$ 0,01	Nov-17	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Cerrada



Temporalidad: 10 años






Sociedad de Activos Especiales



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Ago-19	Liquidado





Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Cerrada



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Colombia Sostenible-Nación 2018

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$ 505	Oct-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$ 503	Dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$ 503	Oct-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$ 497	Oct-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	Oct-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	Feb-17	Liquidado



BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2025



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo

BID Préstamo




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible BID Préstamo	\$ 49.657

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Auditoría	\$ 500
Contratos de prestación de servicios	\$ 119

BID Préstamo



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Santa Isabel	122-22	\$ 6.693	\$ 4.032	Mar22 - Mar23	44%
	DEBISAMCO	108-22	\$ 6.147	\$ 4.778	Abril22 - Oct23	20%
	Fundación ambientalistas y reforestadores de Colombia	369-22	\$ 5.708	\$ 2.446	Jun22 - Jun24	25%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Jun23	30%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Feb23	21%
	Corporacion Lexcom Colombia	104-22	\$ 5.361	\$ 6.091	Jun22 - Jun24	16%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	69%
	Conservation International	740-20	\$ 4.826	\$ 8.345	Nov20 - Mar23	37%
	ASOPATÍA	304-22	\$ 4.582	\$ 1.964	May22 - May24	24%
	FEDEGAN	290-22	\$ 4.058	\$ 2.776	Abr22 - Abr23	21%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Mar23	51%
	Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021	361-22	\$ 4.394	\$ 2.033	Jun22 - Jun24	24%
	Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021	341-22	\$ 3.709	\$ 2.009	Jun22 - Jun24	23%

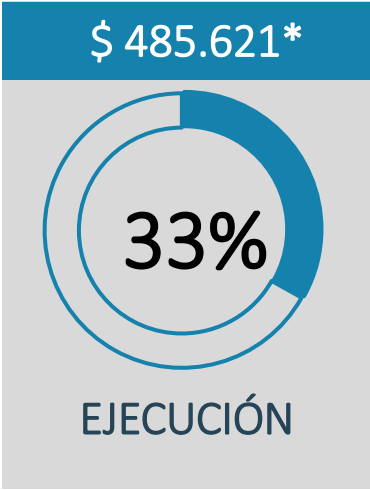


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a la adición a 6 CPS y al contrato 904/21

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	56%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Feb23	46%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	106-22	\$ 3.285	\$ 6.673	Mar22 - Mar23	23%
	Masbosques	260-22	\$ 3.236	\$ 2.034	May22 - May24	22%
	Corporación PBA	283-22	\$ 3.204	\$ 1.381	Abr22 - Abr24	24%
	Universidad de Ibague	291-22	\$ 2.823	\$ 1.251	Jul22 - Jul24	24%
	ONF Andina	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	42%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Jun23	52%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	47%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Feb23	61%

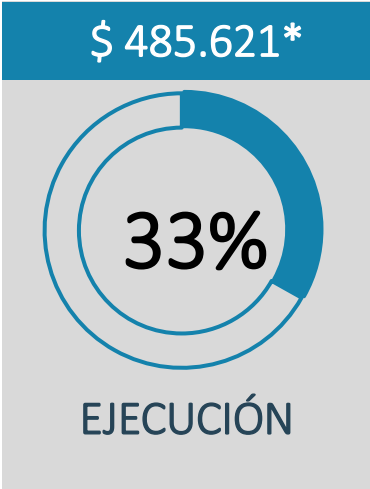

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASPROPISAT	342-22	\$ 2.457	\$ 3.571	May22 - Nov23	14%
	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	\$ 2.293	\$ 2.221	May21 - Feb23	36%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	107-22	\$ 2.214	\$ 4.674	Mar22 - Mar23	22%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	44-22	\$ 2.151	\$ 2.234	Jun22 - Jun23	17%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.091	\$ 1.338	Nov20 - Feb23	43%
	FUDESCO	508-22	\$ 1.980	\$ 2.096	Nov22 - Nov23	17%
	Unión Temporal Cindap - Cordep	301-22	\$ 1.979	\$ 3.346	May22 - Sep23	13%
	CRC	905-21	\$ 1.966	\$ 1.091	Nov21 - Feb23	23%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	17%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	60%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - May23	32%
	Resguardo indígena YUPKA IROKA	370-22	\$ 1.815	\$ 779	Jun22 - Jun24	24%
	Codesarrollo	276-22	\$ 1.800	\$ 1.385	Mar22 - Sep24	20%
	CCI	259-22	\$ 1.656	\$ 1.314	Mar22 - Sep23	39%
	COGAINCHAIRÁ	271-22	\$ 1.602	\$11.066	Mar22 - Mar23	9%
	Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta del río Palo	297-22	\$ 1.598	\$ 685	Mar22 - Jul23	25%

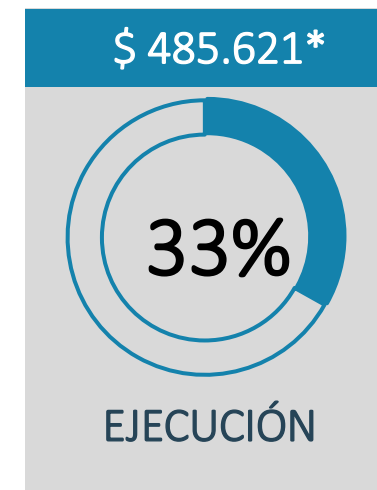

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación para el desarrollo integral de las comunidades – SINERGIA	374-22	\$ 1.455	\$ 624	Jun22 - Jun24	25%
	Unión temporal agrofuturo del norte	343-22	\$ 1.440	\$ 2.184	May22 - May24	14%
	ASOPRODEMA	295-22	\$ 1.341	\$ 1.647	May22 - Nov23	16%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Ene23	34%
	UNAD	281-22	\$ 1.260	\$ 1.251	May22 - Nov23	18%
	CETEC	434-22	\$ 1.260	\$ 846	Sep22 - Mar24	21%
	Fundación Horizonte	269-22	\$ 1.206	\$ 1.733	May22 - May23	15%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	\$ 1.207	\$ 990	Jun21 - Feb23	55%
	Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI	98-22	\$ 1.204	\$ 516	Jun22 - Dic23	24%
	Savia Ambiental S.A.S	302-22	\$ 1.197	\$ 501	May22 - May24	25%
	CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - May23	54%
	Universidad surcolombiana	125-22	\$ 1.170	\$1.799	Sep22 - Mar24	14%
	Consorcio Prosercot Asociados	378-22	\$ 1.170	\$ 907	Jun22 - Sep23	20%
	Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB	314-22	\$ 1.169	\$ 878	Abr22 - Oct23	20%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la Plata Bahía Málaga	382-22	\$ 1.167	\$ 500	Sep22 - Sep24	24%
	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Abr23	68%

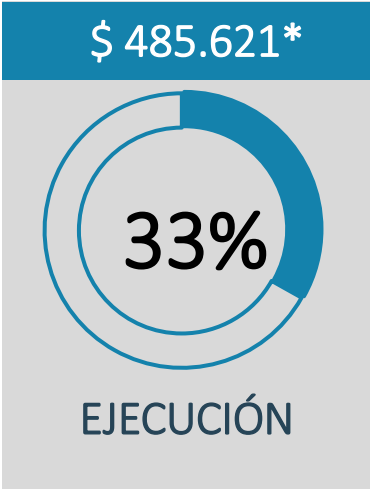

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Abr23	57%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Mar23	59%
	Comité de Ganaderos del Tolima	36-22	\$ 1.107	\$ 739	Mar22 - Mar23	42%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.101	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	15%
	GESTANDO	277-22	\$ 1.089	\$ 987	Abr22 - Oct23	18%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Ene21 - Ene23	0%
	Fundación EQUAL Colombia	123-22	\$ 1.064	\$ 1.307	Mar22 - Mar23	0%
	Fundación Orinoquia Biodiversidad	128-22	\$ 1.051	\$ 450	Abr22 - Abr24	24%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	\$ 1.021	\$ 5.012	Abr22 - Abr24	8%
	Proyecto NASA	345-22	\$ 1.008	\$ 3.864	Oct22 - Abr24	7%
	ASOPROTECCO	262-22	\$ 981	\$ 806	May22 - May23	39%
	UNIMINUTO	43-22	\$ 981	\$ 670	Mar22 - Mar23	21%
	PRAGRO SAS	41-22	\$ 977	\$ 708	Mar22 - Mar23	41%
	RAPE Región Central	443-22	\$ 956	\$ 1.814	Pendiente acta	0%
	Fundación asesorías e investigaciones profesionales	58-22	\$ 954	\$ 852	Mar22 - Sep23	37%

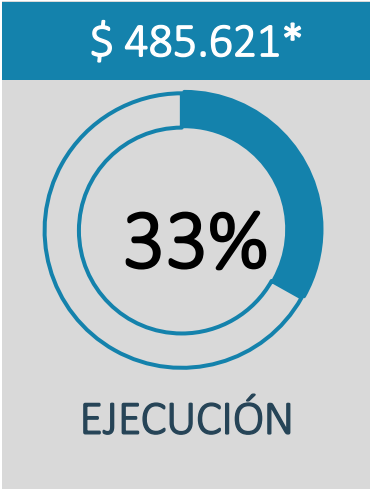

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Consorcio PBA	274-22	\$ 936	\$1.028	May22 - Nov23	17%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%
	Corporación autónoma regional del Cauca	564-22	\$ 920	\$ 394	Pendiente acta	0%
	CAFISUR	258-22	\$ 927	\$ 3.479	May22 - Nov23	8%
	Fundación Horizonte	57-22	\$ 918	\$ 1.418	May22 - May23	14%
	COSURCA	101-22	\$ 917	\$ 782	Abr22 - Oct23	19%
	Corporacion PBA	115-22	\$ 917	\$ 623	Abr22 - Abr24	21%
	CORPOYARUMOS	114-22	\$ 909	\$ 834	May22 - Nov23	18%
	FUNDAHERENCIA	275-22	\$ 907	\$ 617	May22 - Nov23	22%
	Grupo asociativo de cafeteros Villalibano	109-22	\$ 900	\$ 1.350	Abr22 - Abr23	14%
	CAFISUR	272-22	\$ 900	\$ 1.646	May22 - Nov23	13%
	Consorcio "RAÍCES"	362-22	\$ 900	\$ 614	Jun22 - Jun24	21%
	CODES	300-22	\$ 900	\$ 2.147	May22 - Nov23	10%
	COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Feb23	43%
	Innovakit SAS BIC	48-22	\$ 900	\$ 932	Mar22 - May23	17%
	GENYTEC	112-22	\$ 900	\$ 666	Abr22 - Abr23	20%

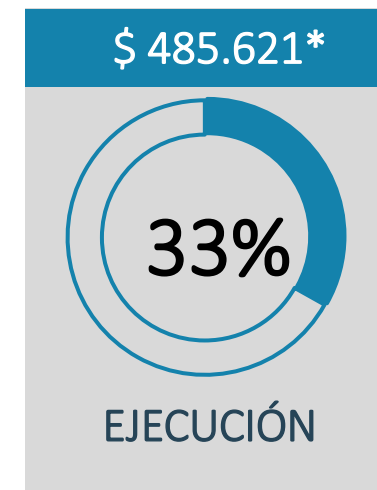

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Proyecto NASA	313-22	\$ 888	\$ 711	May22 - Nov23	19%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Feb23	16%
	Futuro y desarrollo comunitario	120-22	\$ 873	\$ 2.690	Jun22 - Jun24	9%
	Fundación Pancitas Felices	292-22	\$ 873	\$ 855	May22 - Nov23	18%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	\$ 864	\$ 1.184	Mar22 - Mar23	0%
	COMICACAO	344-22	\$ 864	\$ 2.312	May22 - May24	10%
	FUDESCO	510-22	\$ 851	\$ 1.161	Oct22 - Oct23	15%
	COSURCA	46-22	\$ 861	\$ 1.115	Abr22 - Abr23	15%
	CINDAP	45-22	\$ 833	\$ 639	Jun22 - May23	20%
	Corporación Colombia Internacional CCI	257-22	\$ 819	\$ 869	Mar22 - Mar23	35%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Abr23	46%
	Corporación Colombia Agropecuaria	273-22	\$ 801	\$ 2.435	Jun22 - Jun24	9%

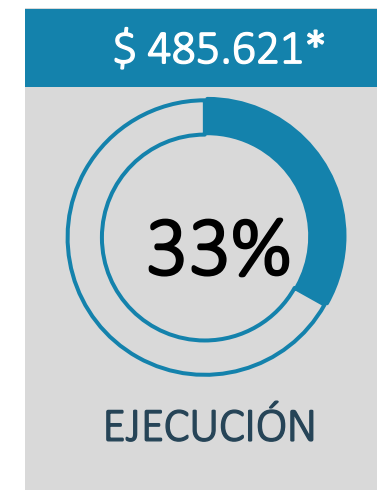

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación reserva natural la Palmita Centro de Investigación	308-22	\$ 794	\$ 340	Oct22 - Oct24	24%
	FTV	40-22	\$ 783	\$ 652	Mar22 - Mar23	38%
	Prodesarrollo Limitada	299-22	\$ 783	\$1.029	May22 - May23	15%
	ASOCALM	324-22	\$ 773	\$ 659	May22 - May23	19%
	Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo	105-22	\$ 766	\$ 559	Mar23 - Mar24	40%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$2.398	Nov20 - Mar23	24%
	Innovakit SAS BIC	51-22	\$ 755	\$ 693	Mar22 - Mar23	36%
	ASOM	124-22	\$ 720	\$ 950	Mar22 - Sep23	15%
	Corpoamazonía	245-22	\$ 720	\$ 1.081	Jun22 - Jun23	15%
	FUNDECERP	131-22	\$ 719	\$ 648	May22 - May23	18%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$1.832	Dic20 - Jun23	20%
	Fundación Ayudar	502-22	\$ 702	\$ 749	Pendiente acta	17%
	FUNINSUR	113-22	\$ 693	\$ 595	Mar22 - Sep23	19%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	37-22	\$ 684	\$1.375	Mar22 - Mar23	23%

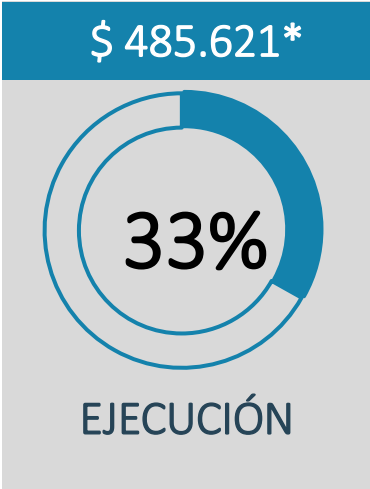

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	CADI	103-22	\$ 675	\$ 626	Mar22 - Jun23	18%
	CORPOJAGUAR	56-22	\$ 675	\$ 460	Abr22 - Abr23	21%
	Corporación Colombia Internacional CCI	255-22	\$ 666	\$ 474	Mar22 - Jun23	41%
	Corporación Ambiental SIE	298-22	\$ 666	\$ 473	May22 - May23	20%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Mar23	58%
	Fundación Planeta Rural	59-22	\$ 662	\$ 487	Mar22 - Sep23	20%
	Corporación para la sostenibilidad de la subcuenca del rio palo	346-22	\$ 662	\$ 288	May22 - May23	49%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Feb23	42%
	Asesorías y Servicios de Ingeniería	54-22	\$ 657	\$ 535	Abr22 - Abr23	19%
	FUNDARREGION	267-22	\$ 657	\$ 525	Abr22 - Abr23	19%
	ASOGANADO	787-20	\$ 648	\$1.203	Nov20 - Mar23	35%
	Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz	263-22	\$ 648	\$ 513	Mar22 - Mar23	40%
	Corporación PBA	110-22	\$ 638	\$ 724	Abr22 - Abr24	16%
	ASI	53-22	\$ 637	\$ 605	Mar22 - Mar23	36%

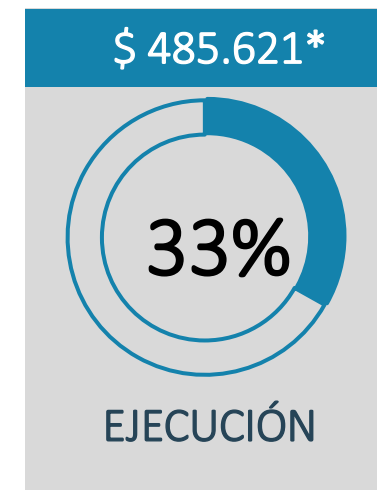

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Corpoamazonía	50-22	\$ 630	\$ 463	Feb22 - Ene23	40%
	Fundación integral para el desarrollo sostenible Findes	323-22	\$ 630	\$ 421	May22 - May23	42%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	42-22	\$ 630	\$ 614	Mar22 - Feb23	35%
	Union Temporal Agromanifue	305-22	\$ 630	\$ 576	Abr22 - Mar23	37%
	FUNDARREGION	266-22	\$ 630	\$ 546	Abr22 - Jul23	20%
	U.T AGROMANIFUE	289-22	\$ 621	\$ 438	Abr22 - Abr23	41%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	47-22	\$ 621	\$ 437	Jun22 - Jun23	21%
	ASI	55-22	\$ 621	\$ 485	Mar22 - Mar23	39%
	Fundación Planeta Rural	268-22	\$ 619	\$ 436	Mar22 - Mar23	41%
	Acuicula Green Fish SAS	303-22	\$ 607	\$ 419	Abr22 - Abr23	41%
	Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad SERVICURE	129-22	\$ 603	\$ 4.345	Mar22 - Mar23	4%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Abr23	42%

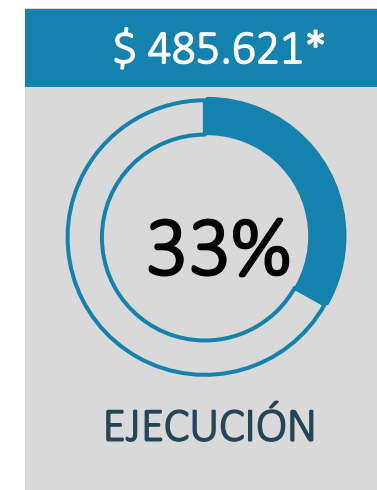

BID Préstamo




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	CAFISUR	100-22	\$ 603	\$ 577	May22 - May23	18%
	Corporación Colombia Internacional CCI	284-22	\$ 593	\$ 449	Mar22 - Mar23	20%
	PRAGRO SAS	39-22	\$ 602	\$ 435	Mar22 - Mar23	41%
	UNAD	282-22	\$ 600	\$ 408	May22 - Nov23	21%
	GENYTEC	111-22	\$ 600	\$ 400	Abr22 - Abr23	21%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Abr23	50%
	ASOPRODAMET	285-22	\$ 593	\$ 836	Mar22 - Abr23	0%
	Instituto Amazónico de Investigaciones científicas SINCHI	265-22	\$ 591	\$ 632	Jun22 - Jun24	17%
	Camara de Comercio de Arauca	293-22	\$ 591	\$ 494	May22 - Nov23	19%
	Corporación Colombia Internacional CCI	256-22	\$ 585	\$ 497	Mar22 - Mar23	38%
	Corpoamazonía	38-22	\$ 585	\$ 424	Feb22 - Ene23	41%
	CORSOC-ONG	127-22	\$ 585	\$ 789	Mar22 - Mar23	43%
	Federación nacional de cafeteros de Colombia	126-22	\$ 584	\$ 474	Jul22 - Jun23	19%
	Bolivar - Asocafe	121-22	\$ 584	\$ 389	Abr22 - Oct23	21%
	CINDAP	49-22	\$ 585	\$ 447	Mar22 - Mar23	20%
	Fundación Hijos de la Sierra Flor	264-22	\$ 585	\$ 638	Mar22 - Mar23	33%

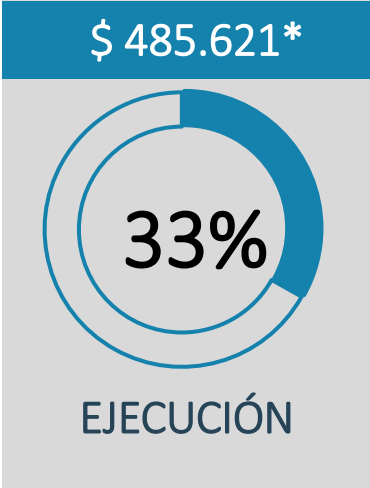

BID Préstamo



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASOES	286-22	\$ 416	\$5.547	Mar22 - Mar23	3%
	Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI	97-22	\$ 327	\$ 781	Jun22 - Jun24	0%
	CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Ene23	60%
	CECIDIC	368-22	\$ 244	\$ 196	Oct22 - Abr24	19%
Prestación de Servicios	41 CPS	N/A	\$ 8.347	-	Mar21 - Nov23	39%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	-	Ene21 - N/A	100%
Consultoría	Universidad de los Andes	518-22	\$ 198	-	Pendiente acta	0%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	\$ 251	-	Nov21 - Ago23	58%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 148	-	N/A	81%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Feb23	79%
Operador Logístico	Imagroup Colombia S.A.S	461-22	\$ 50	-	Ago22 - May23	19%
Libro y Brochure	Mas medios diseño y comunicación estratégica S.A.S	492-22	\$ 14	-	Sep22 - Feb23	11%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	\$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	100%

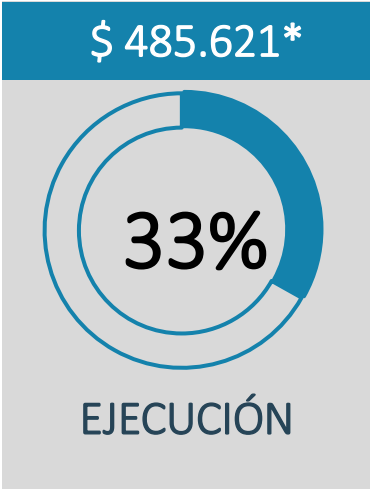

BID Préstamo

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 124.381

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
89 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 5.967	-	Sep-19	En proceso de Liquidación
28 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 2.647	-	Oct-19	Liquidado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$ 2.031	-	May-20	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$ 1.929	-	May-20	Liquidado
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$ 1.927	-	May-20	Liquidado
Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov-22	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Jun-21	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Jun-21	Liquidado
ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Ago-22	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$ 1.538	-	May-20	Liquidado
MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Ago-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Jun-21	Liquidado
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$ 1.527	-	May-20	Liquidado
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.349	-	Jun-21	Liquidado
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Jul-21	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$ 1.438	-	May-20	Liquidado
ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Sep-22	En proceso de Liquidación
UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.297	-	Sep-21	En proceso de Liquidación
Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Dic-22	En proceso de Liquidación
ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Dic-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

BID Préstamo

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 124.381

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Jun-21	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Jun-21	Liquidado
FUDESCO	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov-22	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	-	Jul-20	Liquidado
Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Jun-21	Liquidado
Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Jun-21	Liquidado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Sep-21	Liquidado
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Oct-21	Liquidado
Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Jun-21	Liquidado
INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Jun-21	Liquidado
APCA Corporación para el Desarrollo ral y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Jun-21	Liquidado
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Jun-21	Liquidado
CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Sep-22	En proceso de Liquidación
CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Sep-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Sep-22	En proceso de Liquidación
FUN Lantano	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 250
16 al 20 de enero de 2023



BID Préstamo

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 124.381

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Jul-21	Liquidado
Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Jun-21	Liquidado
Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Feb-22	Liquidado
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Ago-21	En proceso de Liquidación
ASOHECA	859-20	\$ 777	\$4.014	Oct-22	En proceso de Liquidación
Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Jul-22	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Ago-21	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Jun-21	Liquidado
CORPOTUNIA	782-20	\$ 660	\$ 2.889	Mar-22	Liquidado
Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Feb-22	Liquidado
Universidad de los Andes	309-20	\$ 655	-	Oct-21	En proceso de Liquidación
INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Dic-22	En proceso de Liquidación
Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Sep-22	En proceso de Liquidación
Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Sep-22	En proceso de Liquidación



BID Préstamo

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 124.381

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Jul-22	En proceso de Liquidación
Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Oct-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic-22	En Proceso de Liquidación
ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORPOJAGUAR	789-20	\$ 572	\$ 1.676	Nov-22	En proceso de Liquidación
FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Mar-22	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	\$ 479	-	Sep-21	Liquidado
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun-20	Liquidado
High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 10	-	Abr-22	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep-20	Liquidado
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	-	-	Nov-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	855-20	-	-	May-22	Liquidado



BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2024



BID Facilidad




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible BID Facilidad	\$ 4.150

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Auditorías	\$ 196
Contratos de prestación de servicios	\$ 30

BID Facilidad




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.595	\$1.931	Nov20 - Ene23	45%
	APROCASUR	279-22	\$ 1.211	\$ 807	Mar22 - Jun23	42%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.140	\$ 717	Nov20 - Ene23	55%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	117-22	\$ 972	\$ 663	Mar22 - Mar23	42%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	118-22	\$ 900	\$ 875	Mar22 - Mar23	35%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	119-22	\$ 900	\$ 693	Mar22 - Jun23	40%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 850	\$1.038	Ago20 - Ene23	42%
	La fundación de mineros S.A	280-22	\$ 783	\$ 770	May22 - May24	18%
	CCI	278-22	\$ 687	\$ 458	Mar22 - Jun23	42%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 680	\$1.942	Feb21 - Feb23	24%
	UNAD	130-22	\$ 639	\$ 665	May22 - May23	17%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 726	\$ 401	Sep20 - Ene23	59%
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	Corporación Colombiana internacional	844-21	\$ 545	\$ 366	Oct21 - Feb23	53%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 CPS	N/A	\$ 332	-	May22 - Nov23	28%

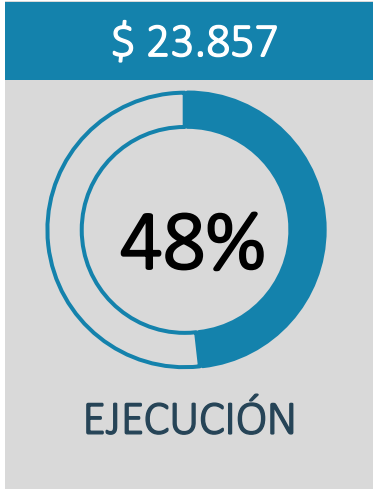

BID Facilidad



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-21	\$ 154	-	Feb21 - N/A	67%
		44-21	\$ 100	-	Feb21 - N/A	100%
Diseño e impresión material visual	Sinergia P&M S.A.S	326-22	\$ 86	-	Abr22 - Abr23	25%
Campaña BIBO	Comunican S.A.	457-22	\$ 75	-	Ago22 - May23	65%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 72	-	N/A	73%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 24	-	Nov19 - Feb23	68%
		447-22	\$ 20	-	Ago22 - Mar24	8%
		357-22	\$ 9	-	Abr22 - Jul23	94%
Página web	High Quality Solutions La EU	353-22	\$ 21	-	May22 - May23	20%
Desarrollar e implementar videos tutoriales	Compañía pedagógica SAS	482-22	\$ 9	-	Sep22 - Feb23	0%

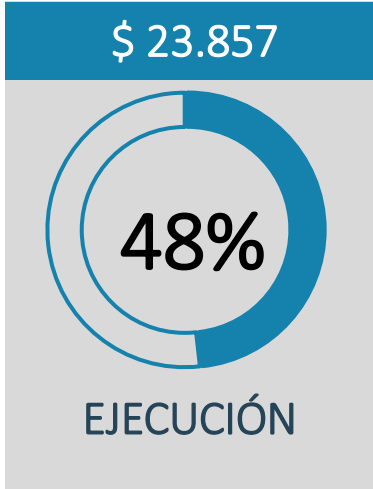



BID Facilidad

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 7.099

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Sep-21	Liquidado
Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	\$ 1.585	\$ 1.309	Dic-22	En proceso de Liquidación
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	\$ 1.309	-	Sep-21	Liquidado
25 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 918	-	Nov-19	En proceso de Liquidación
2 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 181	-	Nov-19	Liquidado
Editorial la republica SAS	444-22	\$ 48	-	Dic-22	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	412-19	\$ 3	-	Oct-21	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene-21	Liquidado



Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2023



Herencia Colombia



Nombre corto	Valor
Disponible Herencia Colombia	\$ 4.336

Herencia Colombia

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución
\$ 20.482

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia	1062-21	\$ 6.200	\$ 2.658	Dic21 - Jun23	63%
Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura	Consorcio Ingeurbano	1026-21	\$4.602	-	Abr22 - Feb23	11%
Estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana	Corporación grupo empresarial ASES	418-22	\$ 2.776	-	Ago22 - Abr23	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	15 CPS	N/A	\$1.334	-	Ene22 - Jun23	66%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Nevados	321-22	\$ 1.561	-	May22 - Feb23	46%
Tiquetes aéreos	Pubblica SAS	327-22	\$ 500	-	Abr22 - Abr23	1%
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	Consorcio Interparques 22	322-22	\$ 330	-	Abr22 - Feb23	16%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	2%
Interventoría	Consorcio Macaram	419-22	\$ 222	-	Ago22 - May23	0%

\$ 20.482*

40%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a la terminación de 1 CPS

Informe Semanal No. 250
16 al 20 de enero de 2023




Herencia Colombia



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	7 CPS	\$ 817	Ago-22	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	5 CPS	\$ 266	Sep-21	Liquidado



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2023



Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 1.611

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 91
Interventoría	\$ 46

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	\$ 10.000	-	Sep21 - May23	65%
Implementar procesos de restauración ecológica	Masbosques	224-22	\$ 7.441	\$ 210	Feb22 - Abr23	75%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	\$ 6.000	\$ 576	Nov21 - May23	79%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	\$ 7.000	\$ 3.010	Sep21 - Nov23	36%
		708-21	\$ 5.000	\$ 2.150	Sep21 - Mar23	38%
Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales	Masbosques	1047-21	\$ 9.990	\$ 190	Dic21 - Feb23	88%
Prestación de Servicios Persona Natural	60 CPS	N/A	\$ 4.380	-	Jul21 - Ago23	60%
Adquisición de insumos para dotación de viveros	Universidad de Cordoba	152-22	\$ 5.686	-	Mar22 - Abr23	18%
Implementar acciones de restauración ecológica	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia	1089-21	\$ 2.975	\$ 1.275	Mar22 - Mar23	11%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	\$ 2.940	\$ 1.260	Jul21 - Mar23	56%

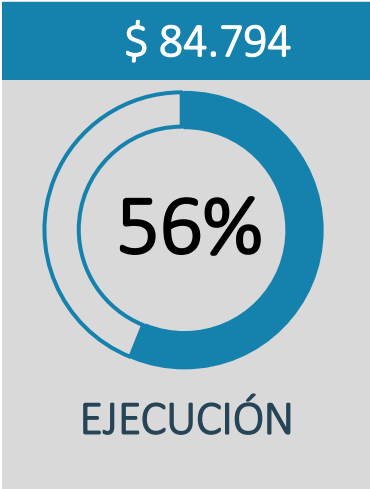

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Iguaque	316-22	\$ 1.605	-	Abr22 - Ene23	65%
Implementar proyecto piloto de restauración activa	Corpocaldas	35-22	\$ 1.500	\$ 287	Ene22 - Mar23	55%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	\$ 1.469	\$ 630	Nov21 - Jul23	31%
Negocios verdes	Innpulsa Colombia	1028-21	\$ 1.300	\$ 500	Ene22 - Feb23	14%
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Estoraques	367-22	\$ 1.235	-	Ago22 - Ene23	5%
Obtener información de la Biodiversidad presente en el Tejido Urbano	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	1048-21	\$ 1.000	\$ 301	Ene22 - Ene23	46%
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Corales	319-22	\$ 871	-	May22 - Feb23	84%
Implementar un esquema de pago por servicios	Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge	219-22	\$ 823	\$ 82	Feb22 - Feb23	9%

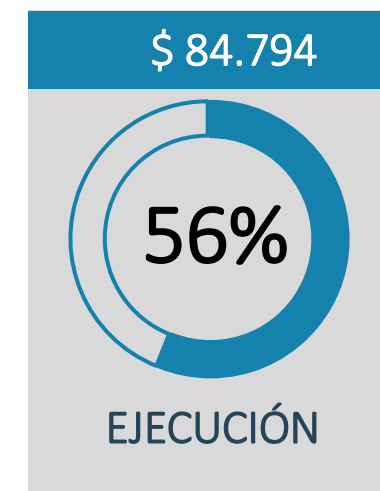

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Tiquetes aéreos	Pubblica SAS	327-22	\$ 685	-	Abr22 - Abr23	18%
Restauración Ecológica	Saving The Amazon	1027-21	\$ 510	\$ 219	Dic21 - Mar23	49%
Incentivar procesos reforestación	Coolechera	220-22	\$ 486	\$ 209	Ene22 - Ene23	49%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	34%
Interventoría	Corporación Grupo Empresarial ASES	312-22	\$ 286	-	Abr22 - Feb23	0%
	Consorcio estoraques HC	420-22	\$ 178	-	Ago22 - Feb23	0%
	Consorcio JD 044	317-22	\$ 160	-	Abr22 - Feb23	55%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA Ltda.	425-22	\$ 74	-	Ago22 - Feb23	3%

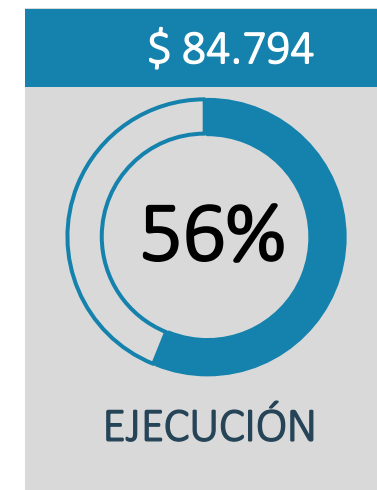

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 41.608

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Invermar	181-22	\$ 7.435	-	Jul-22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	104 CPS	\$ 6.627	-	Abr-22	En proceso de Liquidación
Masbosques	774-21	\$ 4.000	\$ 172	Sep-22	En proceso de Liquidación
Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarenia	1090-21	\$ 4.106	-	Dic-22	En proceso de Liquidación
Universidad Nacional abierta y a distancia	1121-21	\$ 3.320	-	Nov-22	En proceso de Liquidación
Arquiteck y asociados SAS	309-22	\$ 3.278	-	Nov-22	En proceso de Liquidación
Consorcio Arqmará Tayrona	311-22	\$ 3.008	-	Dic-22	En proceso de Liquidación
Ecoflora SAS	772-21	\$ 2.345	-	Jun-22	Liquidado
RTVC	216-22	\$ 1.728	-	Dic-22	En proceso de Liquidación
Universidad pontifica Bolivariana	1083-21	\$ 1.000	\$ 440	Nov-22	En proceso de Liquidación
Valencia Producciones FX	878-21	\$ 757	-	Abr-22	En proceso de Liquidación
Wework	720-21	\$ 756	-	Sep-22	En proceso de Liquidación
EMTEL E.S.P.	906-21	\$ 600	-	Nov-22	En proceso de Liquidación
Policía Nacional	689-21	\$ 400	-	Nov-22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	10 CPS	\$ 334	-	Oct-21	Liquidado
Corporación Grupo Empresarial ASES	310-22	\$ 232	-	Nov-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 41.608

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundación Natura	843-21	\$ 206	\$ 91	Nov-22	En proceso de Liquidación
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico	1112-22	\$ 200	\$ 158	Nov-22	En proceso de Liquidación
Telecafé Limitada	1084-21	\$ 200	-	Mar-22	En proceso de Liquidación
703 S.A.S.	709-21	\$ 91	-	Oct-21	Liquidado
Pradilla Nuñez SAS	911-21	\$ 75	-	Dic-21	En proceso de Liquidación
I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	\$ 50	-	Dic-21	En proceso de Liquidación



Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral (compra de predios)



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2023



Agencia Nacional de Tierras 2019




Nombre corto	Valor
Disponible ANT 2019	\$ 2.851

Agencia Nacional de Tierras 2019



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 11.952	N/A	100%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 2.230	Sep21 - Mar23	50%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 1.344	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 1.303	Jul21 - Ene23	10%
Levantamiento de información y diligenciamiento de FISO	Consultores en información Infometrika S.A.S.	466-22	\$ 1.982	Oct22 - May23	0%

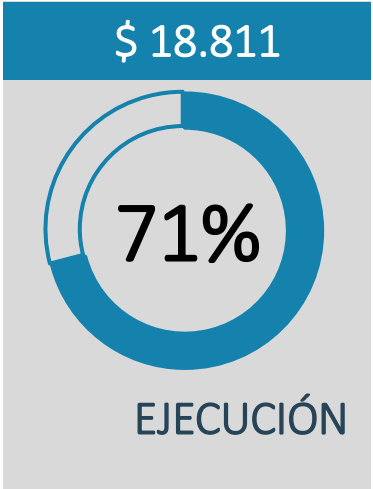




Agencia Nacional de Tierras 2019



Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 49	May 21	Liquidado



KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2020 - 2025






Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible KFW	\$ 46.883

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Adquisición de vehículos	\$ 498



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	Gopa Infra GMBH Sucursal Colombia	355-22	\$ 5.928	Ago22 - Ago25	12%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 CPS	N/A	\$ 100	Pendiente acta	0%
Adquisición de motocicletas	Grupo Supermotos S.A.S.	840-22	\$ 37	Pendiente acta	0%





AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2020 - 2023



AFD





Nombre corto	Valor
Disponible AFD	\$ 449

AFD



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF International	509-22	\$ 735	Nov22 - Jul23	0%
Estructuración Integral de Proyectos	ADEL CCZ - RM - DM	394-22	\$ 588	Jul22 - Mar23	35%

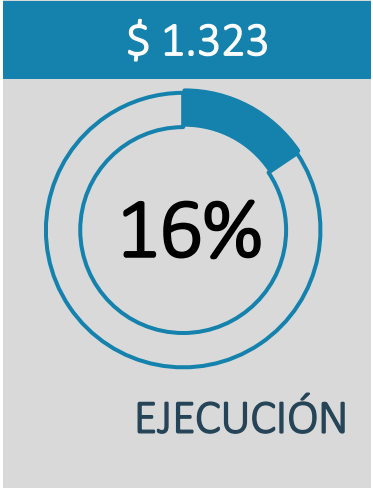



VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el
Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2023



Visión Amazonía




Nombre corto	Valor
Disponible Visión Amazonía	\$ 920

Visión Amazonía




Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 1.894	Nov20 - Mar23	100%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 734	Nov20 - Ene23	0%
	Fundación equal Colombia	123-22	\$ 709	Mar22 - Mar23	87%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	\$ 680	Abr22 - Abr24	100%
	Rape Región Central	443-22	\$ 637	Pendiente acta	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	\$ 576	Mar22 - Mar23	87%
	ASOGANADO	787-20	\$ 432	Nov20 - Mar23	100%
	ASOPRODAMET	285-22	\$ 396	Mar22 - Abr23	87%
	ASOES	286-22	\$ 277	Mar22 - Mar23	100%
	Instituto amazónico de investigaciones científicas SINCHI	97-22	\$ 218	Jun22 - Jun24	87%

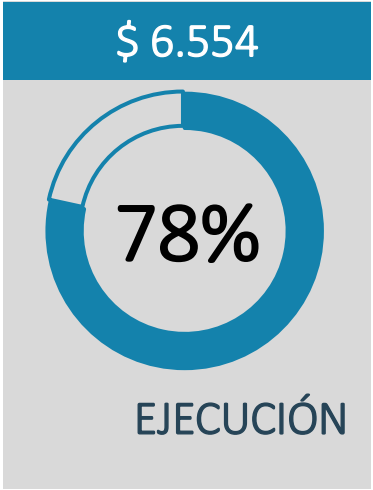

Visión Amazonía



Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
ASOHECA	859-20	\$ 518	Oct-22	En proceso de liquidación
CORPOJAGUAR	789-20	\$ 382	Nov-22	En proceso de liquidación



ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



ICBF Sacúdete




Nombre corto	Valor
Disponible ICBF Sacúdete	\$ 58.757

ICBF Sacúdete



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 108	-	N/A	1%

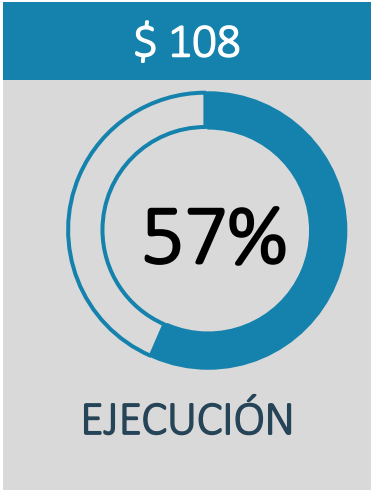

ICBF Sacúdete

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 32.149

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Asociación Colombiana Renaciente	925-21	\$ 2.246	\$ 67	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	\$ 1.986	\$ 50	Jun-22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	853-21	\$ 1.655	\$ 42	Abr-22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	968-21	\$ 1.544	\$ 39	Jun-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	986-21	\$ 1.503	\$ 90	Jul-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	\$ 1.319	\$ 33	Jun-22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	724-21	\$ 1.232	\$43	Abr-22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	740-21	\$ 1.469	\$ 37	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	\$ 995	\$ 38	Abr-22	En proceso de Liquidación
Corporación Trigal del Norte	722-21	\$ 912	\$ 36	Mar-22	En proceso de Liquidación
Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	\$ 965	\$ 24	Abr-22	En proceso de Liquidación
Corporación Oxsan	856-21	\$ 963	\$ 40	Abr-22	En proceso de Liquidación
AEMG	987-21	\$ 856	\$ 26	Jun-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	839-21	\$ 852	\$ 51	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	\$ 805	\$ 32	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	808-21	\$ 802	\$ 48	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social Creciendo	698-21	\$ 794	\$ 24	Mar-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

ICBF Sacúdete

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 32.149

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	\$ 940	\$ 24	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el desarrollo y soluciones	812-21	\$ 774	\$ 20	Jun-22	En proceso de Liquidación
Prestación de servicios	10 CPS	\$ 735	-	Sep-22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	\$ 725	\$ 29	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el desarrollo y soluciones	813-21	\$ 715	\$ 18	Jul-22	Liquidado
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	\$ 705	\$ 18	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	\$ 622	\$ 25	Abr-22	En proceso de Liquidación
FAVANSO	855-21	\$ 647	\$ 32	Jun-22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP	988-21	\$ 608	\$ 15	Jun-22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	814-21	\$ 548	\$ 19	Jun-22	En proceso de Liquidación
Corpollanos	924-21	\$ 543	\$ 14	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	\$ 511	\$ 20	Mar-22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP	840-21	\$ 477	\$ 12	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	\$ 477	\$ 12	Jun-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



ICBF Sacúdete

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 32.149

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundalianza	910-21	\$ 437	\$ 11	Jun-22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	900-21	\$ 349	\$ 12	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundalianza	908-21	\$ 249	\$ 6	Jun-22	En proceso de Liquidación
UT San Pedro	743-21	\$ 120	\$ 5	Sep-22	En proceso de Liquidación
Vélez Tours SAS	217-22	\$ 55	-	Sep-22	En proceso de Liquidación



Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Proceso de Cierre



Temporalidad: 2023






Zona ZEII Catatumbo



Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Unión temporal Ludark	391-22	\$ 210	-	Oct-22	En proceso de liquidación
1 CPS	N/A	\$ 110	-	Oct-22	En proceso de liquidación





Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2023

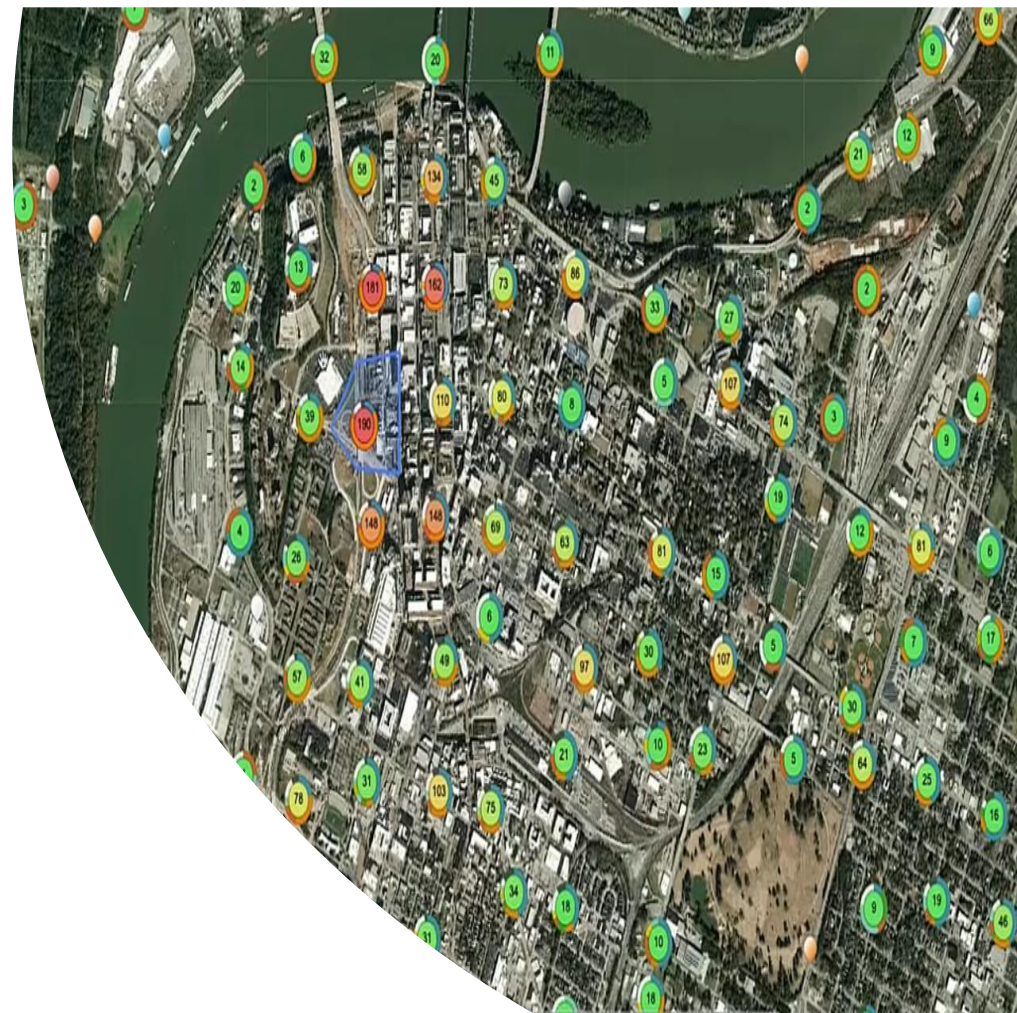

Catastro Multipropósito



Nombre corto	Valor
Disponible Catastro Multipropósito	\$ 36.154

Catastro Multipropósito



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Generar Productos Cartográficos	UT Carto 044 2022	483-22	\$ 6.354	Sep22 - May23	0%
Adquirir Ortoimágenes de los Municipios priorizados	Unión temporal Ingecalculo	387-22	\$ 5.163	Jul22 - Mar23	0%
Adquirir estaciones de referencia de operación continua CORS	Datum Ingeniería S.A.S.	837-22	\$ 3.046	Pendiente acta	0%
Captura de coordenadas de precisión	Consorcio apoyo PDET	562-22	\$ 535	Pendiente acta	0%





Catastro Multipropósito

Disponible

En Trámite

Convocatoria


Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados
\$ 1.395

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Geospatial S.A.S	386-22	\$ 1.132	Nov-22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 6 CPS	N/A	\$ 129	Mar-22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 7 CPS	N/A	\$ 135	Abr-22	Liquidado



Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales



Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.



Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2023



Zona ZEII Catatumbo - Catastro



Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro	\$ 78

Zona ZEII Catatumbo - Catastro



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operación Catastral	Geodesia por Satélite de Colombia LTDA.	2-23	\$ 1.082	-	Pendiente acta	0%
Operación Catastral	Asomunicipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña Y Sur del Cesar	422-22	\$ 194	-	Ago22 - May23	0%





Zona ZEII Catatumbo - Catastro



Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar.	218-22	\$ -	-	May 22	Liquidado





FONDO COLOMBIA EN PAZ

Muchas Gracias



www.fcp.gov.co



[@fcolombiaenpaz](https://twitter.com/fcolombiaenpaz)



[@FondoColombiaenPaz](https://www.facebook.com/FondoColombiaenPaz)



[Fondo Colombia en Paz](https://www.linkedin.com/company/fondo-colombia-en-paz)
