



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



INFORME SEMANAL Fondo Colombia en Paz

25 al 29 de enero de 2021

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.





Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial
de Paz



Estabilización



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Agencia Nacional de
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos
Especiales



Herencia Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



Agencia Nacional de
Tierras 2019



KfW



AFD



Visión Amazonía





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 3.122.129	\$ 2.935.065	\$ 187.064
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.725.846	\$ 2.554.795	\$ 171.051
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.123.490	\$ 2.108.332	\$ 15.157

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$4.429 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.838 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$12.464./Aporte de contrapartida OIM \$600/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad \$4.086. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo \$132.740/ Convenio Fondo Paz \$889/






La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.468.423	\$ 1.341.152	91%	\$ 127.270	9%
Reincorporación	\$ 525.759	\$ 505.900	96%	\$ 19.859	4%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 464.733	\$ 445.929	96%	\$ 18.804	4%
BID Préstamo	\$ 332.738	\$ 277.350	83%	\$ 55.388	17%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 116.218	\$ 0	0%	\$ 116.218	100%
Funcionamiento	\$ 50.058	\$ 49.843	99%	\$ 215	1%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.937	100%	\$ 128	0%
Herencia Colombia	\$ 23.244	\$ 0	0%	\$ 23.244	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 1.119	5%	\$ 20.584	95%
Primera Infancia	\$ 20.876	\$ 20.873	100%	\$ 3	0%
Estabilización	\$ 20.519	\$ 20.386	99%	\$ 133	1%
BID Facilidad	\$ 13.924	\$ 11.986	86%	\$ 1.938	14%
KFW	\$ 12.464	\$ 0	0%	\$ 12.464	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.812	99%	\$ 35	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 3.122.129	\$ 2.725.846	87%	\$ 396.283	13%

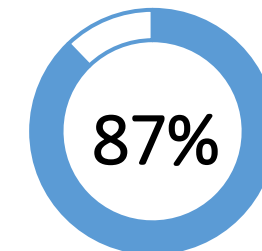




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapagadas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.341.152	\$ 1.245.849	92,9%	\$ 87.921	6,6%	\$ 7.383	0,6%
Reincorporación	\$ 505.900	\$ 493.819	97,6%	\$ 11.081	2,2%	\$ 1.000	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 445.929	\$ 223.381	50,1%	\$ 220.988	49,6%	\$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	\$ 277.350	\$ 37.863	13,7%	\$ 106.746	38,5%	\$ 132.740	47,9%
Funcionamiento	\$ 49.843	\$ 42.521	85%	\$ 7.322	15%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.937	\$ 36.323	83%	\$ 7.614	17%	\$ 0	0%
Primera Infancia	\$ 20.873	\$ 19.684	94%	\$ 1.189	6%	\$ 0	0%
Estabilización	\$ 20.386	\$ 14.662	72%	\$ 5.724	28%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 11.986	\$ 981	8,2%	\$ 6.919	57,7%	\$ 4.086	34,1%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.812	\$ 2.804	100%	\$ 8	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 1.119	\$ 1.044	93%	\$ 75	7%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.725.846	\$ 2.123.490	78%	\$ 455.587	17%	\$ 146.769	5%



No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

¡Algo maravilloso
está pasando!




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Línea del Tiempo

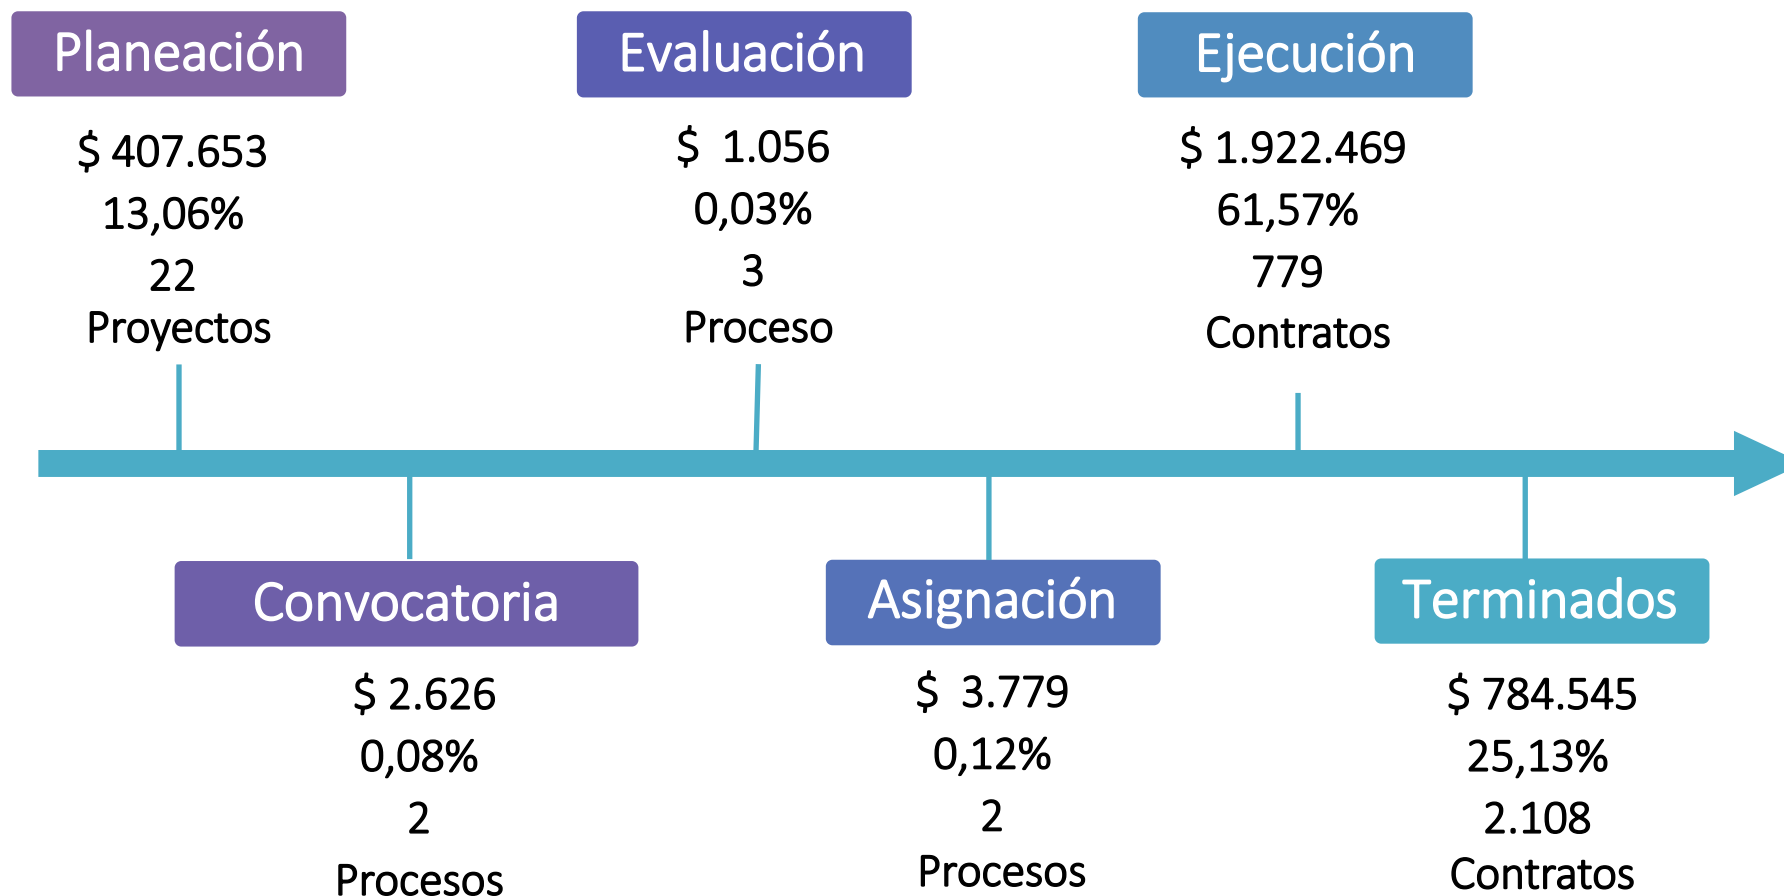



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 128.246

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 2.576

Ejecución
\$ 910.740

Terminado
\$ 426.861

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 128.246

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 127.270
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 772
Asistencia Alimentaria	\$ 204

Sustitución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 2.576

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Transporte Público Terrestre	ART	Asociación de Transportadores Especiales - AS Transportes	\$ 2.576	04 de febrero de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 910.740

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$800.336	-	Nov17 - Dic21	100%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	\$ 75.402	-	Jun20 - Abr21	20%
Prestación de Servicios Persona Natural	206 OPS	N/A	\$ 13.818	-	Feb19 - Ene22	47%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	Nov17 - Abr21	73%
Operador PNIS	Corporación para el Fomento Social de Colombia – COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	Ene21 - Ene22	0%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	-	Oct19 - Oct21	59%
		411-20	\$ 704	-	Ago20 - Oct21	36%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.224	-	N/A	52%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	-	Dic19 - Ene21	10%

\$910.740*

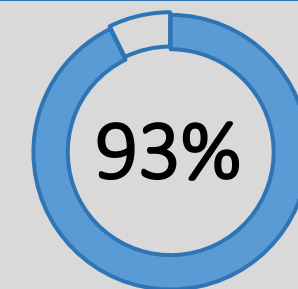

EJECUCIÓN

Sustitución

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de comisión convenio BAC, reintegro de pagos a familias, suscripción de 5 OPS y terminación del contrato 1-20 y de 20 OPS.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 426.861

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	\$319.078	\$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
UNODC	AF 001	\$ 67.500	-	dic-19	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 8.643	\$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
125 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 5.206	-	dic-18	Liquidado
141 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 5.493	-	dic-18	En proceso de liquidación
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 1.017	-	ene-20	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 880	-	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	-	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 20	-	nov-20	En proceso de liquidación

Sustitución

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.719

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 18.804
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 1.287
Servicios Integrales de comunicación	\$ 350
Tiquetes aéreos	\$ 278

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria
\$ 2.405

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Construcción de puente vehicular	ART	\$ 2.405	15 de febrero de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 954

Asignación

Ejecución

Terminados



Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Ejecución de Planes de Negocio	ART	\$ 656	1. Centro de Consultoría, Desarrollo y Evolución Empresarial Evoluciona 2. Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	04 de febrero de 2021
Interventoría Construcción de puente vehicular	ART	\$ 298	1. Sodicon S.A.S. 2. Nogaall S.A.S. 3. Consorcio Sol 4. Consorcio Intervial Antioquia	Suspendido

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 1.204

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Proyectos para el fomento y Fortalecimiento de actividades productivas	ART	U.T. Emprendimiento 2020	\$ 1.204	04 de febrero de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 239.032

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - Mar21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Jun21	0%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - May21	0%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - May21	0%
	U.T. Futuro Pazcífico	110-20	\$ 11.137	-	Jul20 - Ago21	0%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Ago21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Jun21	0%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	-	Feb20 - Mar21	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - Mar21	0%
	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	Jul20 - Ago21	0%

\$239.032*

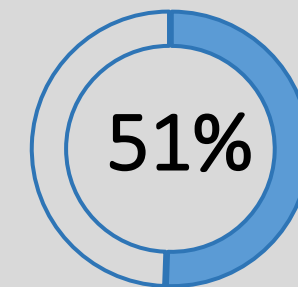

EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS, terminación de 24 OPS, adición al valor de 10 OPS, suscripción del contrato 18-21, adición al CDP de gastos de desplazamiento y terminación del contrato 519-19

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 239.032

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	Feb18 - Feb21	90%
Prestación de Servicios	319 OPS	N/A	\$17.136	-	Abr19 - Ene22	41%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - Abr21	12%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - Oct21	4%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Ago21	8%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	Ene19 - Feb21	59%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	Ene19 - Feb21	65%
Operador Logístico	Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$ 5.017	-	Ene21 - Ene22	0%

\$239.032*

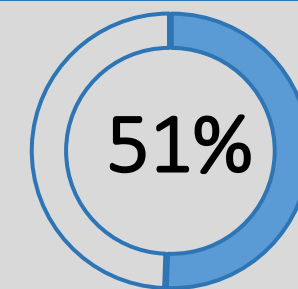

EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS, terminación de 24 OPS, adición al valor de 10 OPS, suscripción del contrato 18-21, adición al CDP de gastos de desplazamiento y terminación del contrato 519-19

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 239.032

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 3.156	-	Oct19 - Abr21	62%
Convenio	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	Sep20 - May21	17%
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	Ago20 - Ago21	0%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 1.737	-	N/A	53%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	Ene20 - Abr21	77%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	\$ 889	-	Dic20 - Dic21	0%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Ene21 - Nov22	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 440	-	Jun19 - Ene21	69%

\$239.032*

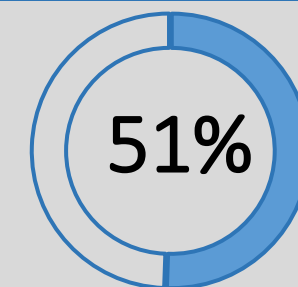

EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS, terminación de 24 OPS, adición al valor de 10 OPS, suscripción del contrato 18-21, adición al CDP de gastos de desplazamiento y terminación del contrato 519-19

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 200.419

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	925 OPS	\$24.949	-	feb-19	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 7.780	-	dic-20	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	257 OPS	\$6.719	-	jul-18	Liquidado
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	-	ago-20	En proceso de liquidación
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	ene-21	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	oct-20	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	nov-19	Liquidado

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.447

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 461.800

Terminado
\$ 43.512

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.447

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 19.859
Contratos de prestación de servicio	\$ 588

Reincorporación

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 461.800

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 354.949	-	Sep17 - Sep21	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 43.931	-	Jun18 - May21	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 29.834	-	Sep17 - May21	100%
Viveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	\$ 27.468	-	Abr20 - Mar21	77%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	Nov20 - May22	0%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	245-20	\$ 1.500	\$ 600	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios	6 OPS	N/A	\$ 407	-	Feb20 - Ene22	60%
Kits de Asepsia	Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	Ene21 - Ene22	0%
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 149	-	Jul20 - May21	50%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 179	-	N/A	88%
Tiquetes	Subatours S.A.S	24-20	\$ 82	-	Feb20 - May21	37%
Suscripción AROGIS DESKTOP	ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	Jun20 - Jun21	100%

\$461.800*

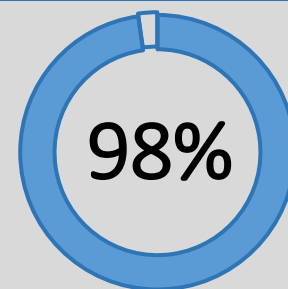

EJECUCIÓN

Reincorporación

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de proyectos productivo, pago comisión convenios BAC, suscripción del contrato 925-20, suscripción de 1 OPS, terminación de 7 OPS e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.512

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 3.376	\$ 200	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 10 OPS	N/A	\$ 575	-	feb-20	En proceso de liquidación
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	abr-20	Liquidado
Prestación de Servicios 3 OPS	N/A	\$ 82	-	feb-20	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	-	nov-19	Liquidado

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 128

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	\$ 128

Jurisdicción
Especial de
Paz





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 7.088

Terminados

Jurisdicción
Especial de
Paz

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul19 - Mar22	55%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb20 - Jun21	34%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$7.088*

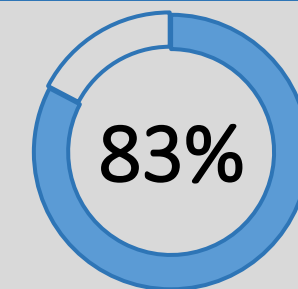

EJECUCIÓN

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a terminación del contrato 168-19

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 36.848

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	231 OPS	\$ 10.377	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	8 OPS	\$ 359	dic-18	En proceso de liquidación
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Jurisdicción
Especial de
Paz

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 3

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Primera
Infancia



Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 3





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 796

Terminados

Primera Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	12 OPS	N/A	\$571	Ene19 - Jun21	46%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun19 - Oct21	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$65	N/A	57%

\$ 796*



EJECUCIÓN





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 20.077

Primera Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$ 3.877	nov-20	En proceso de liquidación
Save the Children	540-18	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 3.074	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.075	ago-20	En proceso de liquidación
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	dic-20	En proceso de liquidación
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.404	nov-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	44 OPS	\$ 1.843	feb-19	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	13 OPS	\$ 639	sep-19	En proceso de liquidación

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 35

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Agencia Nacional de Tierras	\$ 35

Agencia
Nacional de
Tierras

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.812

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
67 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.952	jul-18	Liquidado
22 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 855	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Agencia
Nacional de
Tierras

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 461

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Funcionamiento



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 215
Tiquetes aéreos	\$ 246





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria
\$ 221

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Cartillas	FCP	\$ 221	01 de febrero de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 102

Asignación

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Aseo y Cafetería	FCP	\$ 102	1. Servi Limpieza SA 2. Grupo Empresarial SEISO SAS 3. Plusaseo SAS 4. Mundolimpieza Ltda. 5. Limpieza Institucional LASU SAS 6. Consorcio Cleaner – Internegocios 7. Situando SAS	11 de febrero de 2021

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 24.201

Terminados

Funcionamiento

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 7.645	Oct19 - May21	71%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 - May21	99%
Nómina	Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 5.564	Jun20 - Mar21	63%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.133	Jul20 - Mar21	44%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 751	Nov18 - May21	95%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 659	Dic20 - Nov22	8%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	\$ 631	Dic20 - Oct21	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 375	N/A	75%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	\$200	Jun19 - Oct21	83%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 143	May20 - Jun21	82%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul20 - Jul21	100%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 135	May19 – Mar21	81%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	74%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic21	0%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic21	41%
Póliza	Equidad Seguros	N/A	\$ 7	Jun20 - Jun21	100%

\$24.201*

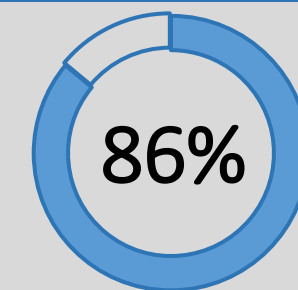

EJECUCIÓN

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a la adición en CDP de Asunción de Gastos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.073

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.114	Jun-20	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Ernst & Young	55-19	\$ 964	dic-20	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.073

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 23	jun-20	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	oct-20	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$ 14	oct-20	En proceso de liquidación
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	\$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.A.S.	60-19	\$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	mar-20	En proceso de liquidación
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	dic-20	En proceso de liquidación
Comunican S.A	99-20	\$ 1	mar-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

¡Algo maravilloso
está pasando!

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 133

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 133





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 9.574

Terminados

Estabilización

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	43 OPS	N/A	\$5.304	Dic18 - Ene22	43%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic19 - Dic21	3%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$1.700	Jul20 - Jul21	100%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun19 - Oct21	27%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 266	N/A	65%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 80	Mar20 - Mar21	83%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 74	N/A	23%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun20 - Jun21	33%

\$9.574*

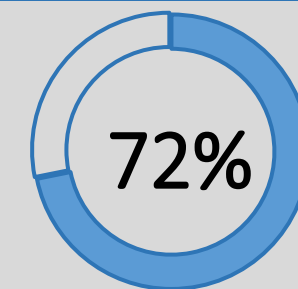

EJECUCIÓN

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a terminación de 1 OPS, suscripción de 1 OPS y adición al valor de 2 OPS

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 10.811

Estabilización

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	30 OPS	\$1.858	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	22 OPS	\$ 1.800	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Sociedad de
Activos
Especiales

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia
Sostenible

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 62.204

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 55.388
Proyectos productivos	\$ 5.085
Proyectos de Restauración Ecológica	\$ 1.731

BID Préstamo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 257.241

Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 6.720	\$ 8.345	Nov20 - Ene23	16%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	6%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov20 - Nov22	7%
	Fundación Chocolate tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	ASOCAFÉ	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Nov20 - Sep22	6%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - Nov22	11%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	0%
	ASOHECA	859-20	\$ 1.296	\$ 4.014	Nov20 - May22	9%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Ene24	23%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.835	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	0%
	CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov20 - Nov22	6%
	ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Nov20 - May22	10%
	ONF ANDINA	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	0%

\$ 257.241*

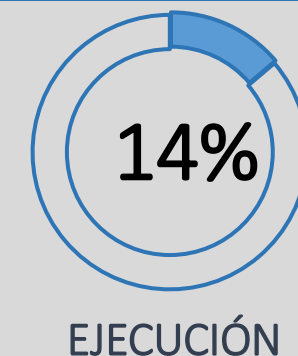

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción del contrato 24-21

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 257.241

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Nov20 - May22	12%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Nov22	8%
	CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Nov20 - May22	0%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Nov23	0%
	CORPOTUNIA	782-20	\$ 666	\$ 2.889	Nov20 - Nov21	0%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.010	\$ 1.338	Nov20 - Ene23	21%
	MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Nov20 - May22	0%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$ 2.398	Nov20 - Nov22	8%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	0%
	Fudesco	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov20 - Nov22	12%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov20 - Nov22	10%
	INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Nov20 - Nov21	8%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 954	\$ 1.676	Nov20 - Nov22	13%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$ 1.832	Dic20 - Dic22	0%
	ASOGANADO	787-20	\$ 1.080	\$ 1.203	Nov20 - Nov22	17%
	CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Nov20 - May22	0%
	CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - Nov22	19%

\$ 257.241*

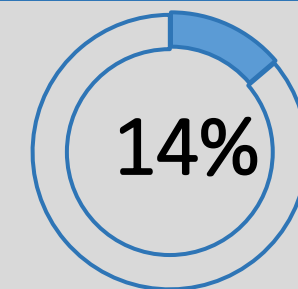

EJECUCIÓN

BID Préstamo

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción del contrato 24-21

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 257.241

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Nov22	15%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Nov20 - Nov22	0%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Nov20 - May22	20%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Nov22	21%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Nov22	0%
	FUN LATINO	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov20 - Nov22	0%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov20 - May22	0%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov20 - Nov22	16%
	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Nov20 - Nov21	18%
	Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Nov20 - Nov21	13%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Nov20 - Jul22	21%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	\$ 702	\$ 749	Nov20 - Ene24	0%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jigamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%

\$ 257.241*

14%

EJECUCIÓN

BID Préstamo

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción del contrato 24-21

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 257.241

Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Nov20 - Jul22	0%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Nov20 - Nov21	19%
	SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Nov20 - May22	0%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Nov22	0%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Nov22	0%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Nov22	0%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Nov20 - May22	0%
	CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Nov20 - Nov22	0%
	Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Nov20 - May20	21%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Nov20 - May22	0%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic20 - Dic21	0%
	FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Nov20 - Nov21	21%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Nov22	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Nov22	21%
Roster de estructuración de proyectos	Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Dic20 - May21	0%
	Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Dic20 - May21	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Dic20 - May21	0%
	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.479	-	Dic20 - May21	0%

\$ 257.241*

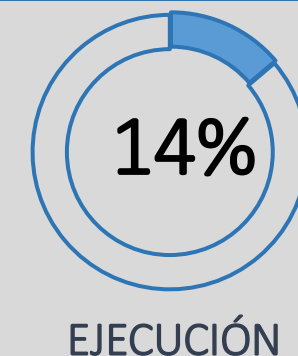

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción del contrato 24-21

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 257.241

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Roster de estructuración de proyectos	UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Dic20 - May21	0%
	UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.273	-	Dic20 - May21	0%
Prestación de Servicios	16 OPS	N/A	\$ 1.992	-	Ene20 - Jun21	40%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Oct20 - Oct21	5%
Estructuración Integral de Proyectos	APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Nov20 - Abr21	0%
	Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Nov20 - Abr21	0%
	APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Nov20 - May21	0%
	Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Nov20 - Abr21	0%
	Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Nov20 - Abr21	0%
	Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Nov20 - Abr21	0%
	Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Dic20 - Jun21	0%
	Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Nov20 - Abr21	0%
	APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Nov20 - Abr21	0%

\$ 257.241*

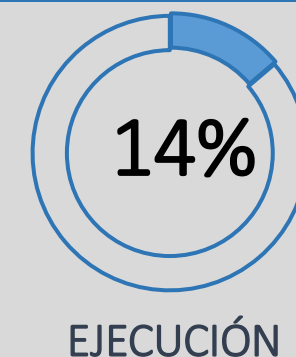

BID Préstamo

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción del contrato 24-21

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 257.241

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Nov20 - Abr21	0%
	Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Nov20 - May21	0%
Interventoría	U.T. Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Dic20 - Jun21	0%
	Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Dic20 - Jun21	0%
	Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Dic20 - Jun21	0%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 479	-	Oct20 - Oct21	12%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	\$ 471	-	Jun20 - Feb21	60%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	-	Ene21-N/A	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Jun21	10%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 37	-	N/A	100%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 7	-	Nov20 - Nov21	0%

\$ 257.241*

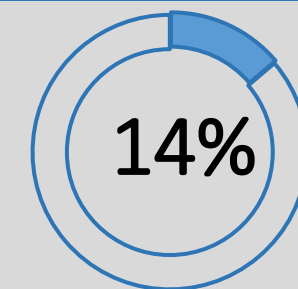

EJECUCIÓN

BID Préstamo

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción del contrato 24-21

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 13.293

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	-	May 2020	En proceso de Liquidación
43 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$1.257	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	\$1.438	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	-	Jul 2020	En proceso de Liquidación
8 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 511	-	Oct 2019	Liquidado
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun 2020	En proceso de Liquidación
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep 2020	En proceso de Liquidación

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 2.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	\$ 1.938
Proyectos Productivos	\$ 575
Auditoría	\$ 254

BID Facilidad





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 10.877

Terminados

BID Facilidad

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.530	\$ 1.931	Nov20 - Dic22	6%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 720	\$ 1.038	Ago20 - Sep22	0%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.017	\$ 717	Nov20 - Dic22	12%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Oct20 - Oct21	0%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 588	401	Sep20 - Oct22	23%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 748	-	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	\$ 317	-	Ene20 - Jul21	11%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	-	Nov19 - Jun21	7%
		412-19	\$ 48	-		0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 24	-	N/A	78%

\$ 10.877*

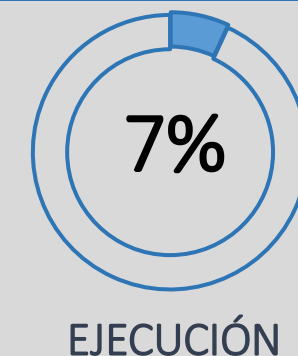

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a adición de 1 contrato de OPS

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 280

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$280	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado

BID Facilidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 23.244

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 23.244

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

Nombre corto	Valor
Por asignar Herencia Colombia	\$ 23.244





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 116.218

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 116.218

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.584

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.119

Terminado
\$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.584

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 20.584

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 1.119

Terminados

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 1.044	Nov19 - N/A	100%
Avalúo de predios	Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 75	Nov20 - Mar21	0%

\$ 1.119

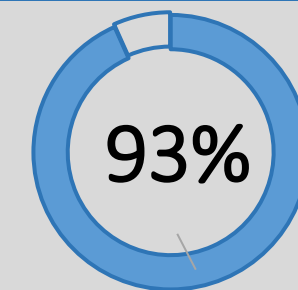

EJECUCIÓN

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 12.464

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	\$ 12.464





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ -

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 58.975.603

Desembolsados al Fondo

USD 3.345.515

Contribuciones pendientes

¡Algo maravilloso
está pasando!

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 62.321.118
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
 Reino Unido	USD 15.402.960	
 Chile	USD 100.000	USD 20.000
 Alemania	USD 14.576.386	
 Noruega	USD 17.848.520	
 Corea	USD 500.000	
 Suecia	USD 1.602.025	USD 3.146.303
 Canadá	USD 1.876.313	
 Fondo Consolidación de la Paz	USD 5.000.000	
 Suiza	USD 1.005.620	
 Finlandia	USD 162.753	USD 179.212
 Irlanda	USD 901.026	
Total:	USD 58.975.603	USD 3.345.515

Nota: Se registran nuevos compromisos por parte de Chile por USD 20.000 y de Finlandia por USD 179.212.

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total

Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2020
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	\$ 7.100.000
Saldo disponible (dólares):	0

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7

Proyectos
aprobados

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS	
	Banco Mundial	USD	4.000.000
	Suecia	USD	3.100.000
Total		USD	7.100.000

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 127.344.561

EUR 0

Contribuciones pendientes

¡Algo maravilloso
está pasando!

Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (julio/2020).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.344.561
Presupuesto en ejecución:	€121.214.610,19
Monto Proyectos en fase administrativa*:	6.000.000 (estimado)
Saldo disponible:	0
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	0



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Fondo Europeo para la Paz



32

Proyectos en ejecución

Total €121.2* millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 6.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comisión Europea	EUR 90.000.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 4.500.000	
Francia	EUR 3.000.000	
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungría	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 3.000.000	
Italia	EUR 5.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 46.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 40.678	
Suecia	EUR 4.770.422	
Chile	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Finlandia	EUR 150.000	
Bank interests	EUR 773	
Total:	EUR 127.344.561	

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



USD 19.658.355

*Contribuciones correspondientes al
POA 2018*

USD 12.000.000

*Contribuciones correspondientes al
POA 2019*

USD 250.000.000

*Presupuesto máximo para el pago
por resultados en los diez años de
vigencia del acuerdo con donantes*

Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$12,894,399

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

**¡Algo maravilloso
está pasando!**



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
 Suiza	USD 3.000.000	N/A
TOTAL	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible POA 2019

Líneas de inversión del POA 2019	Presupuesto en USD
Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación	\$2,710,000
Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación	\$9,095,000
Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques	\$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC	\$420,000
Total presupuesto POA 2019	\$17,045,000
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos	\$183,209
Total disponible para POA 2019	\$17,228,209

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 147
25 al 29 de enero de
2021



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

