



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

29 de julio al 02 de agosto de 2019



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial
de Paz



Estabilización



Programas de
Desarrollo con Enfoque
Territorial



Agencia Nacional de
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y
Desarrollo
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos
Especiales



Herencia
Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.265.919	\$ 2.239.360	\$ 26.559
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 1.702.734	\$ 1.687.263	\$ 15.470
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.369.888	\$ 1.362.056	\$ 7.831


Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por \$3.035 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID por \$967 millones





Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución	\$ 1.271.052	\$ 939.983	74%	\$ 331.069	26%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 409.751	\$ 402.603	98%	\$ 7.148	2%
Reincorporación	\$ 354.945	\$ 250.506	71%	\$ 104.439	29%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.218	\$ 43.237	98%	\$ 980	2%
Primera Infancia	\$ 20.552	\$ 19.567	95%	\$ 985	5%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.870	\$ 2.870	100%	\$ 0	0%
Funcionamiento	\$ 37.240	\$ 29.133	78%	\$ 8.106	22%
Estabilización	\$ 14.196	\$ 10.274	72%	\$ 3.923	28%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.823	\$ 1.823	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018)	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
BID Préstamo	\$ 96.885	\$ 0	0%	\$ 96.885	100%
BID Facilidad	\$ 9.650	\$ 0	0%	\$ 9.650	100%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.265.919	\$ 1.702.734	75%	\$ 563.185	25%


Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.





Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución	\$ 939.983	\$ 921.557	98%	\$ 18.426	2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 402.603	\$ 142.402	35%	\$ 260.201	65%
Reincorporación	\$ 250.506	\$ 240.586	96%	\$ 9.920	4%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.237	\$ 25.673	59%	\$ 17.564	41%
Primera Infancia	\$ 19.567	\$ 5.365	27%	\$ 14.202	73%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.870	\$ 2.804	98%	\$ 66	2%
Funcionamiento	\$ 29.133	\$ 19.077	65%	\$ 10.057	35%
Estabilización	\$ 10.274	\$ 7.863	77%	\$ 2.411	23%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.823	\$ 1.823	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018)	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
BID Préstamo	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 1.702.734	\$ 1.369.888	80%	\$ 332.846	20%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.



Línea del Tiempo

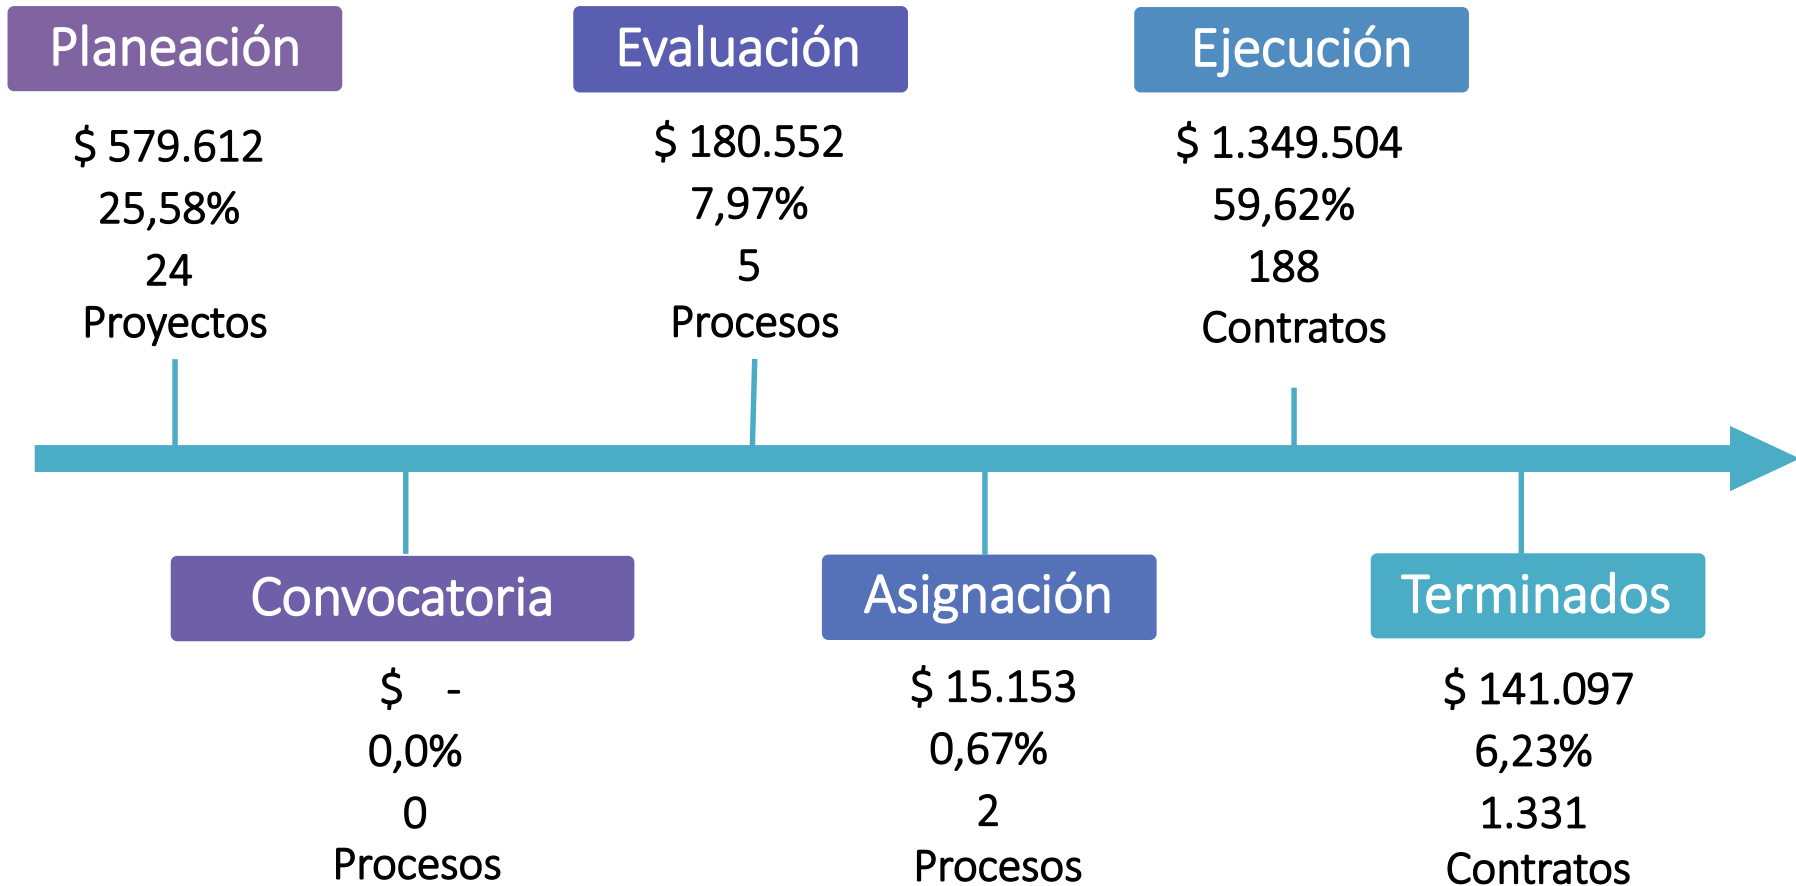



Planeación
\$ 332.718

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 937.278

Terminado
\$ 1.056

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 332.718

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	\$ 331.069	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 1.319	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Por definir
Tiquetes Aéreos	\$ 9	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Por definir

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 937.278

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$ 576.431	Nov 2017 Ago 2019	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$260.383	Dic 2017 Dic 2019	100%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	\$ 67.500	Sep 2017 Dic 2019	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	Ene 2018 Ene 2020	13%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Agrosavia	561-18	\$ 9.825	Ene 2018 Sep 2019	70%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 9.791	Nov 2017 Oct 2019	73%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$ 880	Ene 2018 Oct 2019	88%
Prestación de Servicios Persona Natural	16	N/A	\$ 798	Feb 2019 Ene 2020	4%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 724	N/A	3%

\$937.278*

98%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación en ejecución corresponde a:

-Disminución por otrosí al contrato 760-18 por y terminación del contrato 792-2018

-Incremento por pagos a familias y la suscripción de 3 OPS



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

SUSTITUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.056

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$695	dic-18	En proceso de liquidación
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$208	dic-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$154	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 12.000

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 176.378

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 147.252

Terminado
\$ 74.121

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 12.000

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	\$ 7.148	ART	Por definir
Hoja de Ruta	\$ 1.965	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.027	ART	Por definir
Unión Temporal Inter Infraestructura Social	\$ 1.002	ART	Por definir
Consorcio GOC-Nogaall	\$ 858	ART	Por definir





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	\$ 151.723	1. COMFACESAR – Caja de Compensación Familiar del Cesar 2. Consorcio GUAPI 2018 3. Cooperativa de Servicios y Comercialización PROINMAT 4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima 5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar 6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca Piedemonte 7. Global Communities 8. Unión Temporal Desarrollo Urabá Antioqueño 9. Consorcio Pacífico Medio PDET 10. Consorcio Construyendo Paz 11. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	12 de agosto de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	\$ 151.723	12. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial 13. Consorcio Nuevo Catatumbo 14. Consorcio Obras para la Paz 2019 15. Consorcio Obras para la Paz VI 16. Consorcio CONSTRUPAZ 17. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 18. Condugas S.A. 19. Unión Temporal PDET Caguán 2019 20. Proyectos Paz Colombia 21. Unión Temporal Desarrollo Montes de María 22. Global Communities 23. Unión Temporal Proyectos Paz Colombia 24. Unión Temporal Territorio 2019	12 de agosto de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	\$ 151.723	25. Consorcio FUNDYPROC 26. Fundación Plan 27. Fundación Plan 28. Consorcio PDET Urabá 2019 29. Unión Temporal Virgen de la Candelaria 30. Unión Temporal los Manglares 31. Unión Temporal ASOPRO – OBRAS 2019 32. Unión Temporal Obras Urabá 33. Unión Temporal Bolívar en Paz 34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca para la Paz 35. Consorcio Choco 11 36. Consorcio Catatumbo	12 de agosto de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	\$ 151.723	37. Caja de Compensación Familiar del Choco – COMFACHOCO 38. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Montes de María 39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO 40. Consorcio EGA 41. Unión Temporal Enfoque Territorial 42. Unión Temporal Alto Patía 43. SANGEM S.A.S. 44. Unión Temporal Obras de Paz 45. Consorcio Proyectos Montes de María 46. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 47. Unión Temporal Obras PDET 48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 OHAL – CONSUCOL 49. Unión Temporal Obras PDET 2019	12 de agosto de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	\$ 151.723	50. Unión Temporal GHM Arauca 51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 54. Electrizable S.A.S. 55. Consorcio Arauca FCP 2019 56. Unión Temporal Desarrollo Sierra Nevada 57. Unión Temporal PDET Arauca 2019 58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019 59. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Sierra Nevada 60. Consorcio EGA 61. Constructora INCO S.A.S. 62. Consorcio Paz S.A.S. 63. Consorcio EGA	12 de agosto de 2019*





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría	ART	\$ 22.177	1. Consorcio V-2C-I 2. Consorcio PDET INCO – NOG 3. Consorcio Nueva Alianza 4. Consorcio JMS 5. Consorcio Interobras 2019 6. Consorcio Interproyectos 20109 7. Grupo Solutions S.A.S. 8. Consorcio Tecni ART 9. Consorcio Bienestar Comunitario 10. Consorcio Interproyectos DMCT 2019 11. Consorcio Territorios – ART 12. Consorcio Territorios – ART 13. Consorcio Comunitario 2019 14. Consorcio Comunitario 2019	14 de agosto de 2019



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 176.378

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría	ART	\$ 22.177	15. Sociedad Técnica Sota Ltda. 16. 360 Mantenimiento y Construcción S.A.S. 17. J.A.H. Ingeniería Industrial S.A.S. 18. Unión Temporal Colombia en Paz 19. Unión Temporal Vive Colombia 20. Consorcio PDET INCO – NOG	14 de agosto de 2019
Transporte Público	ART	\$ 2.477	1. Transportes Especializados JR S.A.S. 2. Transportes Especiales FSG S.A.S. 3. Unión Temporal MSC 2019	21 de agosto de 2019



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 147.252

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Feb18 – Oct19	64%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	Mar18 – Oct19	64%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	May18 – Oct19	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	Mar18 – Oct19	49%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$13.890	Feb18 – Oct19	60%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	May18 – Oct19	32%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	Feb18 – Oct19	64%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	Feb18 – Sep19	63%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	Feb18 – Nov19	60%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	Mar18 – Oct19	64%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	Abr18 – Ago19	57%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 5.187	Jul19– Jul20	0%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$4.547	Ene19 – Oct19	1%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$4.252	Ene19 – Oct19	0%
Prestación de Servicios	91 OPS	N/A	\$4.710	Abr19 – Dic20	8%

\$147.252

64%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 147.252

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	Jul19 – Jul20	0%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$1.036	Feb19 – Nov19	50%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	Ago18 – Oct19	29%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$440	Jun19 – Dic19	0%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$270	Nov18 – Ago19	26%

\$147.252

64%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 74.121

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$56.149	feb-19	En proceso de liquidación
887 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 17.678	feb-19	En proceso de liquidación
10 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 283	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 104.439

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 237.599

Terminado
\$ 12.907

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 104.439

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 104.439	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 237.599

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 190.071	Sep 2017 Ago 2019	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 21.920	Sep 2017 Ago 2019	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 13.359	Jun 2018 Ago 2019	92%
Viveres Secos y Viveres Frescos	Integral Servicios S.AS.	42-19	\$ 8.146	May 2019 Ago 2019	17%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa	142-19	\$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	47%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$ 526	Feb 2019 Nov 2019	50%

\$237.599

96%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 12.907

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	may-19	En proceso de liquidación
SOLUCIONES J.R. E.U.	3-19	\$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 1.308

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 15.153

Ejecución
\$ 2.704

Terminado
\$ 25.052

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 1.308

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	\$ 980	JEP	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 251	JEP	Por definir
Licencia Sop. Técnico	\$ 77	JEP	Por definir

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 15.153

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Sistema de Gestión Judicial	JEP	SoftPlan Sistemas Colombia	\$ 9.708	09 de agosto de 2019
Gestión Documental	JEP	Servisoft S.A.S.	\$ 5.446	09 de agosto de 2019

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.704

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	19	N/A	\$1.596	Nov 2018 Jun 2020	15%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	Ene 2019 Suspendido	40%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$363	May 2018 Oct 2019	75%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	Jun 2018 Ago 2019	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	Oct 2018 Ago 2019	71%

\$2.704

92%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.052

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
102 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 4.353	dic-18	En proceso de liquidación
115 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 4.671	nov-18	Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$485	abr-19	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto



Planeación

\$ 10.122

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ 4.175

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 1.094

Terminado

\$ 5.161

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 10.122

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.716	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Modalidad Familiar	\$ 2.942	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	\$ 1.100	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.004	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 985	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 375	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 4.175

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Implementación oferta complementaria “Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida”, en municipios PDET	Alta Consejería Primera Infancia	\$ 2.675	1. Consorcio Gestar Infancia 2. Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia 3. Consorcio Construyendo Futuro 2019 4. Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	15 de agosto de 2019
Interventoría Procesos Judiciales	Alta Consejería Primera Infancia	\$ 1.500	1. RYF S.A.S. 2. Consorcio Paz para la Infancia 3. Garssa Consulting S.A.S. 4. Grupo IS Colombia S.A.S. 5. JAHV McGregor S.A.S. 6. C&M Consultores S.A. 7. RYG Asesorías S.A.S.	05 de agosto de 2019

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 1.094

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$594	Ene 2019 Dic 2019	37%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$341	May 2019 Jul 2019	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun 2019 Dic 2019	0%

\$ 1.094

86%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 5.161

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$ 1.089	ago-18	En proceso de liquidación
29 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 874	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.870

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.870

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
87 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.858	dic-18	En proceso de liquidación
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 7	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 8.106

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 20.646

Terminado

\$ 8.488

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación
\$ 8.106

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	\$ 8.106	FCP	Por definir

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 20.646

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18	\$ 6.143	Abr18 - Jul19	84%
Nómina	N/A	N/A	\$ 5.287	Sep17 - Jul19	77%
Nómina	Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 4.076	May19 – Feb20	26%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 1.919	Nov18 - Jul19	1%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	40-19	\$ 1.585	May19 – Feb20	14%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	\$ 643	May19 – Mar20	0%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	Dic18 - Dic20	30%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-2019	\$200	Jun19 – Dic19	0%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 79	May19 – May20	12%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	Ene18 - Jul19	35%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic19	6%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 28	Ene18 - Jul19	77%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 15	Jun19 – Jul19	12%

\$20.646

65%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*La variación en la ejecución corresponde a terminación de contrato 1093-2018 e incremento en asignación a Nomina



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 8.488

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.135	may-19	En proceso de liquidación
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	En proceso de liquidación
12 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 395	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
10 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 256	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 8.488

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 69	may-19	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 39	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 7	jun-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,
los valores pueden variar.





Planeación

\$ 4.383

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 2.931

Terminado

\$ 6.882

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 4.383

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 3.923	DAPRE	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 460	DAPRE	Por definir





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.931

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	17	N/A	\$1.583	Dic 2018 Jun 2020	35%
Campaña de Desminado	Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Feb 2018 Suspendido	50%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun 2019 Dic 2019	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 44	Ene 2019 Ago 2019	78%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 14	May 2019 Ago 2019	73%

\$ 2.931*

80%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* La variación en la ejecución corresponde al aumento por suscripción de 1 OPS, incremento en gastos de desplazamiento y terminación de 1 OPS





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 6.882

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 704	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 78	jun-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.823

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En liquidación



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.823

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.823	Abr 2019	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 96.885

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 96.885

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar BID Préstamo	\$ 96.885	DAPRE	Por definir

BID PRÉSTAMO





Planeación
\$ 967

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: DAPRE



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 967

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar BID Facilidad Línea 13	\$ 967	DAPRE	Por definir

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





Fondos de Cooperación



Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.



Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Noviembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 85.668.040
En ejecución (USD):	\$ 80.9 millones
Gastos administrativos	\$3.064.073
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

Total movilizado





Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

111

Proyectos aprobados
por USD \$83.7 M
(2016, 2017, 2018 y
2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Total:	USD 85.668.040*

*Con intereses Y devoluciones el total es de USD 87.2





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 36.9 millones
Presupuesto en ejecución (USD):	\$ -
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD 36.9 mill





Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
 Reino Unido	USD 5.092.400	
 Chile	USD 100.000	
 Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
 Noruega	USD 9.290.421	
 Corea	USD 500.000	
 Suecia		USD 4.719.455
 Canadá	USD 1.876.313	
 Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
 Suiza	USD 491.592	USD 498.505
Total:	USD 26.596.608	USD 10.300.191

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia contribuirá con EUR 150.000
- FCP contribuirá USD 2.000.000 (para proyecto de la Comisión de la Verdad)



Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2019
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	\$ 6.860.000
Saldo disponible (dólares):	\$ 240.000



Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto



5

Proyectos aprobados

Donante		Recursos Registrados
	Banco Mundial	USD 4.000.000
	Suecia	USD 3.100.000
Total		USD 7.100.000





Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)
Donantes:	Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	124.840.000
Presupuesto en ejecución:	€ 69.817.234
Monto Proyectos en fase administrativa*:	8.800.000 (aproximadamente)
Saldo disponible:	43.222.765
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	9.500.000



Fondo Europeo
para la Paz

EUR

Desembolsados al Fondo

EUR 9.500.000*

Contribuciones pendientes

EUR

Presupuesto Total

* El desglose de esta información están pendiente de recibirse con actualización.





Fondo Europeo para la Paz



27

Proyectos en ejecución
por un total de
€ 69.8** Millones de
Euros

Donante	Contribuciones Recibidas	Contribuciones Pendientes
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 2.010.000	EUR 990.000
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 1.500.000	EUR 1.500.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 24.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 20.319	
Suecia	EUR 1.392.410.	EUR 1.784.590
Total:	EUR 113.047.000	EUR 5.414.590



Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Presupuesto en ejecución (dólares):	\$ 8.540.000



BID Colombia
Sostenible

USD 18.575.437

Desembolsados al Fondo

USD 12.000.000

Contribuciones pendientes a febrero 2019, correspondientes al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes



Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 (líneas de trabajo 2018)



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS	US\$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US\$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US\$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US\$ 1.5 Millones
TOTAL	US \$ 8.540.000



Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que inician ejecución física y financiera en Marzo 2019 *



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US\$ 1.14 Millones
Desarrollo rural sostenible, operatividad de la Unidad técnica de coordinación	US\$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de capacidades locales	US\$ 1.00 Millones
TOTAL	US \$ 4.360.000



Fondo Colombia Sostenible



Donante	Recursos Desembolsados al Fondo 2018	Recursos por desembolsar 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 14.250.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.575.437	USD 1.000.000
 Suiza	USD 2.750.000	N/A
Total:	USD 18.575.437	USD 12.000.000

*Componente de pago por resultados

* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5,479,312 que pasa al POA 2019

- Noruega, anunció donación por USD\$ 11 millones
- Suecia, anunció la donación de USD \$ 1 millón
