



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

29 de junio al 03 de julio de 2020



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas

 Reincorporación	 Jurisdicción Especial de Paz	 Estabilización
 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	 Agencia Nacional de Tierras	 Funcionamiento
 Primera infancia	 Colombia Sostenible	 Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Sustitución	 Sociedad de Activos Especiales	 Herencia Colombia
 BID Préstamo	 BID Facilidad	 Agencia Nacional de Tierras 2019
 KFW	 AFD	



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.678.056	\$ 2.643.901	\$ 34.155
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.245.807	\$ 2.223.579	\$ 22.227
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.853.718	\$ 1.839.840	\$ 13.878

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$4.249 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$168 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones.



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.318.421	\$ 1.264.938	96%	\$ 53.483	4%
Reincorporación	\$ 524.959	\$ 414.187	79%	\$ 110.772	21%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 462.285	\$ 415.890	90%	\$ 46.394	10%
BID Préstamo	\$ 199.998	\$ 16.210	8%	\$ 183.788	92%
Funcionamiento	\$ 48.201	\$ 42.614	88%	\$ 5.586	12%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 44.065	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 552	3%	\$ 21.151	97%
Primera Infancia	\$ 20.852	\$ 19.051	91%	\$ 1.801	9%
Estabilización	\$ 20.519	\$ 17.778	87%	\$ 2.741	13%
BID Facilidad	\$ 9.650	\$ 3.126	32%	\$ 6.524	68%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.837	100%	\$ 10	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.678.056	\$ 2.245.807	84%	\$ 432.249	16%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.264.938	\$ 1.155.128	91%	\$ 109.810	9%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 415.890	\$ 200.727	48%	\$ 215.164	52%
Reincorporación	\$ 414.187	\$ 394.059	95%	\$ 20.128	5%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 30.487	69%	\$ 13.577	31%
Funcionamiento	\$ 42.614	\$ 34.071	80%	\$ 8.544	20%
Primera Infancia	\$ 19.051	\$ 12.961	68%	\$ 6.090	32%
Estabilización	\$ 17.778	\$ 10.437	59%	\$ 7.341	41%
BID Préstamo	\$ 16.210	\$ 7.631	47%	\$ 8.579	53%
BID Facilidad	\$ 3.126	\$ 303	10%	\$ 2.823	90%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.837	\$ 2.804	99%	\$ 34	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 552	\$ 552	0%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.245.807	\$ 1.853.718	83%	\$ 392.089	17%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.



Línea del Tiempo

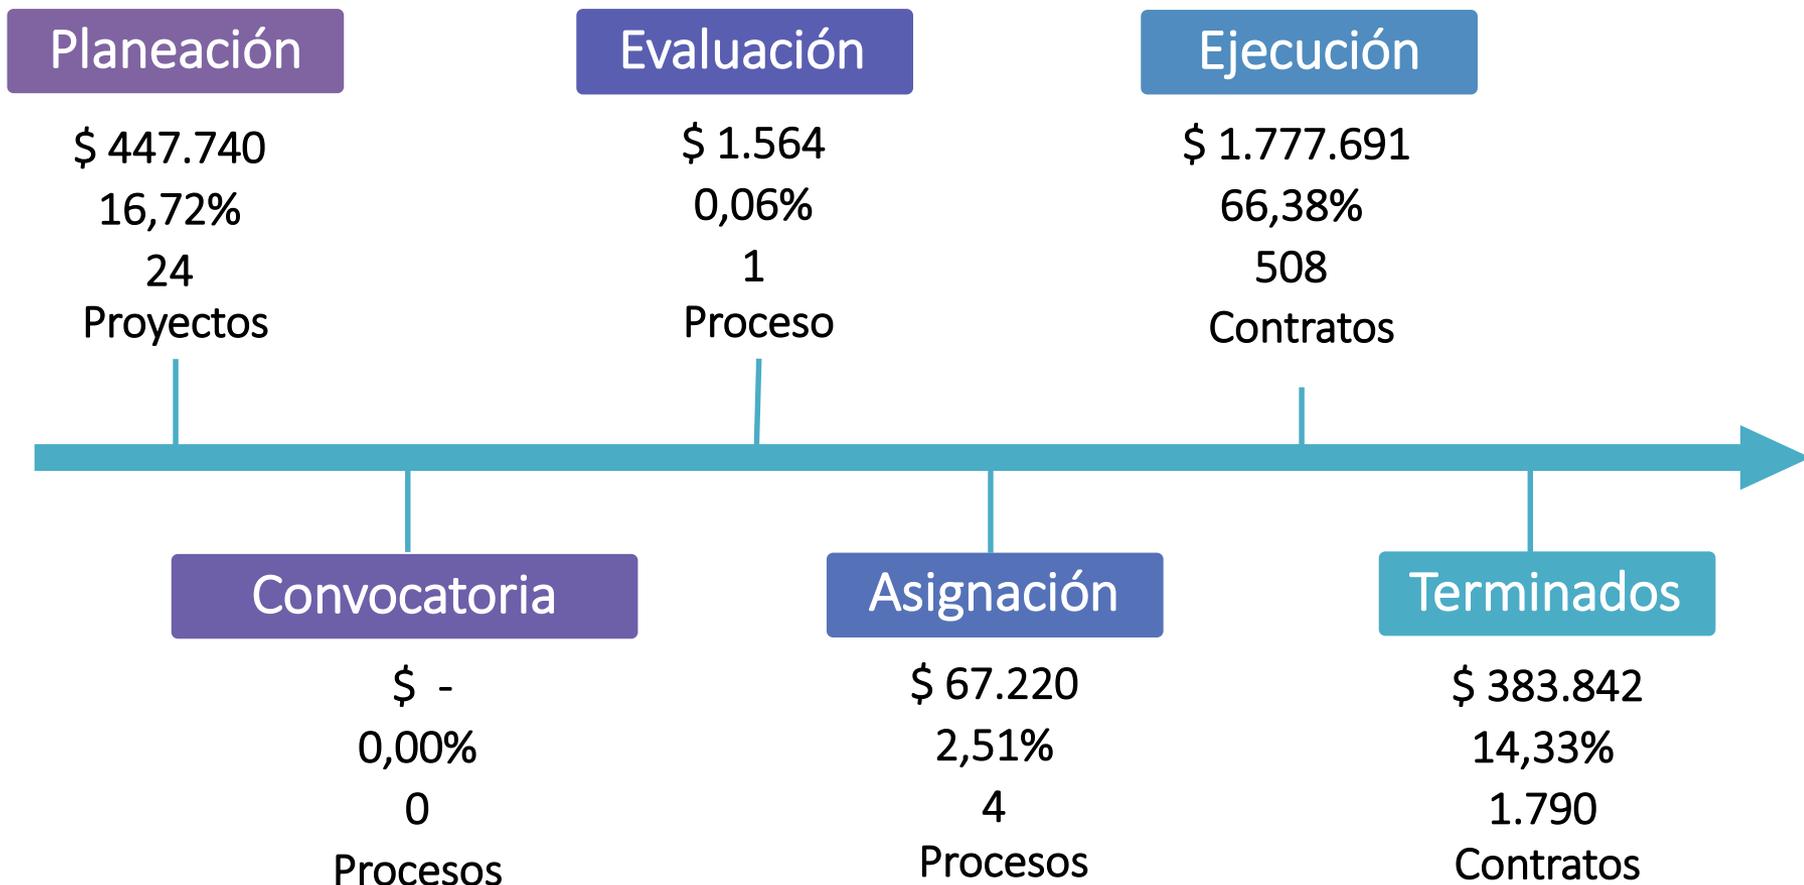



Planeación
\$ 56.505

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.175.571

Terminado
\$ 86.345

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 56.505

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 53.483
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.298
Arrendamiento	\$ 704
Servicio de Almacenamiento Refrigerado	\$ 20

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 1.175.571

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$ 738.956	Nov 2017 Dic 2020	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$325.278	Dic 2017 Jun 2020	98%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	\$ 75.402	Jun 2020 Abr 2021	0%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	Ene 2018 Oct 2020	50%
Prestación de Servicios Persona Natural	167	N/A	\$ 9.866	Feb 2019 May 2021	17%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 9.791	Nov 2017 Oct 2020	77%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	Oct 2019 Oct 2021	33%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	Dic 2019 Dic 2020	6%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 780	Ene 2020 Ago 2020	36%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 724	N/A	57%

\$1.175.571*

92%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a terminación de 38 contratos de OPS, suscripción de 19 contratos de OPS, y pago a familias.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 86.345

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 001	\$ 67.500	dic-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
170 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 6.932	dic-18	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
10 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 514	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$ 50.232

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 1.564

Asignación
\$ 67.220

Ejecución
\$ 171.280

Terminado
\$ 171.989

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 50.232

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 46.394
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	\$ 2.000
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.838





Planeación


Convocatoria

Evaluación
\$ 1.564

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Plataforma Tecnológica	ART	\$ 1.564	<ol style="list-style-type: none"> 1. Software estratégico SAS 2. Consorcio BI-SOFT PDET 3. Linktic S.A.S. 4. Information Workers 	09 de julio de 2020





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 67.220

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Obras Civiles-2 (Grupo3)	ART	Fundación SOCYA	\$ 18.641	07 de julio de 2020
Obras Civiles-3 (Grupo1)	ART	Consorcio M&M FAM	\$ 6.912	07 de julio de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo4)	ART	U.T. Futuro Pazcifico	\$ 11.137	07 de julio de 2020
Obras Civiles-3 (Grupo2)	ART	Consorcio M&M PDET Sur de Bolívar	\$ 9.501	07 de julio de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo8)	ART	Corporación Ayuda Humanitaria	\$ 9.475	07 de julio de 2020
Interventoría (Grupo 3)	ART	Consorcio Bienestar Comunitario	\$ 7.448	07 de julio de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo7)	ART	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	\$ 3.250	07 de julio de 2020
Capacidades Computacionales y de Licenciamiento	ART	Controles Empresariales S.A.S	\$856	07 de julio de 2020





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 171.280

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	Feb20-Suspendido	0%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	Feb20-Suspendido	0%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	Abr20 - May21	0%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	Abr20 - May21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	Feb20-Suspendido	0%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	Feb20-Suspendido	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	Feb20-Suspendido	0%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Feb18-Suspendido	90%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	May18-Suspendido	67%
Prestación de Servicios	203 OPS	N/A	\$11.907	Abr19 - Abr21	34%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	Ene20-Suspendido	0%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	Ene20-Suspendido	2%

\$171.280*

58%

EJECUCIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 171.280

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	Ene19-Suspendido	42%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	Ene19-Suspendido	51%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 5.187	Jul19 – Jul20	60%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 2.104	Oct19 – Jul20	67%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	Ago19 – Ago20	86%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 1.416	N/A	50%
Formulación planes de Turismo	Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.078	Ene20 – Jul20	10%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 984	Ene20 – Ene21	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$440	Jun19 – Jul20	68%

\$171.280*

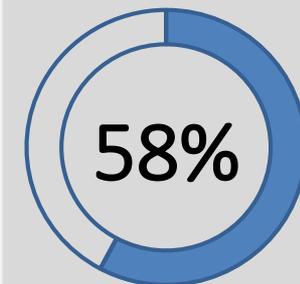

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 171.989

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	feb-19	Liquidado
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	927 OPS	\$22.267	feb-19	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	ene-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	feb-20	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	Jun-20	En proceso de liquidación
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	96 OPS	\$1.188	jul-18	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	nov-19	En proceso de liquidación
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 112.565

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 372.916

Terminado
\$ 39.478

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 112.565


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 110.772
Coordinación de Proyectos Productivos	\$1.500
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	\$ 149
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 144

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 372.916

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 287.723	Sep 2017 Sep 2020	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 30.978	Jun 2018 Sep 2020	99%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 28.554	Sep 2017 Sep 2020	100%
Viveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	\$ 21.287	Abr 2020 Nov 2020	28%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa Colombia	142-19	\$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	94%
Prestación de Servicios	11 OPS	N/A	\$ 725	Ene 2020 Ene 2021	38%
Suscripción AROGIS DESKTOP	ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	Jun 2020 Jun 2021	0%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 31	Feb 2020 Sep 2020	100%

\$372.916*

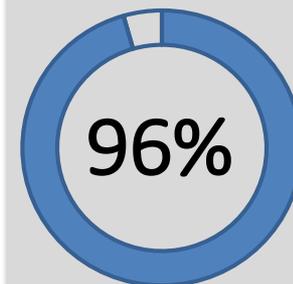

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a pago de BEPS, Pensión, suscripción contrato 163-20, aumento en CDP proyectos productivos y terminación contrato 24-20.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 39.478

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$ 13.902	mar-20	En proceso de liquidación
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$ 12.219	nov-19	En proceso de liquidación
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$4.037	may-19	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	abr-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	\$ 118	feb-20	En proceso de liquidación
Subatours SAS	24-20	\$ 82	Jun 20	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 16.382

Terminado

\$ 27.683

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 16.382

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ago2019 Ago2020	25%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul2019 Mar2022	8%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb2020 Dic2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	2 OPS	N/A	\$ 154	Nov 2018 Sep2020	72%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	Jun 2018 Jun 2020	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$16.382*

69%

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 27.683

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	188 OPS	\$ 7.808	nov-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	49 OPS	\$ 2.901	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	En proceso de liquidación
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$363	oct-19	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 1.801

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 13.037

Terminado

\$ 6.013

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.801

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 1.801

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 13.037

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$ 3.477	Ene 2020 Ago 2020	40%
Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 2.675	Oct 2019 Suspendido	80%
Modalidad Familiar	Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.075	Sep 2019 Ago 2020	62%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Sep 2019 Ago 2020	44%
Modalidad Familiar	Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	Sep 2019 Ago 2020	55%
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.004	Dic 2019 Jul 2020	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	10	N/A	\$691	Ene 2019 Dic 2020	58%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun 2019 Jul 2020	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$65	N/A	53%

\$ 13.037*

68%

EJECUCIÓN

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 6.013

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	<u>540-18</u>	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	<u>782-18</u>	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
33 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.105	feb-19	Liquidado
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 635	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 10

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.837

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 10

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 10

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.837

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
49 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.022	dic-18	En proceso de liquidación
40 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 810	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 5.719

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 18.965

Terminado
\$ 23.517

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación
\$ 5.719

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 5.586
Pólizas	\$ 132

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 18.965

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 4.588	Oct19 – Sep20	58%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 – Sep20	98%
Nómina	Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 4.018	Jun – Dic20	0%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	\$ 964	May19 – Dic20	67%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	372-20	\$ 756	Jul20-Ene21	0%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 607	Nov18 – Sep20	90%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	Dic18 – Dic20	79%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	\$200	Jun19 – Jul20	82%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 251	N/A	90%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 143	May20 – Sep20	0%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 119	May19 – Dic20	51%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	Ene18 – Sep20	62%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 – Dic19	41%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$18	May20 - Jul20	20%
		184-20	\$ 11	Abr20 – N/A	0%
Servicio Difusión de Información	Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	Mar20 – Mar21	100%
	Comunican S.A	99-20	\$ 1	Mar20 – Mar21	100%

\$18.965*

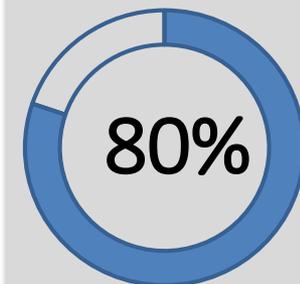

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.

*La variación corresponde a suscripción de contrato 372-20, adición a CDP de asunción de gastos y terminación de los contratos 40, 43, 108 y 255 de 2019



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.517

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	En proceso de liquidación
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.114	Jun-20	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 539	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 83	jun-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,
los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.517

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 34	jun-20	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 23	jun-20	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	\$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,
los valores pueden variar.



Planeación
\$ 4.586

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 6.450

Terminado
\$ 9.483

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 4.586

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 2.741
Helicóptero	\$ 1.700
Contratos de prestación de servicios	\$ 145

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 6.450

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	31 OPS	N/A	\$3.880	Dic 2018 Mar 2021	34%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic 2019 Dic 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun 2019 Jul 2020	25%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 266	N/A	41%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 80	Mar 2020 Mar 2021	24%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 74	N/A	27%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun 2020 Jun 2021	0%

\$ 6.450*

66%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 1 contrato de OPS, suscripción del contrato 296-20 y terminación de 3 OPS.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 9.483

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	24 OPS	\$ 1.631	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	15 OPS	\$ 699	jun-18	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 185.995

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 2.344

Terminado
\$ 11.658

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 185.995

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 183.788
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	\$ 1.120
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 607
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	\$ 480

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.344

Terminados

BID PRÉSTAMO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría	U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	Nov19-Jul20	42%
Prestación de Servicios	8 OPS	N/A	\$ 685	Ene20-Feb21	57%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andres	309-20	\$ 471	Jun20-Feb21	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	Ago19-Jun 20	10%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 37	Ago19-Sep20	100%

\$ 2.344*

54%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 11.658

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	May 2020	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	\$1.438	May 2020	En proceso de Liquidación
44 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$1.198	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	Jun 2020	En proceso de Liquidación

BID PRÉSTAMO





Planeación
\$ 9.176

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 193

Terminado
\$ 280

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 9.176

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	\$ 6.524
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	\$ 1.740
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	\$ 744
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 168

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 193

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$ 71	Ene 2020 Oct 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	Nov 2019	7%
		412-19	\$ 48	Jun 2020	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 23	Ago 2019 Sep 2020	81%

\$ 193

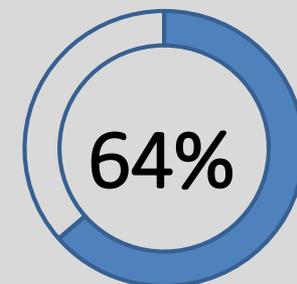

EJECUCIÓN

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 280

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$280	Nov 2019	En proceso de Liquidación

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





Planeación

\$ 21.151

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 552

Terminado

\$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 21.151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 21.151

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 552

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	N/A	\$552	Nov2019 - N/A	100%

\$552



EJECUCIÓN



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





FONDOS MULTIDONANTE PARA EL POSCONFLICTO



Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women´s Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

87.029.345

Total movilizado





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Antropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 61.643.814
Monto de proyectos aprobados (USD):	\$ 14.182.183 con 12 proyectos aprobados
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 57.834.892

Desembolsados al Fondo

USD 3.808.922

Contribuciones pendientes

USD 61.643.814



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 15.402.960	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 14.576.386	
Noruega	USD 17.848.520	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 1.602.025	USD 3.146.303
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 5.000.000	
Suiza	USD 491.592	USD 498.505
Finlandia		USD 164.114
Irlanda	USD 437.096	
Total:	USD 57.834.892	USD 3.808.922

En Comité Técnico del 16 de abril de 2020, se confirmaron recursos del Peace Building Fund (PBF) por USD \$ 4 millones, que habían sido anunciados en el CT del 5 de marzo.



Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2020
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	\$ 6.675.000
Saldo disponible (dólares):	\$ 425.000



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7 Proyectos aprobados

DONANTE	RECURSOS REGISTRADOS
 Banco Mundial	USD 4.000.000
 Suecia	USD 3.100.000
Total	USD7.100.000





Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más.
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.970.034
Presupuesto en ejecución:	€ 73.900.580
Monto Proyectos en fase administrativa*:	34.500.000 (aproximadamente)
Saldo disponible:	7.370.230
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	6.320.677



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 117.855.133

Desembolsados al Fondo

EUR 6.320.677

Contribuciones pendientes

EUR 127.970.034

Total Presupuesto Teórico



Fondo Europeo para la Paz



30

Proyectos en ejecución
por un total de
€ 73.9* millones

Donante	Contribuciones recibidas	Contribuciones pendientes
Alemania	EUR 3.000.000	EUR 3.000.000
Chipre	EUR 10.000	
Comisión Europea	EUR 91.890.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 3.000.000	
Francia	EUR 2.400.000	EUR 600.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungría	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 2.250.000	EUR 750.000
Italia	EUR 4.000.000	EUR 1.000.000
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 36.000	
Luxemburgo	EUR 40.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 30.000	
Suecia	EUR 2.146.323	EUR 970,667
Chile	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Finlandia	EUR 150.000	
<u>Bank interests</u>	EUR 775,62	
Total:	EUR 117.855.133	EUR 6,320,667



Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$12,894,399



BID Colombia
Sostenible

USD 19.658.355

*Contribuciones correspondientes al
POA 2018*

USD 12.000.000

*Contribuciones correspondientes al
POA 2019*

USD 250.000.000

*Presupuesto máximo para el pago
por resultados en los diez años de
vigencia del acuerdo con donantes*





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
 Suiza	USD 3.000.000	N/A
TOTAL	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ



**Fondo Colombia Sostenible
POA 2019**

Líneas de inversión del POA 2019	Presupuesto en USD
Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación	\$2,710,000
Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación	\$9,095,000
Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques	\$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC	\$420,000
Total presupuesto POA 2019	\$17,045,000
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos	\$183,209
Total disponible para POA 2019	\$17,228,209

FONDOS MULTIDONANTE PARA EL POSCONFLICTO





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz
