



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

07 al 11 de septiembre de 2020



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas

	Reincorporación		Jurisdicción Especial de Paz		Estabilización
	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial		Agencia Nacional de Tierras		Funcionamiento
	Primera infancia		Colombia Sostenible		Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Sustitución		Sociedad de Activos Especiales		Herencia Colombia
	BID Préstamo		BID Facilidad		Agencia Nacional de Tierras 2019
	KFW		AFD		



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.683.665	\$ 2.643.901	\$ 39.764
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.331.140	\$ 2.308.913	\$ 22.227
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.951.289	\$ 1.937.108	\$ 14.181

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$4.249 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$168 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$5,609.



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.318.421	\$ 1.307.081	99%	\$ 11.340	1%
Reincorporación	\$ 524.959	\$ 437.689	83%	\$ 87.270	17%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 462.285	\$ 423.078	92%	\$ 39.206	8%
BID Préstamo	\$ 199.998	\$ 17.165	9%	\$ 182.833	91%
Funcionamiento	\$ 48.201	\$ 45.829	95%	\$ 2.371	5%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.937	100%	\$ 128	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 1.044	5%	\$ 20.659	95%
Primera Infancia	\$ 20.852	\$ 20.494	98%	\$ 358	2%
Estabilización	\$ 20.519	\$ 19.118	93%	\$ 1.400	7%
BID Facilidad	\$ 9.650	\$ 8.331	86%	\$ 1.319	14%
KFW	\$ 5.609	\$ 0	0%	\$ 5.609	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.817	99%	\$ 30	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.683.665	\$ 2.331.140	87%	\$ 352.525	13%


Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.





Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.307.081	\$ 1.200.983	92%	\$ 106.098	8%
Reincorporación	\$ 437.689	\$ 424.024	97%	\$ 13.665	3%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 423.078	\$ 209.158	49%	\$ 213.920	51%
Funcionamiento	\$ 45.829	\$ 37.196	81%	\$ 8.634	19%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.937	\$ 33.145	75%	\$ 10.792	25%
Primera Infancia	\$ 20.494	\$ 16.461	80%	\$ 4.033	20%
Estabilización	\$ 19.118	\$ 11.317	59%	\$ 7.801	41%
BID Préstamo	\$ 17.165	\$ 10.293	60%	\$ 6.872	40%
BID Facilidad	\$ 8.331	\$ 307	4%	\$ 8.024	96%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.817	\$ 2.804	100%	\$ 13	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 1.044	\$ 1.044	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.331.140	\$ 1.951.289	84%	\$ 379.851	16%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.





Línea del Tiempo

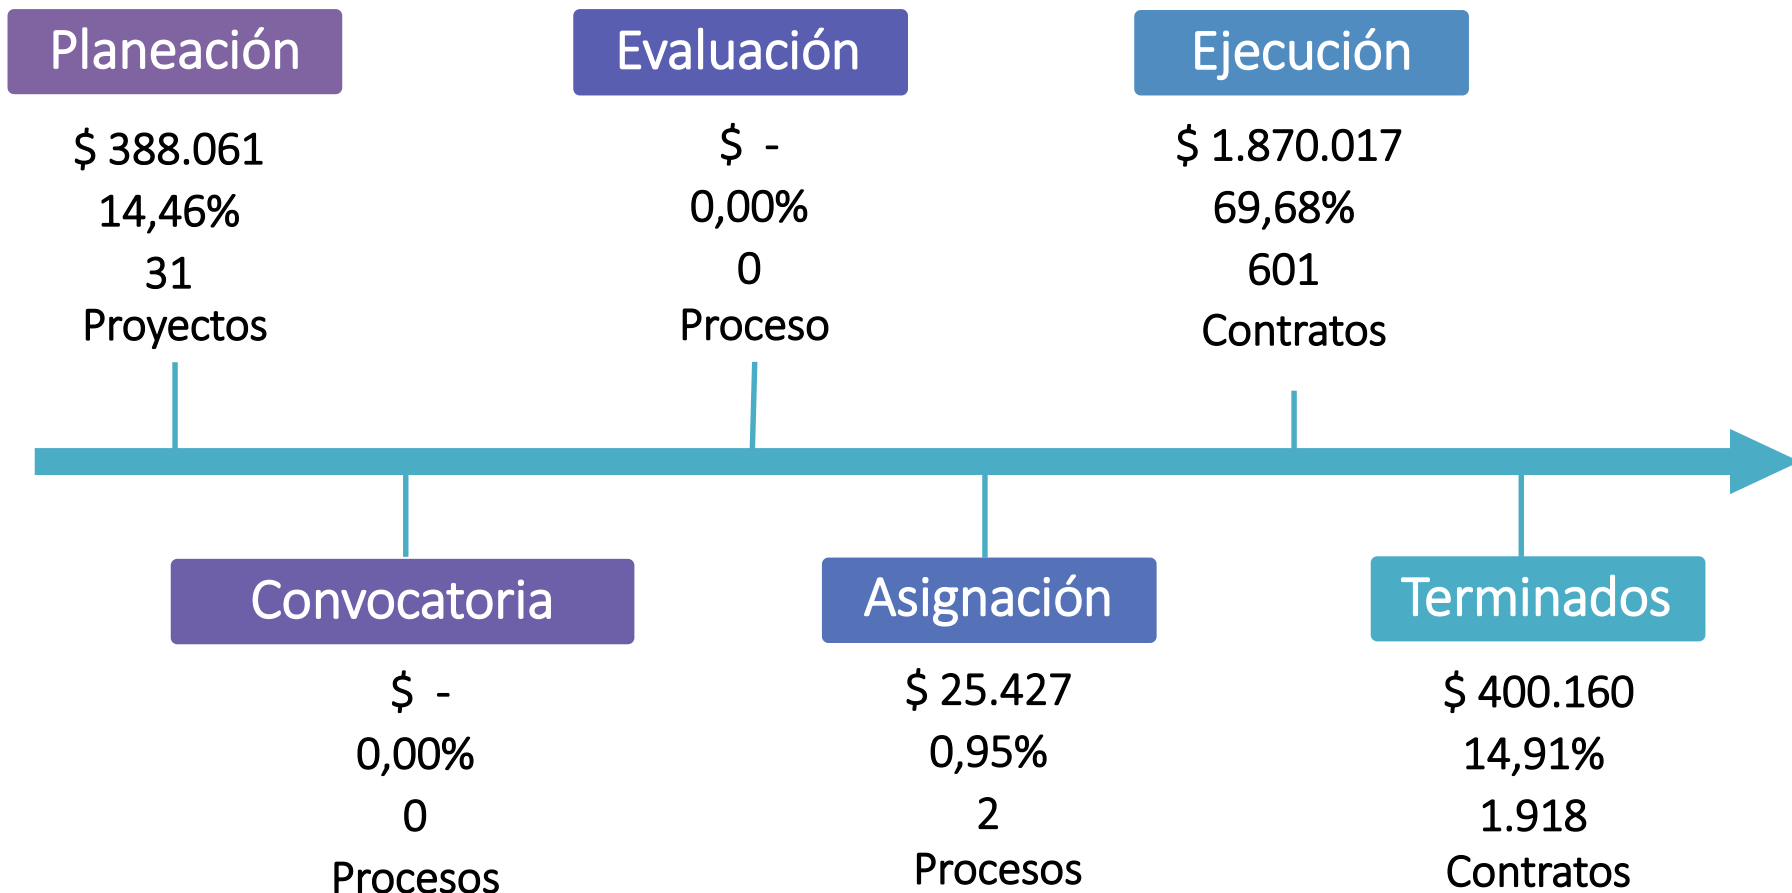



Planeación

\$ 24.185

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 1.206.337

Terminado

\$ 87.899

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 24.185

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Asistencia Alimentaria	\$ 12.304
Por asignar	\$ 11.340
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 540

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.206.337

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$ 764.305	Nov17-Dic20	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$325.278	Nov17-Dic20	98%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	\$ 75.402	Jun20-Abr21	20%
Prestación de Servicios Persona Natural	203 OPS	N/A	\$ 12.797	Feb19-Sep21	23%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 11.554	Nov17-Oct20	65%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	Ene18-Oct20	71%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	Oct19-Oct21	42%
		411-20	\$ 704	Ago20-Oct21	0%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	Dic19-Dic20	6%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 780	Ene20-Oct20	36%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 724	N/A	60%
Servicio de Almacenamiento Refrigerado	Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 20	Jun20-Oct20	0%

\$1.206.337*

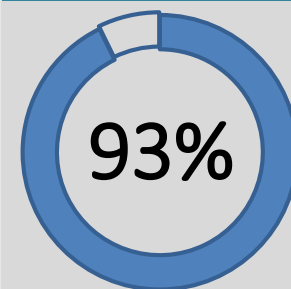

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pagos de asistencia alimentaria y suscripción de 8 contratos de OPS,



GOBIERNO DE COLOMBIA



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

SUSTITUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 87.899

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 001	\$ 67.500	dic-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
186 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 7.410	dic-18	En proceso de liquidación
34 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.589	dic-18	Liquidado
Ecomún	771-18	\$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 44.973

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ 25.427

Ejecución

\$ 214.391

Terminado

\$ 177.495

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 44.973

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 39.206
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.660
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	\$ 2.000
Transporte Terrestre - Adición Transportes Especializados JR SAS	\$ 1.052
Obras Civiles	\$ 54





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 25.427

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Obras Civiles-2 (Grupo4)	ART	U.T. Futuro Pazcifico	\$ 11.137	17 de septiembre de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo8)	ART	Corporación Ayuda Humanitaria	\$ 9.475	17 de septiembre de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo7)	ART	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	\$ 3.250	17 de septiembre de 2020
Plataforma Tecnológica	ART	Software estratégico SAS	\$ 1.564	17 de septiembre de 2020



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 214.391

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	Feb20 – Mar21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	Jul20 – Ago21	0%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	Feb20-Suspendido	0%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	Abr20 – May21	0%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	Abr20 – May21	0%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	Jul20 – Ago21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	Feb20-Suspendido	0%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	Jul20 – Ago21	0%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	Feb20 – Mar21	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	Feb20 – Mar21	0%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Feb18 – Suspendido	90%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	May18– Suspendido	92%

\$214.391*

53%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 214.391

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	243 OPS	N/A	\$13.858	Abr19 - Jul21	27%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	Ene20 – Abr21	0%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	Jul20 – Oct21	0%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	Ene20- Suspendido	4%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	Ene19- Suspendido	42%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	Ene19- Suspendido	63%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 5.187	Jul19 – Dic20	60%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 2.104	Oct19 – Feb21	77%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 1.416	N/A	51%
Formulación planes de Turismo	Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.078	Ene20 – Oct20	10%

\$214.391*

53%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 214.391

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 984	Ene20 – Ene21	0%
Capacidades Computacionales y de Licenciamiento	Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	Jul20 – Oct20	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$440	Jun19 –Ene21	68%

\$214.391*

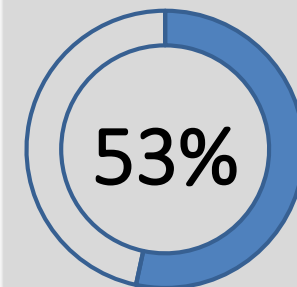

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 177.495

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	964 OPS	\$25.301	feb-19	En proceso de liquidación
Consortio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	mar-20	En proceso de liquidación
Consortio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	ene-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	dic-19	En proceso de liquidación
Consortio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	dic-19	En proceso de liquidación
Consortio Chocó 2017	539-18	\$5.588	feb-20	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	Jun-20	En proceso de liquidación
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	Ago-20	En proceso de liquidación
Consortio Edificando Paz	535-18	\$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	124 OPS	\$1.744	jul-18	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	nov-19	En proceso de liquidación
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



GOBIERNO DE COLOMBIA



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ 90.896

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 391.083

Terminado

\$ 42.980

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 90.896

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 87.270
Convenio Innpulsa	\$ 2.060
Coordinación de Proyectos Productivos	\$ 1.500
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 66

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 391.083

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 306.848	Sep 2017 Sep 2020	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 32.802	Jun 2018 Sep 2020	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 29.039	Sep 2017 Sep 2020	100%
Viveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	\$ 21.287	Abr 2020 Nov 2020	57%
Prestación de Servicios	14 OPS	N/A	\$ 833	Ene 2020 Ene 2021	54%
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 149	Jul 2020 Dic 2020	0%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 83	Feb 2020 Sep 2020	72%
Suscripción AROGIS DESKTOP	ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	Jun 2020 Jun 2021	0%

\$391.083*

98%

EJECUCIÓN

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 42.980

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$ 13.902	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$ 12.219	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 3.576	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	jun-18	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	abr-20	Liquidado
Subatours SAS	24-20	\$ 82	Jun 20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	\$ 36	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	\$ 7	feb-20	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 128

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 16.297

Terminado
\$ 27.640

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 128

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 128

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 16.297

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ago2019 Nov2020	40%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul2019 Mar2022	31%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb2020 Dic2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 OPS	N/A	\$ 69	Nov 2018 Sep2020	82%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	Jun 2018 Jun 2020	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$16.297*

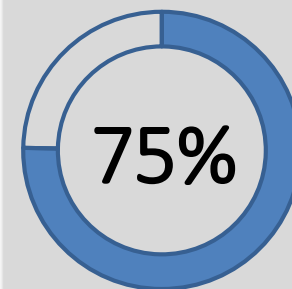

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 27.640

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	225 OPS	\$ 9.799	nov-18	Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	13 OPS	\$ 868	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$363	oct-19	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 358

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 10.689

Terminado

\$ 9.805

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 358

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 358

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 10.689

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$ 3.877	Ene 2020 Nov 2020	81%
Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 3.074	Oct 2019 Nov 2020	70%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Sep 2019 Dic 2020	71%
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.404	Dic 2019 Nov 2020	57%
Prestación de Servicios Persona Natural	12 OPS	N/A	\$609	Ene 2019 Feb 2021	34%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun 2019 Ene 2021	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$65	N/A	55%

\$ 10.689

80%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 9.805

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.075	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
33 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.105	feb-19	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
16 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 960	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 30

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.817

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 30

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 30

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.817

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
62 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.841	jul-18	Liquidado
27 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 971	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



GOBIERNO DE COLOMBIA



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ 5.452

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 19.233

Terminado

\$ 23.516

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación
\$ 5.452

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Adición contrato de Fiducia	\$ 3.057
Por asignar Funcionamiento	\$ 2.371
Adecuaciones	\$ 24
Pólizas	\$ 0,46

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 19.233

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 4.588	Oct19 – Sep20	75%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 – Sep20	99%
Nómina	Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 4.018	Jun – Dic20	33%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	\$ 964	May19 – Dic20	87%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	372-20	\$ 756	Jul20-Ene21	0%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 649	Nov18 – Sep20	94%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	Dic18 – Dic20	89%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 356	N/A	88%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	\$200	Jun19 – Ago20	82%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 143	May20 – Sep20	0%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 126	Jul20 – Jul21	100%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 119	May19 – Dic20	77%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	Ene18 – Sep20	69%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 – Dic20	41%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$18	May20 - Oct20	35%
Póliza	Equidad Seguros	N/A	\$ 6	Jun20 – Jun21	100%
Servicio Difusión de Información	Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	Mar20 – Mar21	100%
	Comunican S.A	99-20	\$ 1	Mar20 – Mar21	100%

\$19.233*

87%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.516

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	En proceso de liquidación
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.114	Jun-20	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 539	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerisis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 83	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.516

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 23	jun-20	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	\$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.A.S.	60-19	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 2.070

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 8.564

Terminado

\$ 9.884

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 2.070

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 1.400
Contratos de prestación de servicios	\$ 670

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 8.564

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	35 OPS	N/A	\$4.294	Dic 2018 Ago 2021	40%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic 2019 Dic 2020	3%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$1.700	Jul 2020 Jul 2021	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun 2019 Ene 2021	25%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 266	N/A	45%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 80	Mar 2020 Mar 2021	41%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 74	N/A	27%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun 2020 Jun 2021	0%

\$ 8.564*

61%

EJECUCIÓN

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 9.884

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	27 OPS	\$ 1.993	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	16 OPS	\$ 738	jun-18	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$ 184.524

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 2.186

Terminado
\$ 13.288

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 184.524

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 182.833
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	\$ 1.120
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	\$ 480
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 56
Portal WEB	\$ 35

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 2.186

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	11 OPS	N/A	\$ 1.580	Ene20-Abr21	5%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	\$ 471	Jun20-Feb21	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	Ago19-Jun21	10%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 37	Ago19-Sep20	100%
Publicidad	Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	Ago20-Sep20	0%

\$ 2.186

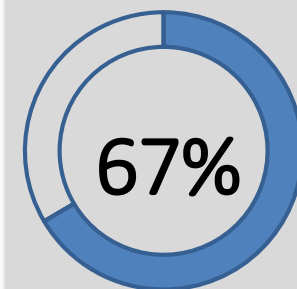

EJECUCIÓN

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 13.288

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	May 2020	En proceso de Liquidación
48 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$1.703	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	\$1.438	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	Jul 2020	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	Jun 2020	En proceso de Liquidación
3 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 65	Oct 2019	Liquidado

BID PRÉSTAMO





Planeación
\$ 9.176

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 193

Terminado
\$ 280

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 9.176

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	\$ 5.205
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	\$ 1.740
Por asignar BID Facilidad	\$ 1.319
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	\$ 744
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 168

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 193

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1 OPS	N/A	\$ 71	Ene 2020 Oct 2020	5%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	Nov 2019	7%
		412-19	\$ 48	Jun 2020	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 23	Ago 2019 Sep 2020	81%

\$ 193

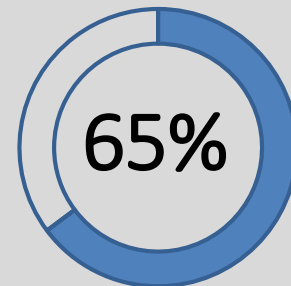

EJECUCIÓN

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 280

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$280	Nov 2019	En proceso de Liquidación

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





Planeación

\$ 20.659

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 1.044

Terminado

\$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 20.659

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 20.659

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 1.044

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 1.044	Nov2019 - N/A	100%

\$1.044

100%

EJECUCIÓN



Planeación
\$ 5.609

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





Planeación
\$ 5.609

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	\$ 5.609

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

87.029.345

Total movilizado



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 62.117.067
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 58.511.673

Desembolsados al Fondo

USD 3.605.394

Contribuciones pendientes





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
 Reino Unido	USD 15.402.960	
 Chile	USD 100.000	
 Alemania	USD 14.576.386	
 Noruega	USD 17.848.520	
 Corea	USD 500.000	
 Suecia	USD 1.602.025	USD 3.146.303
 Canadá	USD 1.876.313	
 Fondo Consolidación de la Paz	USD 5.000.000	
 Suiza	USD 1.005.620	
 Finlandia	USD 162.753	
 Irlanda	USD 437.096	USD 459.091
Total:	USD 58.511.673	USD 3.605.394

Nota: Irlanda firmó un compromiso por USD \$ 459.091, que aún no ha sido depositado.



Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2020
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	\$ 7.100.000
Saldo disponible (dólares):	0



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7

Proyectos
aprobados

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS
	Banco Mundial	USD 4.000.000
	Suecia	USD 3.100.000
Total		USD 7.100.000





Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (julio/2020).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.924.129
Presupuesto en ejecución:	€89.287.112
Monto Proyectos en fase administrativa*:	19.316.000 (estimado)
Saldo disponible:	11.316.350 (real) - 17.637.017 (teórico)
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	1.470.000



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 121.603.462

Desembolsados al Fondo

EUR 6.320.667

Contribuciones Pendientes

EUR 127.924.129

Total Presupuesto Teórico





Fondo Europeo para la Paz



30

Proyectos en ejecución

Total €92.2* millones

DONANTE	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	COTRIBUCIONES PENDIENTES
Alemania	6.000.000 €	
Austria	10.000 €	
Chipre	10.000 €	
Comisión Europea	91.890.000 €	
Croacia	20.000 €	
ECHO - UE	2.000.000 €	
Eslovaquia	20.000 €	
Eslovenia	12.000 €	
España	3.000.000 €	3.000.000 €
Finlandia	150.000 €	
Francia	2.400.000 €	600.000 €
Holanda	5.000.000 €	
Hungría	20.000 €	
Irlanda	2.250.000 €	750.000 €
Italia	4.000.000 €	1.000.000 €
Letonia	10.000 €	
Lituania	46.000 €	
Luxemburgo	35.000 €	
Malta	10.000 €	
Portugal	200.000 €	
Reino Unido	1.510.000 €	
República Checa	40.000 €	
Suecia	2.880.000 €	970.667 €
Total Estados Miembro:	121.513.000 €	
Bank Interest	775,62 €	
Chile	89.686 €	
GRAN TOTAL	121.603.462 €	6.320.667 €





Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$12,894,399



BID Colombia
Sostenible

USD 19.658.355

*Contribuciones correspondientes al
POA 2018*

USD 12.000.000

*Contribuciones correspondientes al
POA 2019*

USD 250.000.000

*Presupuesto máximo para el pago
por resultados en los diez años de
vigencia del acuerdo con donantes*





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

 BID Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
 Suiza	USD 3.000.000	N/A
TOTAL	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ



Fondo Colombia Sostenible POA 2019

Líneas de inversión del POA 2019	Presupuesto en USD
Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación	\$2,710,000
Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación	\$9,095,000
Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques	\$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC	\$420,000
Total presupuesto POA 2019	\$17,045,000
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos	\$183,209
Total disponible para POA 2019	\$17,228,209





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



GOBIERNO DE COLOMBIA
