



Fondo Colombia  
en Paz - **FCP**



COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

# **Informe semanal 310**

**11 al 15 de marzo de 2024**



# Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP y CRP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o actividades que ya cuentan con respaldo presupuestal.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**En trámite:** Corresponde a los contratos y/o actividades en proceso de perfeccionamiento que no están vinculadas a convocatorias.

# Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

**Evaluación del proceso contractual:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Adjudicación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

# Subcuentas Administradas



Reincorporación



Programas de Desarrollo  
con Enfoque Territorial



Primera infancia ICBF



Sustitución



BID Préstamo



KFW



Niñez y Adolescencia ICBF



Jurisdicción Especial de  
Paz



Agencia Nacional de Tierras



Colombia Sostenible



Sociedad de Activos  
Especiales



BID Facilidad



AFD



Zona ZEII Catatumbo



Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Implementación



Funcionamiento



Ambiente y Desarrollo  
Sostenible



Herencia Colombia



Agencia Nacional de  
Tierras 2019



Visión Amazonía



Catastro Multipropósito

## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (*)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 8.532.553	\$ 7.611.305	\$ 921.248
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 6.130.541	\$ 5.543.221	\$ 587.320
TOTAL EJECUTADO	\$ 4.533.500	\$ 4.467.166	\$ 66.334


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* Aporte de \$3.500 del Convenio 550 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$6.131 de Cenit / Capitalización de Rendimientos por \$7.027 / Otros ingresos Funcionamiento por \$202 / Aporte BID Facilidad por \$23.588 / Otros ingresos - Sustitución por \$6.129 / Otros ingresos - Reincorporación por \$23 /Otros ingresos PDET por \$10 / Aporte KFW \$53.447/ Convenios Fondo Paz \$71.918/ Convenio Visión Amazonía \$8.374./ Convenio AFD \$1.892./ Otros ingresos MADS \$37/ Convenio 1217 ANT \$645.000 / Convenio 1231 IGAC \$80.435 / Convenio 1430 ART-KFW \$13.536

NO incluye valor de contrapartidas.

# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal


Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 3.329.914	\$ 2.326.277	70%	\$ 1.003.637	30%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 1.577.636	\$ 902.541	57%	\$ 675.096	43%
Reincorporación	\$ 1.550.350	\$ 1.388.356	90%	\$ 161.994	10%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 835.711	\$ 600.748	72%	\$ 234.963	28%
BID Préstamo	\$ 375.565	\$ 338.391	90%	\$ 37.174	10%
Funcionamiento	\$ 166.357	\$ 121.644	73%	\$ 44.713	27%
Catastro Multipropósito	\$ 166.082	\$ 71.131	43%	\$ 94.951	57%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 116.293	\$ 114.916	99%	\$ 1.377	1%
Niñez y Adolescencia ICBF	\$ 90.006	\$ 31.710	35%	\$ 58.296	65%
Implementación	\$ 79.322	\$ 53.076	67%	\$ 26.246	33%
Primera Infancia ICBF	\$ 67.879	\$ 28.817	42%	\$ 39.062	58%
KFW	\$ 67.138	\$ 44.441	66%	\$ 22.697	34%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.906	99,6%	\$ 159	0,4%
BID Facilidad	\$ 23.644	\$ 22.772	96%	\$ 871	4%
Herencia Colombia	\$ 23.245	\$ 22.969	99%	\$ 276	1%
Visión Amazonía	\$ 8.374	\$ 8.309	99%	\$ 64	1%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.804	98%	\$ 43	2%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.895	\$ 1.501	79%	\$ 393	21%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 1.354	\$ 1.354	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 320	\$ 320	100%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.532.553</b>	<b>\$ 6.130.541</b>	<b>72%</b>	<b>\$ 2.402.012</b>	<b>28%</b>

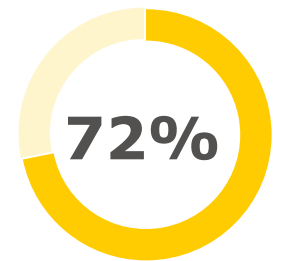

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal. NO incluye valor de contrapartidas.


# Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.326.277	\$ 2.100.592	90%	\$ 225.686	10%
Reincorporación	\$ 1.388.356	\$ 1.093.876	79%	\$ 294.480	21%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 902.541	\$ 579.360	64%	\$ 323.180	36%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 600.748	\$ 58.624	10%	\$ 542.124	90%
BID Préstamo	\$ 338.391	\$ 287.757	85%	\$ 50.633	15%
Funcionamiento	\$ 121.644	\$ 105.090	86%	\$ 16.554	14%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 114.916	\$ 96.403	84%	\$ 18.513	16%
Catastro Multipropósito	\$ 71.131	\$ 13.156	18,5%	\$ 57.975	81,5%
Implementación	\$ 53.076	\$ 43.569	82%	\$ 9.507	18%
KFW	\$ 44.441	\$ 9.763	22%	\$ 34.678	78%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.906	\$ 43.906	100%	\$ 0	0%
Niñez y Adolescencia ICBF	\$ 31.710	\$ 24.366	77%	\$ 7.343	23%
Primera Infancia ICBF	\$ 28.817	\$ 27.670	96%	\$ 1.147	4%
Herencia Colombia	\$ 22.969	\$ 12.050	52%	\$ 10.918	48%
BID Facilidad	\$ 22.772	\$ 19.533	86%	\$ 3.240	14%
Visión Amazonía	\$ 8.309	\$ 7.365	89%	\$ 944	11%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.804	\$ 2.804	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.501	\$ 1.501	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 1.354	\$ 1.236	91%	\$ 117	9%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 320	\$ 320	100%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.130.541</b>	<b>\$ 4.533.500</b>	<b>74%</b>	<b>\$ 1.597.041</b>	<b>26%</b>

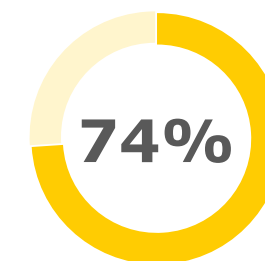



# Línea del Tiempo

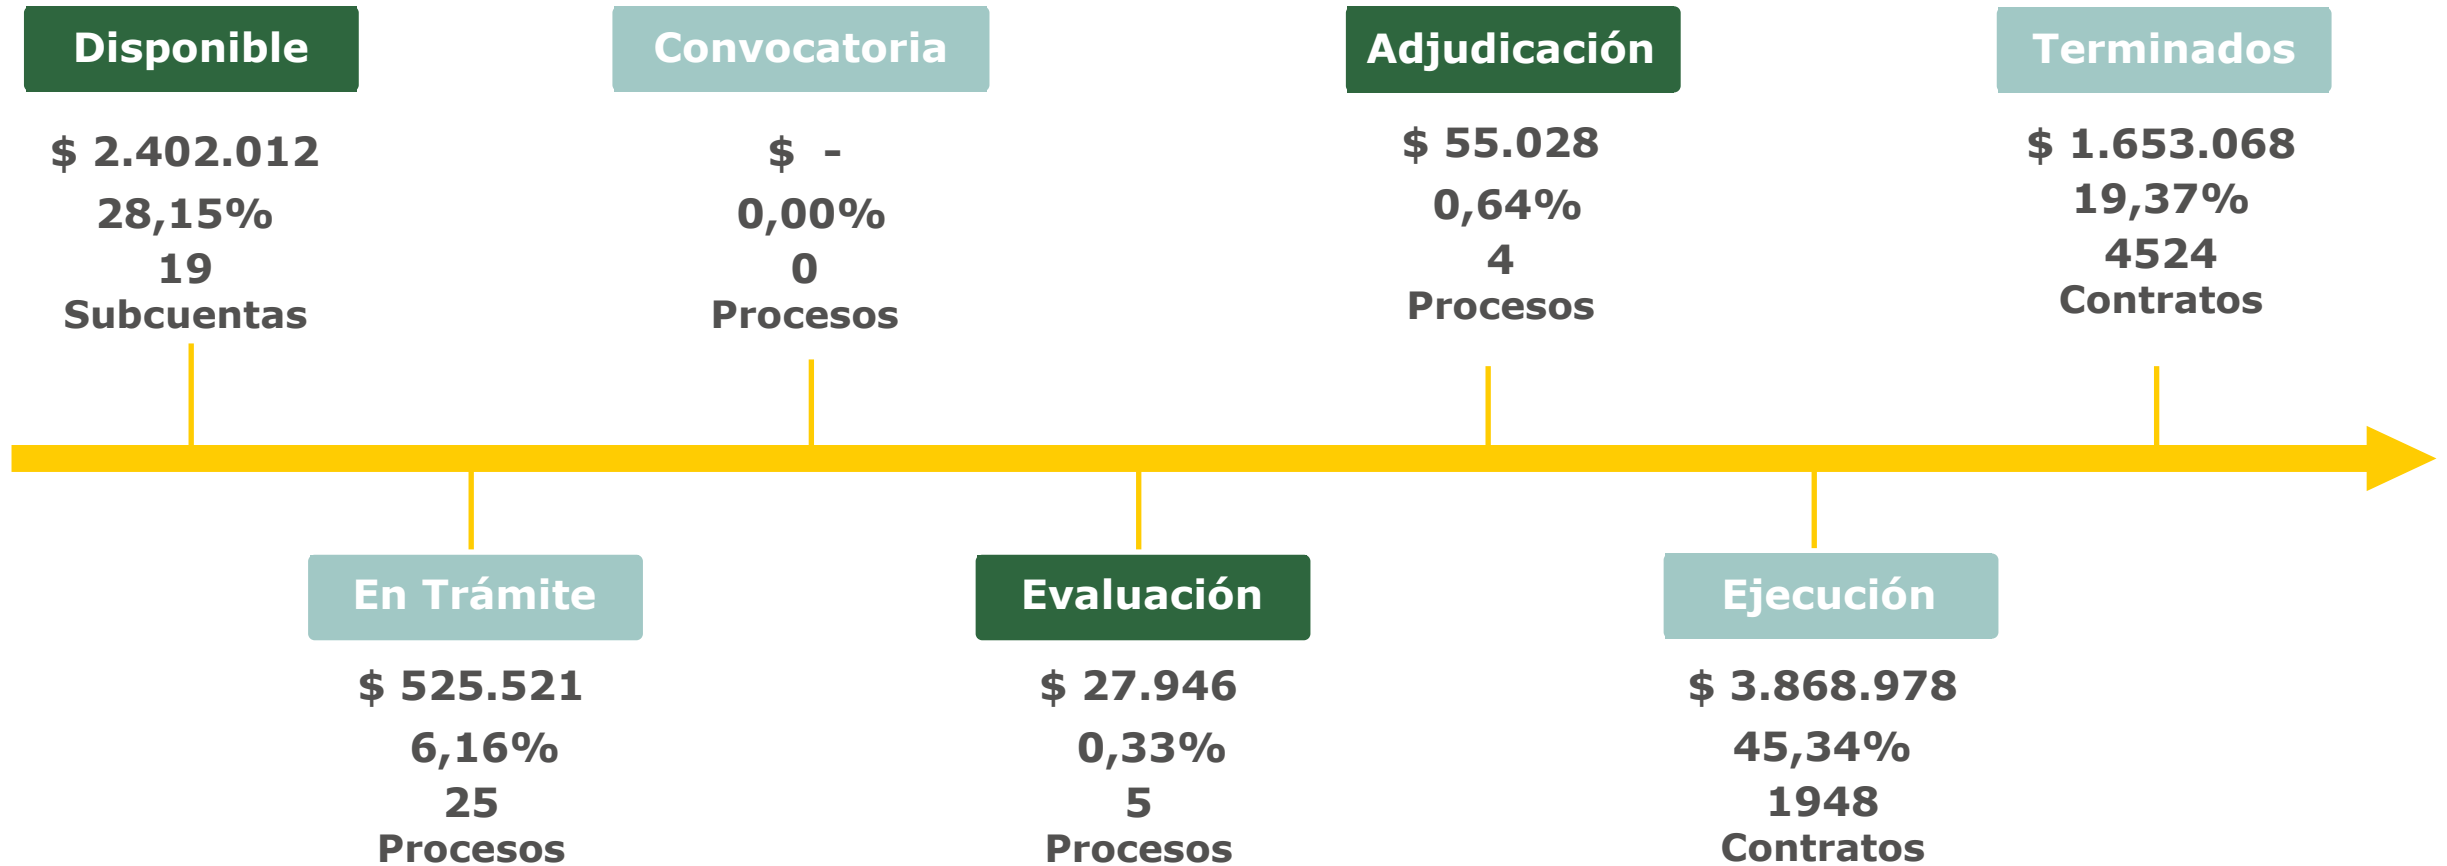



# Sustitución

## (4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto



# Sustitución



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Sustitución	\$1.003.637

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 3.978
Defensa judicial	\$ 268
Servicio de transporte terrestre	\$ 259

# Sustitución



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$1.035.352	Nov17 - Jun24	99,9%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	UNODC	1092-21	\$ 157.898	Ene22 - Sep24	90%
	Fupad Colombia	1041-21	\$ 136.554	Dic21 - Dic23	90%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	\$ 21.849	Jul21 - Dic23	85%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	\$ 15.066	Jul21 - Sep23	70%
Servicios Persona Natural	467 CPS	N/A	\$ 31.468	Oct21 - Feb25	69%
Operador Logístico	Consorcio construyendo proyectos sostenibles	364-22	\$ 24.573	Jul22 - Oct23	10%
	Consorcio desarrollo rural zona 3	375-22	\$ 30.693	Jun22 - Sep23	90%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 19 CPS; a la adición a los CDP de asistencia alimentaria y viáticos y de 4 contratos para defensa judicial; y a la terminación de 1 CPS y del contrato 443-21

# Sustitución



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Consorcio productivo Caquetá 4	377-22	\$ 28.919	Jun22 - Sep23	90%
	Consorcio familias productivas por la paz 2022	402-22	\$ 20.520	Sep22 - Ene24	30%
	Corporación para impulsar el desarrollo ambiental "CIDMAG"	404-22	\$ 17.539	Ago22 - Nov23	10%
	UT Caquetá avanza	403-22	\$ 13.456	Ago22 - Nov23	90%
	Imagroup Colombia S.A.S.	835-23	\$ 7.459	Jul23 - Ene25	24%
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	DCO Ingeniería & Servicios SAS	371-22	\$10.258	May22 - Feb24	82%
	DCO Ingeniería & Servicios SAS	372-22	\$ 8.898	Jun22 - Ene24	74%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 8.696	Sep21 - Sep23	70%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 5.241	Jul21 - Sep23	10%



# Sustitución



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Arrendamientos	Situando S.A.S.	583-23	\$ 9.136	Abr23 - Abr26	22%
		664-23	\$ 8.913	Jun23 - Jun25	32%
		1426-23	\$ 1.190	Ene24 - May26	0%
Transporte Público Terrestre	UT Dapre OS 2022	354-22	\$ 4.033	Abr22 - Dic23	96%
	Transportes Especiales JR S.A.S.	1383-23	\$ 631	Feb24 - Feb25	0%
		1384-23	\$ 465	Feb24 - Feb25	0%
	Transportes Especiales ACAR S.A.S.	1393-23	\$ 453	Feb24 - Feb25	0%
	Unión Temporal UG 2023	106-24	\$ 414	Feb24 - Feb25	0%
	Transportes Especiales Nueva Era S.A.	1364-23	\$ 358	Ene24 - Ene25	0%
1363-23		\$ 350	Ene24 - Ene25	0%	



# Sustitución



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Transporte Público Terrestre	Services V&M S.A.S. ZOMAC	1382-23	\$ 248	Ene24 - Ene25	4%
	Servicio especial de transporte escolar y de turismo S.A.S.	1381-23	\$ 248	Ene24 - Ene25	0%
	Transportes Especiales A&S S.A.S.	1385-23	\$ 246	Feb24 - Feb25	0%
	Unión Temporal UG 2023	105-24	\$ 244	Feb24 - Feb25	0%
	Unión temporal Colombia en Paz AC - SANANDANTE	51-24	\$ 241	Ene24 - Ene25	0%
	Unión Temporal Paz PEV 2023	55-24	\$ 239	Feb24 - Feb25	0%
		54-24	\$ 234	Mar24 - Mar25	0%
	Transportes Especiales ACAR S.A.S.	1392-23	\$ 184	Mar24 - Dic24	0%
Transportes Especiales Golden S.A.S. BIC	773-23	\$ 107	Sep23 - Mar24	55%	
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 4.617	N/A	87%
Tiquetes aéreos	Subatours S.A.S.	699-23	\$ 1.800	Jun23 - Jun24	29%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 19 CPS; a la adición a los CDP de asistencia alimentaria y viáticos y de 4 contratos para defensa judicial; y a la terminación de 1 CPS y del contrato 443-21

# Sustitución



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
ARL	N/A	N/A	\$ 1.583	N/A	27%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ016	\$ 77	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ017	\$ 77	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ003	\$ 46	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ002	\$ 35	Indeterminado	0%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 19 CPS; a la adición a los CDP de asistencia alimentaria y viáticos y de 4 contratos para defensa judicial; y a la terminación de 1 CPS y del contrato 443-21



# Sustitución



Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF002	\$309.350	Dic-20	Liquidado
-OEI-	262-20	\$ 89.169	Nov-21	En proceso de liquidación
-OEI-	1091-21	\$ 47.634	Oct-23	En proceso de liquidación
UNODC	AF001	\$ 67.177	Dic-19	Liquidado
642 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 33.554	Dic-17	Liquidado
Unión temporal selva social	373-22	\$ 31.145	Sep-23	En proceso de liquidación
Consorcio Meta incluyente	405-22	\$ 23.283	Nov-23	En proceso de liquidación
337 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 21.088	Ago-19	En proceso de liquidación
Consorcio Amazonía 2021	290-21	\$ 18.098	Oct-23	Liquidado
Fedecacao	123-17	\$ 11.554	May-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 8.899	Nov-20	Liquidado
Situando SAS	927-21	\$ 7.017	Jun-23	Liquidado
Unión Temporal para la Paz 2022	359-22	\$ 4.882	Ago-23	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 4.850	Sep-19	Liquidado
Consorcio construyendo proyectos PNIS	365-22	\$ 4.744	Oct-23	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 711.164

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 4.574	Mar-23	En proceso de liquidación
Consorcio grupo Max de Orinoquía	366-22	\$ 4.152	Sep-23	En proceso de liquidación
COFESCO	896-20	\$ 3.876	Jun-22	En proceso de liquidación
Publica S.A.S.	984-21	\$ 3.517	Jul-23	Liquidado
Situando SAS	928-21	\$ 3.046	Abr-23	Liquidado
Situando SAS	254-19	\$ 3.001	Oct-21	Liquidado
AS Transportes	28-21	\$ 2.383	Abr22	Liquidado
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 992	Ene-21	Liquidado
Festival Tours S.A.S	470-19	\$ 804	Dic-22	Liquidado
Ecomún	771-18	\$ 871	Oct-19	Liquidado
Situando SAS	411-20	\$ 706	Oct-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 682	Dic-18	Liquidado
Viaja por el Mundo WEB/NICKISIX360 S.A.S.	504-23	\$ 96	May-23	Liquidado
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 19	Nov-20	Liquidado

# Sustitución



Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC - Departamento de Nariño - Municipio de Buesaco	227-22	-	May-22	Liquidado
UNODC - Municipio de Campamento	225-22	-	May-22	Liquidado
Municipio de la Cruz	154-22	-	Jun-22	Liquidado
Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego	180-22	-	May-22	Liquidado
Municipio el Tablón de Gomez	153-22	-	May-22	Liquidado
UNODC-Municipio de Valdivia	226-22	-	May-22	Liquidado
Departamento Vichada, municipio de Cumaribo	671-21	-	Sep-23	Liquidado
Gran Tierra Colombia INC Sucursal	1124-21	-	Sep-23	Liquidado

Disponible  
\$ 675.096

En Trámite  
\$ 23.869

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ 10.855

Adjudicación  
\$ 15.028

Ejecución  
\$ 455.250

Terminado  
\$ 397.538

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y los Programas de Obras de Infraestructura.



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto





Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible PDET	\$ 675.096

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 11.163
Asistencia técnica en el sector agropecuario	\$ 7.255
Revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial	\$ 2.699
Actualización del plan básico de ordenamiento territorial	\$ 2.685
Defensa judicial	\$ 67



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Proyectos de mejoramiento de infraestructura vial	<a href="#">ART</a>	\$ 4.809	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONSORCIO TRES QUEBRADAS - GRUPO 1</li> <li>2. CONSORCIO VÍAS POR COLOMBIA - GRUPO 2</li> <li>3. CONSORCIO PD SANTANDER</li> <li>4. CONSORCIO PAZ SANTANDER - GRUPO 1</li> <li>5. CONSORCIO VÍAS SANTANDER - GRUPO 1</li> <li>6. EABS INGENIERÍA - GRUPO 2 SOLITA</li> <li>7. CONSORCIO PDT CAQUETÁ 2024</li> <li>8. DUSARD S.A.S.</li> <li>9. UNIÓN TEMPORAL UT SOLITA</li> <li>10. GRUPO OR - GRUPOS 1 Y 2</li> <li>11. CONSORCIO HL - GRUPO 2 SOLITA</li> </ol>	22 de marzo de 2024



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Adquisición y entrega de ambulancias	<u>ART</u>	\$ 3.601	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ALFA AM S.A.S.</li> <li>2. UNIÓN TEMPORAL AMBULANCIAS MÉDICAS</li> <li>3. GYC MEDICAL S.A.S.</li> <li>4. PERIAUTOS S.A.S.</li> </ol>	12 de abril de 2024



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Ejecutar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial	<a href="#">ART</a>	\$ 1.660	1. CONSTRUCCIONES GÓMEZ OROZCO S.A.S. 2. CONSORCIO PROVIPAZ	Declaratoria de fallida



Disponibles

En Trámite

Convocatoria

**Evaluación**  
**\$ 10.855**

Adjudicación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Interventoría integral	<u>ART</u>	\$ 784	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONSORCIO SEDILAS 24 – GRUPO 1</li> <li>2. CONSORCIO CUACA AI 52 – GRUPOS 1 Y 2</li> <li>3. DAIMCO S.A.S. – GRUPOS 1 Y 2</li> <li>4. SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. – GRUPOS 1 Y 2</li> <li>5. DONAL BOGOTÁ – GRUPOS 1 Y 2</li> <li>6. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA POSSO – GRUPO 1</li> <li>7. CONSORCIO VÍAS PDET A.J. – GRUPOS 1 Y 2</li> <li>8. UCING S.A.S. – GRUPO 2</li> <li>9. PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. – GRUPO 1</li> <li>10. CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL CAUCA 2024 – GRUPO 1</li> <li>11. CONSORCIO SOLITA – QUILICHAO GH – GRUPOS 1 Y 2</li> <li>12. CONSORCIO PALTA – VALDERRAMA – GRUPO 1</li> </ol>	12 de abril de 2024



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador logístico	<a href="#">ART</a>	RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S.	\$ 14.581	22 de marzo de 2024



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Interventoría integral	<a href="#">ART</a>	VELNEC S.A.	\$ 347	01 de abril de 2024



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Interventoría integral	<a href="#">ART</a>	CONSORCIO BDCO23	\$ 99	22 de marzo de 2024



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	866-23	\$50.382	Jul23 - Jul25	10%
Obras Civiles	Consorcio Educativo Catatumbo	1322-23	\$33.760	Dic23 - Nov25	0%
	Fundación Plan	436-19	\$27.589	Feb20 - Oct23	78%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	Feb20 - Feb24	34%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	Abr20 - Mar24	90%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	Abr20 - Oct23	35%
	Unión Temporal Futuro Pazcífico	110-20	\$11.480	Jul20 - Dic23	84%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	Jul20 - Mar24	79%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	Feb20 - Abr24	82%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 455.250

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	Jul20 - Ago23	82%
	Empresa Nacional Promotora De Desarrollo Territorial	125-24	\$ 5.213	Pendiente acta	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	Feb20 - Sep23	86%
	Blanca Milena López Sánchez	124-24	\$ 3.024	Feb24 - Oct24	0%
	Consorcio Vial Caguán HL	1432-23	\$ 2.983	Feb24 - Oct24	0%
	Consorcio 3H Mesetas	79-24	\$ 2.229	Feb24 - Sep24	0%
	Unión Temporal Troyanos	467-24	\$ 2.219	Pendiente acta	0%
	Consorcio Mejoramientos 2023	1358-23	\$ 1.946	Feb24 - Sep24	0%
Ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo social y económico	OR Construcciones e Ingeniería SAS	433-22	\$22.604	Sep22 - May24	58%
	Municipio de Chaparral (Tolima)	774-23	\$ 4.503	Jul23 - Dic24	50%
	CDP Convenio Fondo Paz	736-22	\$ 1.233	Dic22 - Dic24	0%
	Departamento de Putumayo	775-23	\$ 3.644	Jul23 - Dic24	50%

**\$ 455.250\***

**68%**

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo social y económico	Municipio de La Montañita (Caquetá)	777-23	\$ 3.516	Jul23 - Dic24	0%
	Municipio de Río Blanco (Tolima)	776-23	\$ 2.536	Jul23 - Dic24	0%
Proyectos de Generación de Ingresos	UT E&C - Colombia en Paz	1068-21	\$14.437	Dic21 - Dic23	90%
	UT por la Paz 2022	360-22	\$10.892	Jun22 - Jul24	90%
	Corporación Colombia Internacional CCI	1042-21	\$10.293	Dic21 - Dic23	95%
	Asociación de Autoridades Tradicionales AWA	1366-23	\$ 1.086	Feb24 - Jun24	0%
Operador Logístico	UT ART 2023	1143-23	\$20.266	Sep23 - Sep24	24%
	Proyectamos Colombia SAS	436-22	\$ 3.053	Ago22 - Abr23	100%
Prestación de Servicios	760 CPS	N/A	\$52.739	Jun21 - Abr25	56%
Interventoría	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.874	Ene20 - May24	64%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	Jul20 - Jun24	77%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 7.331	Ene20 - Mar24	78%
	Velnec S.A.	437-22	\$ 4.064	Sep22 - Mar24	41%
	Consorcio MYR Intereducación Catatumbo	1350-23	\$ 3.246	Dic23 - Dic25	0%
	UCING S.A.S	1431-23	\$ 284	Feb24 - Oct24	0%
	Consorcio Consulta 23	78-24	\$ 284	Feb24 - Oct24	0%
	Consorcio Mesetas JA	126-24	\$ 203	Feb24 - Sep24	0%
	Unión Temporal P&E 2023	113-24	\$ 153	Feb24 - Sep24	0%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA LTDA	393-22	\$ 127	Jun22 - May24	12%
Empresa de servicios temporales	HQ5 S.A.S	239-24	\$12.869	Feb24 - Jun24	0%
Formulación y ejecución de proyectos de mediana y alta complejidad	Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico	131-24	\$ 7.266	Pendiente acta	0%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 8.513	N/A	78%
Actualización catastral	Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC	1153-23	\$ 4.062	Oct23 - Ene25	30%
		90-24	\$ 3.333	Pendiente acta	0%
Adquisición y entrega de unidades móviles médicas	UT Alianza Biomédica	323-24	\$ 3.688	Pendiente acta	0%
	Unión Temporal Ingenierías Móviles	1365-23	\$ 3.307	Ene24 - Jun24	0%
Servicio de transporte público terrestre	Transportes Especiales A & S S.A.S.	73-23	\$ 3.377	Ene23 - Abr24	79%
Adquisición y entrega de ambulancias	Industrias Axial S.A.S.	1227-23	\$ 2.760	Nov23 - Abr24	0%
Actividades de conservación y desarrollo cultural	Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona - OWYBT	1262-23	\$ 1.247	Nov23 - Nov24	30%
Ejecutar proyecto de infraestructura productiva	Consorcio Eres 2022	417-22	\$ 1.017	Ago22 - May24	38%
Adquisición licenciamiento plataforma ARCGIS	ESRI Colombia S.A.S.	1304-23	\$ 1.001	Dic23 - Dic24	0%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 455.250

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Arrendamiento de inmuebles	Situando S.A.S.	1182-23	\$ 984	Nov23 - Jul25	19%
Arrendamiento de inmuebles	Central de Inversiones S.A. - CISA	1124-23	\$ 996	Pendiente acta	0%
Alquiler de equipos tecnológicos	COLOSOF S.A.S.	410-24	\$ 850	Pendiente acta	0%
Servicios de comunicación	Canal regional de televisión Teveandina S.A.S.	751-23	\$ 750	Ago23 - Oct23	10%
Arrendamiento de inmuebles	Central de Inversiones S.A. - CISA	1108-23	\$ 677	Oct23 - Jun25	5%
Adquisición de inmuebles	Municipio El Tarra	628-23	\$ 633	May23 - Ago23	94%
Formulación e implementación de un plan de fortalecimiento institucional	Universidad Pedagógica Nacional	645-23	\$ 528	May23 - May24	60%
Tiquetes Aéreos	Expreso Viajes Y Turismo Expreso S.A.S.	102-23	\$ 750	Feb23 - Dic24	17%
Estudio de pertinencia educativa	Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña	149-23	\$ 499	Feb23 - Jul23	92%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ001	\$ 77	Indeterminado	0%

\$ 455.250\*

68%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial

Informe Semanal No. 310  
11 al 15 de marzo 2024



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ010	\$ 62	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ015	\$ 62	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ009	\$ 46	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ006	\$ 42	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ012	\$ 39	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ004	\$ 30	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ005	\$ 30	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ007	\$ 30	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ008	\$ 25	Indeterminado	0%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	\$ 12	Nov21 - N/A	100%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 17 CPS y del contrato 410-24, a la adición al CDP de gastos de desplazamiento y del contrato 1143-23 y, al ajuste al valor de 10 contratos para defensa judicial

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 397.538

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	Feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1455 CPS	\$52.615	Dic-17	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	651 CPS	\$43.833	Dic-17	En proceso de liquidación
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	Feb-20	En proceso de liquidación
Fundación SOCYA	112-20	\$18.641	Nov-22	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	Feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	Feb-20	En proceso de liquidación
Imagroup Colombia SAS	358-22	\$15.649	Sep-23	Liquidado
Consorcio Caguán 2018	538-18	\$13.890	Ene-20	En proceso de liquidación
Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	Abr-22	En proceso de liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	\$ 8.818	Oct-22	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	Dic-20	En proceso de liquidación
Douglas Trade S.A.S.	721-21	\$8.705	Abr-22	Liquidado
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	Dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$7.627	Dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$6.651	Ago-21	Liquidado
Consorcio EGA	440-19	\$ 1.250	May-22	Liquidado
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	Dic-19	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Informe Semanal No. 310  
11 al 15 de marzo 2024

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 397.538

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	Feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	Feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	Sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.146	Nov-21	Liquidado
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 3.154	Abr-21	Liquidado
U.T. TCSC - Sabana FCP	1073-21	\$ 2.966	Ene-23	Liquidado
Norte Ingenieros Ltda.	167-21	\$ 2.981	Sep-22	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$ 2.759	Dic-19	En proceso de liquidación
Inversiones BlucherS.A.S	463-22	\$ 2.693	Ene-23	Liquidado
Consorcio ART JRUNOA	200-21	\$ 2.004	Ene-22	Liquidado
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 1.967	Nov-21	Liquidado
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	Ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$ 1.848	Ago-19	En proceso de liquidación
Inversiones BlucherS.A.S	464-22	\$ 1.698	Ene-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Informe Semanal No. 310  
11 al 15 de marzo 2024

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 397.538

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.169	Jun-22	Liquidado
Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	Mar-22	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	Abr-21	Liquidado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	Ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$ 973	Nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S.	255-23	\$ 878	May-23	Liquidado
COCOMACIA	821-20	\$ 885	Feb-22	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$ 797	Sep-22	Liquidado
Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	Dic-21	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	563-22	\$ 640	Nov-23	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	Oct-20	Liquidado
ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	Nov-22	Liquidado
Novatours Ltda.	315-22	\$ 450	Ene-23	En proceso de liquidación
Consorcio Intervial Antioquia	157-21	\$ 422	Oct-22	En proceso de liquidación



Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	\$ 413	Ene-23	Liquidado
Proyectamos Colombia SAS	654-21	\$ 341	Feb-22	Liquidado
Gastos Varios	N/A	\$ 10	Feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$ 0	Nov-19	Liquidado
UT Fortalecimiento Territorial	261-23	\$ 0	Ago-23	Liquidado



# Reincorporación

## (3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto





# Reincorporación



Disponibles	
Nombre corto	Valor
Disponibles Reincorporación	\$ 161.994

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 100
Defensa judicial	\$ 46



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 956.567	Sep17 - Jun24	80%
Suministro de alimentos	N/A	N/A	\$ 115.005	N/A	24%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 93.913	Jun18 - Jun24	93%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 35.537	Sep17 - Jun24	99%
Acciones de transferencia tecnológica y de conocimiento, fortalecimiento productivo y comercial	UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	1156-23	\$ 5.329	Nov23 - Nov26	20%
Interventoría	CISP	520-22	\$ 3.265	Oct22 - Oct24	98%
	SERVINC S.A.S.	1280-23	\$ 48	Ene24 - Jul24	0%
Fortalecimiento y Comercialización de Proyectos Productivos	Fiducoldex, vocera del fideicomiso Innpulsa Colombia	438-22	\$ 3.030	Jul22 - Abr25	79%
Prestación de Servicios	31 CPS	N/A	\$ 3.099	Nov22 - Ene25	40%
Apoyo fortalecimiento institucional	CODES	548-22	\$ 1.974	Nov22 - Jul24	67%



# Reincorporación



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 853	N/A	52%
Viabilidad proyecto de vivienda	Universidad Nacional de Colombia	1311-23	\$ 590	Ene24 - Jun24	0%
Tiquetes aéreos	Comercializadora JE Tours S.A.S.	1157-23	\$ 97	Oct23 - Oct24	3%
Servicio de transporte terrestre	Viajando Express S.A.S.	861-23	\$ 80	Ago23 - Ago24	9%
Arrendamiento de equipos	Gamatécnica Ingeniería S.A.S.	1106-23	\$ 68	Oct23 - Oct24	12%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

\*La variación corresponde a la suscripción de 6 CPS, a la adición a los CDP de proyectos productivos y suministro de alimentos y a la terminación del contrato 435-22

# Reincorporación

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 168.757

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	493-22	\$ 40.168	Sep-23	Liquidado
Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	Abr-21	Liquidado
UT FCP 2021	217-21	\$ 25.472	Mar-22	Liquidado
Integral Servicios S.A.S.	261-22	\$ 20.411	Oct-22	Liquidado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	Mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	Nov-19	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	May-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	Mar-18	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	239-21	\$ 2.528	Dic-22	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	Mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios 17 CPS	N/A	\$ 1.703	Dic-20	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	613-20	\$ 1.962	Jul-22	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 1.977	Ago-20	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	245-20	\$ 1.500	Dic-21	Liquidado
CODES	907-21	\$ 1.213	Ago-22	Liquidado
Prestación de Servicios 27 CPS	N/A	\$ 1.913	Feb-20	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	Jun-18	Liquidado
Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	\$ 514	Oct-22	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# Reincorporación

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 168.757

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	Jul-21	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	Abr-20	Liquidado
Monval Ingeniería S.A.S.	490-22	\$ 230	Ago-23	En proceso de liquidación
Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 138	Dic-22	Liquidado
Subatours SAS	286-21	\$ 84	Jun-22	Liquidado
Transporte Terrestre	209-21	\$ 71	Abr-22	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	\$ 60	May-21	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	435-22	\$ 47	Jul-23	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	608-22	\$ 45	Jul-22	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	Jul-21	Liquidado
Subatours SAS	381-22	\$ 30	Dic-22	Liquidado
BIM Latinoamérica SAS	629-21	\$ 12	Ago-22	Liquidado
Transportes especiales F.S.G. SAS.	430-22	\$ 11	Feb-23	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ -	Nov-19	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Informe Semanal No. 310  
11 al 15 de marzo 2024



## Jurisdicción Especial de Paz

### (5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En proceso de cierre



Temporalidad: 2019



# Jurisdicción Especial para la Paz



Nombre corto	Valor
Disponible JEP	\$ 159

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 43.906

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	Jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	239 CPS	\$ 10.733	Nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ene-21	Liquidado
Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jun-22	Liquidado
Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	Ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	Dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	Jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$ 584	Mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	Nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	Abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	Oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	Mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	Jun-18	Liquidado
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	Sep-18	Liquidado
Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$77	May-22	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	Dic-18	Liquidado
Gastos de Desplazamiento	N/A	\$57	Jul-22	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	Dic-18	Liquidado





## Primera Infancia ICBF



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.



Implementar acciones que promuevan la ampliación de la atención integral con pertinencia para las niñas y los niños en primera infancia que habitan en los municipios PDET, a través de 3 líneas de acción: i) gestión territorial y de política, ii) calidad y pertinencia de la atención integral, y iii) direccionamiento, seguimiento y gestión del conocimiento, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz y el Plan Especial de Educación Rural, en coherencia con lo dispuesto por la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2026



# Primera Infancia ICBF



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	\$ 39.062

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 254
Defensa judicial	\$ 147

# Primera Infancia ICBF



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Contratos de prestación de servicio	6 CPS	N/A	\$ 746	Pendiente de acta	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 48	N/A	100%



Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 27.623

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$3.877	Nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	\$3.198	Jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$3.052	Nov-20	Liquidado
Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	\$2.574	Jul-22	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	Ago-20	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	68 CPS	\$2.999	Feb-19	Liquidado
Conсорcia PDET 2021	1123-21	\$1.895	Oct-22	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.391	Nov-20	Liquidado
Asesoría y Gestión CÍA SAS	306-22	\$1.342	Sep-22	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.387	Ago-20	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.076	Ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	9 CPS	\$ 693	May-21	En proceso de liquidación
Conсорcio S&T 2021	923-21	\$ 528	Oct-22	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$ 35	Sep-22	Liquidado
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	\$ -	Nov-21	Liquidado



# Agencia Nacional de Tierras

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto





Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	\$ 43



Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	89 CPS	\$ 2.799	Jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	Abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	Mar-18	Liquidado



# Funcionamiento

## Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad y Defensa Judicial del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2026



# Funcionamiento




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Funcionamiento	\$44.713

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Auditoría	\$ 1.430
Defensa judicial	\$ 75



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$25.679	Oct19 - Jun24	84%
Nómina	Apoyamos Procesos Temporales S.A.S.	758-23	\$15.497	Jul23 - Ago24	60%
Nómina	PEC y CIA. S.A.S.	383-22	\$11.506	Jun22 - Dic23	99%
Servicios TIC	IMPRETIC ´S E.I.C.E	416-22	\$ 2.878	Ago22 - Sep23	98%
	Talento Sólido S.A.S.	998-23	\$ 2.606	Oct23 - Sep24	30%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 1.268	Nov18 - Jun24	95%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1333-23	\$ 749	Dic23 - Nov25	15%
Servicio de nube pública	Comunicación Celular - COMCEL S.A.	TVEC2	\$ 613	Ago23 - Ago24	74%
Custodia de Documentos	PGD procesos de gestión documental SAS	439-22	\$ 604	Ago22 - Mar24	82%
Tiquetes aéreos	Publica S.A.S.	1144-23	\$ 431	Sep23 - Sep24	12%
Servicios archivísticos	Almarchivos S.A.	324-24	\$ 373	Mar24 - Mar25	0%

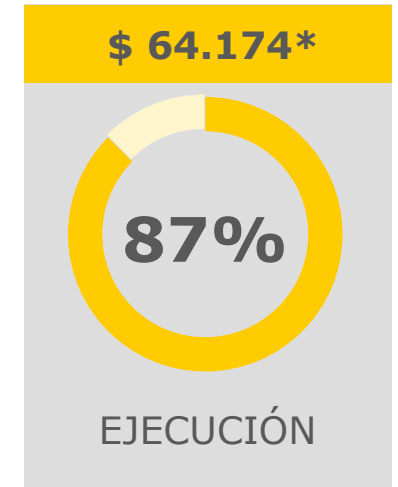

# Funcionamiento



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty Seguros S.A.	Póliza	\$ 232	Jul22 - Jul23	100%
	Liberty Seguros S.A.	517489	\$ 232	Ago23 - Ago24	100%
	Zurich Colombia Seguros S.A.	95118275	\$ 9	Ago23 - Ago24	100%
	Zurich Colombia seguros S.A.	Póliza	\$ 7	Jul22 - Jul23	100%
Aseo y Cafetería	Limpieza institucional LASU S.A.S.	1400-23	\$ 240	Dic23 - Dic24	10%
	Grupo empresarial SEISO S.A.S.	465-22	\$ 152	Sep22 - Dic23	99%
Arrendamientos	Inversiones contadora SAS Y Deissy Alexandra Betancur Yepes	521-22	\$ 184	Oct22 - Oct24	84%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales Nueva Era S.A.S.	1425-23	\$ 259	Dic23 - Dic24	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 137	N/A	79%
Tiquetes aéreos	Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S.	642-23	\$ 59	May23 - Sep23	90%



Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 64.174

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Auditoría	BDO Audit S.A.S. BIC	217-24	\$ 42	Feb24 - May24	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ011	\$ 42	Indeterminado	0%
Diseño e implementación de SGSS en el trabajo	Aura Elena González Gutiérrez	1198-23	\$ 22	Oct23 - Abr24	0%
Apoyo plataforma TVEC	Laura Alexandra Chamorro	878-23	\$ 21	Jul23 - Ene24	33%
Acompañamiento uso SECOP	Laura Alexandra Chamorro	223-23	\$ 14	Feb23 - Jun23	100%
Elementos de papelería	Panamericana Librería y Papelería	TVEC1	\$ 11	Abr23 - Abr23	100%
Adecuaciones físicas	Organización Empresarial De Profesionales S.A.S	731-23	\$ 4	Jun23 - Jul23	100%
Servicio de restaurante y material logístico	John Faiber Molano Polania	221-23	\$ 3	Feb23 - Feb23	100%
Referenciador digital automático	LEGIS Editores S.A.	449-23	\$ 2	Mar23 - Mar24	100%
Salón de reuniones	GEB Cadena Hotelera S.A.S.	222-23	\$ 1	Feb23 - Mar23	100%

\$ 64.174\*

87%

EJECUCIÓN

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 55.966

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Su Temporal	166-21	\$ 9.550	May-23	Liquidado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	Sep-19	Liquidado
Nomina	N/A	\$ 6.510	Jul-22	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 5.701	Abr-21	Liquidado
IMPRETIC ´S E.I.C.E	304-21	\$ 2.372	Jul-22	Liquidado
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.100	May-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	Mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	May-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.249	May-21	Liquidado
Ernst & Young S.A.S.	380-22	\$ 1.061	Oct-23	Liquidado
Ernst & Young	55-19	\$ 964	Dic-20	Liquidado
Ernst & Young	867-20	\$ 947	Abr22	En proceso de liquidación
Tecnología Inmobiliaria	535-20	\$ 931	Nov-23	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	Dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 560	Dic-20	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$471	Sep-22	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	Feb-18	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	Nov-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

**Terminados**  
**\$ 55.966**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Century Media S.A.S.	671-23	\$ 300	Feb-24	En proceso de liquidación
Novatours Ltda.	356-22	\$ 300	May-23	En proceso de liquidación
Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 219	Ago-22	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	Ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul-21	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul-22	Liquidado
Transportes Especiales Nueva Era S.A.S.	379-22	\$ 170	Dic-23	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	May-18	Liquidado
Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 119	Sep-22	Liquidado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 133	Mar-21	Liquidado
Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	Dic-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	Dic-17	Liquidado
Imagroup Colombia SAS	882-21	\$ 100	Oct-22	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	Abr-18	Liquidado
Nexura Internacional SAS	554-21	\$ 83	Feb-22	En proceso de liquidación
Transportes Especiales A&S SAS	549-21	\$ 82	May-22	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	May-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	Nov-17	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	Jun-18	En proceso de liquidación
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	May-19	Liquidado

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

**Terminados**  
**\$ 55.966**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic-23	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	Dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	Abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	Jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	Nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	\$ 31	Sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	\$ 30	Jul-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	Jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	Dic-17	Liquidado
Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 19	Sep-22	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	522-22	\$ 19	Nov-22	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	May-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$ 14	Oct-20	Liquidado
Godoy & Hoyos Abogados S.A.S.	571-22	\$ 10	Dic-22	En proceso de liquidación
Comunitic S.A.S.	591-22	\$ 10	Dic-22	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	694-22	\$ 8	Ene-23	En proceso de liquidación
Zurich Colombia Seguros SA	N/A	\$ 8	Jul-22	Liquidado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	Nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	\$ 7	Jun-21	Liquidado

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 55.966

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
José Leandro Londoño Henao	624-22	\$ 7	Feb-23	En proceso de liquidación
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	Oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	Jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	Dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	Jun-19	Liquidado
Arquiredes construcciones S.A.S.	462-22	\$ 6	Ago-22	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	Jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	Dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	Nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	Mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	\$ 5	Ago-21	Liquidado
C J Motors LTDA	525-22	\$ 5	Nov-22	En proceso de liquidación
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	Dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	\$ 1	Mar-20	Liquidado





# Implementación

## Transversal



Entidad Ejecutora: Oficina del Alto Comisionado de Paz – Unidad de Implementación



Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Implementación de la OACP.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto



# Implementación




Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Implementación	\$26.246

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Fortalecer capacidades de la CSIVI	\$ 3.521
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.032

# Implementación



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	85 CPS	N/A	\$10.074	Mar21 - Mar25	78%
Operador logístico	UT Visión FCPaz 2023	104-24	\$ 2.300	Ene24 - Ene25	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 1.348	N/A	88%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	1002-21	\$ 1.300	Dic21 - Jun23	100%
Fortalecer las capacidades de la CSIVI	Centro de pensamiento y dialogo político – CEPDIPO	1349-23	\$ 537	Dic23	100%
Tiquetes aéreos	Publica S.A.S.	572-22	\$ 315	Nov22 - May24	77%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 29	N/A	84%

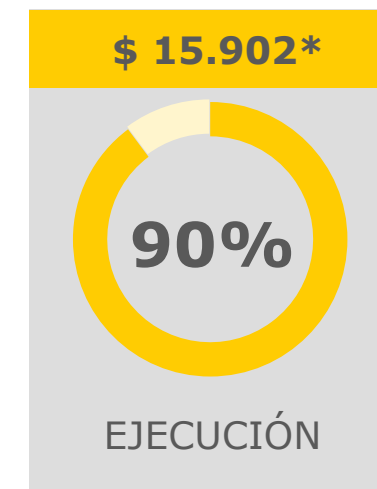

# Implementación

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 32.621

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	131 CPS	\$12.512	Dic-17	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	41 CPS	\$ 4.082	Oct-19	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	\$ 2.991	Jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	Jul-18	Liquidado
Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$ 2.548	Ago-22	Liquidado
Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$ 2.550	Ene-22	En proceso de liquidación
Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S.	427-22	\$ 1.360	Nov-23	Liquidado
Infotíc S.A.	238-21	\$ 1.254	Ago-22	Liquidado
Sociedad hotelera Tequendama SA	428-22	\$ 925	Oct-22	Liquidado
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 495	Jul-19	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	\$ 353	Sep-22	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	Jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	Sep-21	En proceso de liquidación
Publica S.A.S.	1300-23	\$ 116	Ene-24	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	1029-21	\$ 91	Jun-22	Liquidado

# Implementación



Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	Dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 49	Jun-22	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$ 16	Dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	\$ 3	Jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$ 0,01	Nov-17	Liquidado



## Sociedad de Activos Especiales

### (5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Cerrada



Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto





Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Ago-19	Liquidado





# Colombia Sostenible- Nación 2018

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Cerrada



Temporalidad: 5 años

**Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.**





Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$ 505	Oct-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$ 503	Dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$ 503	Oct-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$ 497	Oct-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	Oct-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	Feb-17	Liquidado



## BID Préstamo

### (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2025



# BID Préstamo



Disponibles	
Nombre corto	Valor
Disponibles BID Préstamo	\$ 37.174

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicio	\$ 323



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Santa Isabel	122-22	\$ 6.693	Mar22 - Mar24	100%
	DEBISAMCO	108-22	\$ 6.920	Abril22 - Oct24	73%
	Fundación ambientalistas y reforestadores de Colombia	369-22	\$ 5.708	Jun22 - Jun24	39%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	Nov20 - Jun24	100%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	Nov20 - Jul24	14%
	Corporación Lexcom Colombia	104-22	\$ 6.972	Jun22 - Ene25	77%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	Nov20 - Dic23	100%
	Conservation International	740-20	\$ 4.826	Nov20 - Mar23	99%
	ASOPATÍA	304-22	\$ 4.654	May22 - May24	70%
	FEDEGAN	290-22	\$ 4.058	Abr22 - Dic24	70%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	\$ 4.814	Nov20 - Ago24	100%
	Consortio ambiental ecosistemas tropicales 2021	361-22	\$ 4.394	Jun22 - Jun24	70%
	Consortio ambiental ecosistemas tropicales 2021	341-22	\$ 3.709	Jun22 - Jun24	70%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	Nov20 - Nov23	100%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.984	Nov20 - Ago24	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	106-22	\$ 3.558	Mar22 - Jun24	100%
	Masbosques	260-22	\$ 3.236	May22 - May24	100%
Corporación PBA	283-22	\$ 3.262	Abr22 - Abr24	100%	



Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 253.187

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Universidad de Ibagué	291-22	\$ 2.823	Jul22 - Jul24	70%
	ONF Andina	765-20	\$ 2.753	Nov20 - Jun24	100%
	Campodulce	845-20	\$ 4.116	Nov20 - Dic24	66%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.873	Nov20 - Dic23	89%
	ASPROPISAT	342-22	\$ 2.679	May22 - Nov24	64%
	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	\$ 2.293	May21 - Nov23	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	107-22	\$ 2.440	Mar22 - Mar24	100%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	44-22	\$ 2.176	Jun22 - Jun24	70%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.091	Nov20 - Jul23	99%
	FUDESCO	508-22	\$ 2.140	Nov22 - May24	100%
	Unión Temporal Cindap - Cordep	301-22	\$ 2.104	May22 - Sep24	72%
	Funmineros	923-20	\$ 2.180	Dic20 - Dic23	100%
	FESU	734-20	\$ 1.817	Nov20 - May23	100%

\$ 253.187

85%

EJECUCIÓN



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Resguardo indígena YUPKA IROKA	370-22	\$ 1.815	Jun22 - Jun24	100%
	Codesarrollo	276-22	\$ 1.800	Mar22 - Mar24	100%
	CCI	259-22	\$ 1.892	Mar22 - Mar24	100%
	ONF Andina sucursal colombiana	1429-23	\$ 1.644	Feb24 - Feb25	0%
	COGAINCHAIRÁ	271-22	\$ 1.602	Mar22 - Sep23	100%
	Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta del río Palo	297-22	\$ 1.598	Mar22 - May24	100%
	Fundación para el desarrollo integral de las comunidades - SINERGIA	374-22	\$ 1.455	Jun22 - Jun24	70%
	Unión temporal agrofuturo del norte	343-22	\$ 1.729	May22 - Nov24	75%
	ASOPRODEMA	295-22	\$ 1.565	May22 - Ago24	100%
	UNAD	281-22	\$ 1.549	May22 - Nov23	2%
	CETEC	434-22	\$ 1.361	Sep22 - Mar24	100%
	WWF Colombia	1351-23	\$ 1.591	Pendiente acta	0%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	\$ 1.207	Jun21 - Ago23	100%
	Fundación Horizonte	269-22	\$ 1.206	May22 - Mar24	100%
	Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI	98-22	\$ 1.449	Jun22 - Jun24	75%
Savia Ambiental S.A.S	302-22	\$ 1.197	May22 - May24	100%	





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	CETEC	743-20	\$ 1.170	Nov20 - May23	100%
	Universidad Surcolombiana	125-22	\$ 1.484	Sep22 - Sep24	76%
	Consorcio Prosercot Asociados	378-22	\$ 1.288	Jun22 - Jul24	73%
	Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB	314-22	\$ 1.497	Abr22 - Nov24	55%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la Plata Bahía Málaga	382-22	\$ 1.167	Sep22 - Sep24	70%
	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.220	Nov20 - May24	100%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	Nov20 - Abr23	99,9%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	Nov20 - Mar23	100%
	Comité de Ganaderos del Tolima	36-22	\$ 1.107	Mar22 - Mar24	100%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.305	Nov20 - Oct24	100%
	GESTANDO	277-22	\$ 1.089	Abr22 - Abr24	70%
	Fundación EQUAL Colombia	123-22	\$ 1.372	Mar22 - Mar24	100%
	Fundación Orinoquia	606-23	\$ 1.177	Ago23 - Feb25	42%
	Fundación Orinoquia Biodiversidad	128-22	\$ 1.051	Abr22 - Abr24	70%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	\$ 1.077	Abr22 - Abr24	100%
Proyecto NASA	345-22	\$ 1.161	Oct22 - Jun24	61%	



# BID Préstamo



	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASOPROTECCO	262-22	\$ 981	May22 - Nov23	100%
	UNIMINUTO	43-22	\$ 981	Mar22 - Mar24	100%
	PRAGRO SAS	41-22	\$1.132	Mar22 - Mar24	100%
	Fundación asesorías e investigaciones profesionales	58-22	\$ 954	Mar22 - Mar24	100%
	Consorcio PBA	274-22	\$ 936	May22 - Sep24	100%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$1.042	Nov20 - Sep24	31%
	Corporación autónoma regional del Cauca	564-22	\$ 920	Mar23 - Feb25	35%
	CAFISUR	258-22	\$ 927	May22 - May24	100%
	Fundación Horizonte	57-22	\$ 918	May22 - Mar24	100%
	COSURCA	101-22	\$1.018	Abr22 - May24	100%
	Corporacion PBA	115-22	\$1.012	Abr22 - Abr24	100%
	CORPOYARUMOS	114-22	\$ 994	May22 - Nov24	73%
	FUNDAHERENCIA	275-22	\$ 907	May22 - Nov23	100%
	Grupo asociativo de cafeteros Villalibano	109-22	\$1.026	Abr22 - Mar24	100%
	CAFISUR	272-22	\$ 900	May22 - May24	100%
	Consorcio "RAÍCES"	362-22	\$1.086	Jun22 - Nov24	58%
	CODES	300-22	\$ 900	May22 - Nov23	100%
	Innovakit SAS BIC	48-22	\$ 900	Mar22 - Nov23	100%
GENYTEC	112-22	\$1.088	Abr22 - Abr24	100%	







Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Proyecto NASA	313-22	\$ 888	May22 - May24	100%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	Nov20 - Sep23	95%
	Futuro y desarrollo comunitario	120-22	\$ 889	Jun22 - Jun24	71%
	Fundación Pancitas Felices	292-22	\$ 873	May22 - Ago24	100%
	Ecoexplora Consultoría S.A.S BIC	625-23	\$1.180	Jul23 - Jul24	26%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	\$1.198	Mar22 - May24	100%
	COMICACAO	344-22	\$1.213	May22 - Nov24	50%
	FUDESCO	510-22	\$ 885	Oct22 - Jul24	100%
	COSURCA	46-22	\$1.045	Abr22 - Feb24	100%
	CINDAP	45-22	\$ 914	Jun22 - Mar24	100%
	Corporación Colombia Internacional CCI	257-22	\$ 968	Mar22 - Sep23	100%
	Prodesarrollo Limitada	299-22	\$ 897	May22 - Mar24	100%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	Nov20 - Abr23	100%
	Corporación Colombia Agropecuaria	273-22	\$1.066	Jun22 - Jun24	77%
	Fundación reserva natural la Palmita Centro de Investigación	308-22	\$ 904	Oct22 - Oct24	74%
	FTV	40-22	\$ 783	Mar22 - Dic23	100%
ASOCALM	324-22	\$ 905	May22 - Abr24	100%	





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo	105-22	\$ 766	Mar23 - Mar24	100%
	COOBRA	781-20	\$ 765	Nov20 - Mar23	100%
	Innovakit SAS BIC	51-22	\$ 861	Mar22 - Sep23	88%
	ASOM	124-22	\$1.258	Mar22 - Sep23	20%
	Corpoamazonía	245-22	\$ 748	Jun22 - Abr24	100%
	FUNDECERP	131-22	\$ 731	May22 - Jun24	100%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	Dic20 - Jun23	100%
	Fundación Ayudar	502-22	\$ 813	Dic22 - Jun24	60%
	FUNINSUR	113-22	\$ 693	Mar22 - Jul24	100%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	37-22	\$ 733	Mar22 - Nov23	100%
	CADI	103-22	\$ 697	Mar22 - Jun24	100%
	CORPOJAGUAR	56-22	\$ 682	Abr22 - Nov24	70%
	Corporación Colombia Internacional CCI	255-22	\$ 780	Mar22 - Jun24	100%
	Corporación Ambiental SIE	298-22	\$ 716	May22 - May24	100%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	Nov20 - Mar23	99,9%
	Fundación Planeta Rural	59-22	\$ 662	Mar22 - Mar24	100%
Corporación para la sostenibilidad de la subcuenca del río palo	346-22	\$ 662	May22 - Nov23	100%	



# BID Préstamo



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	Nov20 - May23	100%
	Asesorías y Servicios de Ingeniería	54-22	\$ 683	Abr22 - Abr24	100%
	FUNDARREGION	267-22	\$ 657	Abr22 - Abr23	32%
	ASOGANADO	787-20	\$ 648	Nov20 - Mar23	100%
	Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz	263-22	\$ 648	Mar22 - Sep23	100%
	Fundacion para el desarrollo territorial y comunitario	865-23	\$ 639	Ago23 - Feb25	35%
	Corporación PBA	110-22	\$ 732	Abr22 - Abr24	100%
	ASI	53-22	\$ 744	Mar22 - May24	100%
	Corpoamazonía	50-22	\$ 859	Feb22 - Jun24	100%
	Fundación integral para el desarrollo sostenible Findes	323-22	\$ 630	May22 - Nov23	100%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	42-22	\$ 717	Mar22 - Nov23	100%
	Union Temporal Agromanifue	305-22	\$ 630	Abr22 - Mar23	100%
	FUNDARREGION	266-22	\$ 630	Abr22 - May24	100%
	U.T AGROMANIFUE	289-22	\$ 621	Abr22 - Abr23	100%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	47-22	\$ 736	Jun22 - Jun24	59%
	ASI	55-22	\$ 621	Mar22 - Ene24	100%
	Fundación Planeta Rural	268-22	\$ 619	Mar22 - Mar23	100%
	Acuicula Green Fish SAS	303-22	\$ 607	Abr22 - Oct23	100%



# BID Préstamo



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	SERVICURE	129-22	\$ 603	Mar22 - Jul24	100%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	Nov20 - Abr23	95%
	CAFISUR	100-22	\$ 603	May22 - Feb24	100%
	Corporación Colombia Internacional CCI	284-22	\$ 593	Mar22 - Mar23	4%
	PRAGRO SAS	39-22	\$ 744	Mar22 - Abr24	100%
	UNAD	282-22	\$ 787	May22 - Nov23	1%
	GENYTEC	111-22	\$ 748	Abr22 - Abr24	100%
	COPEX	788-20	\$ 594	Nov20 - Oct23	100%
	ASOPRODAMET	285-22	\$ 880	Mar22 - Abr24	67%
	Instituto Amazónico de Investigaciones SINCHI	265-22	\$ 627	Jun22 - Jun24	66%
	Cámara de Comercio de Arauca	293-22	\$ 635	May22 - Ago24	72%
	Corporación Colombia Internacional CCI	256-22	\$ 766	Mar22 - Mar24	100%
	Corpoamazonía	38-22	\$ 949	Feb22 - Sep24	81%
	CORSOC-ONG	127-22	\$ 585	Mar22 - Mar23	98%
	Federación nacional de cafeteros de Colombia	126-22	\$ 609	Jul22 - Abr24	100%
	Bolivar - Asocafe	121-22	\$ 584	Abr22 - Abr24	98%
	CINDAP	49-22	\$ 639	Mar22 - Abr24	100%
Fundación Hijos de la Sierra Flor	264-22	\$ 653	Mar22 - Mar24	100%	



Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 253.187

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de economía solidaria del medio y bajo Caguán - ASOES	648-23	\$ 453	Jul23 - Jul24	0%
		286-22	\$ 416	Mar22 - Sep23	100%
	Instituto Amazónico de investigaciones SINCHI	97-22	\$ 694	Jun22 - Dic24	24%
	Innovakit S.A.S. BIC	1353-23	\$ 445	Pendiente acta	0%
	CECIDIC	368-22	\$ 244	Oct22 - Oct24	100%
	Federación Nacional de Cacaoteros	1206-23	\$ 100	Nov23 - May24	0%
Prestación de Servicios	76 CPS	N/A	\$12.709	Mar21 - Feb25	57%
Auditoría	Deloitte & Touche S.A.S.	106-23	\$ 500	Feb23 - Jun25	31%
	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	Ene21 - N/A	100%
Servicios TIC	Talento Sólido S.A.S.	998-23	\$ 462	Oct23 - Sep24	33%
Arrendamiento	Puentes y Carreteras S.A.S.	833-23	\$ 432	Jul23 - May25	38%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	\$ 295	Nov21 - Oct23	100%
Consultoría	Universidad de los Andes	518-22	\$ 198	Nov22 - Abr23	100%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 298	N/A	69%
Tiquetes	Subatours S.A.S.	214-19	\$ 213	Ago19 - Feb25	64%

\$ 253.187


85%

EJECUCIÓN

# BID Préstamo



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Consultoría herramienta tecnológica	Víctor Andrés Valencia	636-23	\$ 129	May23 - Nov23	0%
Operador Logístico	Imagroup Colombia S.A.S.	848-23	\$ 55	Jul23 - Feb25	19%
Videos instructivos	Fundación Cine Documental Investigación Social	605-23	\$ 49	Abr23 - May24	54%
Hosting, ayuda portal web	High Quality Solutions LA EU	877-23	\$ 10	Ago23 - Ago25	0%
Certificado digital	Camerfirma	655-21	\$ 0,40	Ago21 - Feb25	100%

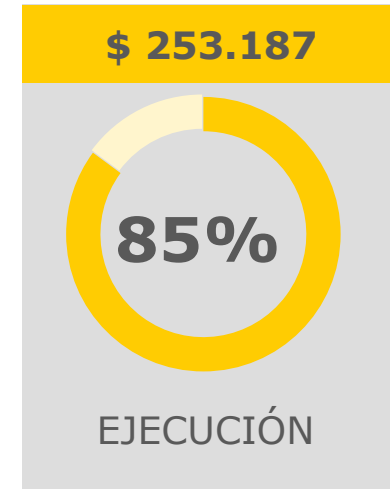

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 84.881

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
58 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 7.003	Oct-19	Liquidado
87 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 5.585	Sep-19	En proceso de Liquidación
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	Feb-23	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$ 2.031	May-20	En proceso de Liquidación
CRC	905-21	\$ 1.966	Feb-23	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$ 1.929	May-20	Liquidado
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$ 1.927	May-20	Liquidado
Misión Verde	726-20	\$ 1.926	Ene-23	En proceso de Liquidación
Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	Nov-22	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	Jun-21	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	Jun-21	Liquidado
ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	Ago-22	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$ 1.538	May-20	Liquidado
MCC	786-20	\$ 1.530	Ago-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	Jun-21	Liquidado
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$ 1.527	May-20	Liquidado
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.349	Jun-21	Liquidado
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	Jul-21	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$ 1.438	May-20	Liquidado
ONF Andina	727-20	\$ 1.332	Sep-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 84.881

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.297	Ago-21	En proceso de Liquidación
SMURFIT	795-20	\$ 1.233	Feb-23	En proceso de Liquidación
Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	Dic-22	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	Jun-21	En proceso de Liquidación
ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	Dic-22	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	Jun-21	Liquidado
FUDESCO	733-20	\$ 1.071	Nov-22	En proceso de Liquidación
Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	Ene-23	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	Jul-20	Liquidado
Proterritorio	838-20	\$ 1.047	Jun-21	Liquidado
Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	Jun-21	Liquidado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	Sep-21	Liquidado
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	Oct-21	Liquidado
Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	Jun-21	Liquidado
INPROSEC	841-20	\$ 941	Jun-21	Liquidado
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la Zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	Jun-21	Liquidado



Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 84.881

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	Jun-21	Liquidado
SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 934	May-24	En proceso de Liquidación
CAFISUR	741-20	\$ 900	Sep-22	En proceso de Liquidación
COOPERACAFE	738-20	\$ 900	Feb-23	En proceso de Liquidación
CAFISUR	742-20	\$ 899	Sep-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	Sep-22	En proceso de Liquidación
FUN Lantano	783-20	\$ 888	Nov-22	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	\$ 885	Jul-21	Liquidado
Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	Nov-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	739-20	\$ 828	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	\$ 793	Jun-21	Liquidado
Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	Feb-22	Liquidado
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	Ago-21	En proceso de Liquidación
ASOHECA	859-20	\$ 777	Oct-22	En proceso de Liquidación
Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	Jun-22	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	Ago-21	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	Jun-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Préstamo



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
CORPOTUNIA	782-20	\$ 660	Mar-22	Liquidado
Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	Feb-22	Liquidado
Universidad de los Andes	309-20	\$ 655	Oct-21	En proceso de Liquidación
INPROSEC	784-20	\$ 639	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORURAL	797-20	\$ 639	Dic-22	En proceso de Liquidación
Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	Sep-22	En proceso de Liquidación
Campodulce	825-20	\$ 628	Sep-22	En proceso de Liquidación
Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	Oct-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	Dic-22	En Proceso de Liquidación
ASOCOOPH	780-20	\$ 585	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORPOJAGUAR	789-20	\$ 572	Nov-22	En proceso de Liquidación
FMEPAC	854-20	\$ 530	Mar-22	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	\$ 479	Sep-21	Liquidado
CCI	761-20	\$ 323	Ene-23	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	Jun-20	Liquidado



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Préstamo



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Imagroup Colombia S.A.S.	461-22	\$ 45	May-23	Liquidado
Mas medios diseño y comunicación estratégica S.A.S.	492-22	\$ 14	Feb-23	En proceso de Liquidación
High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 10	Abr-22	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	Sep-20	Liquidado
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	-	Nov-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	855-20	-	May-22	Liquidado
RAPE Región Central	443-22	-	Sep-23	Liquidado



## BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



**Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2024




# BID Facilidad



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible BID Facilidad	\$ 871



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	APROCASUR	279-22	\$ 1.310	Mar22 - Dic23	92%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.140	Nov20 - May23	99,7%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	117-22	\$ 1.156	Mar22 - Sep23	84%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	118-22	\$ 1.074	Mar22 - Sep23	84%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	119-22	\$ 1.120	Mar22 - Dic23	80%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 850	Ago20 - May23	100%
	La fundación de mineros S.A	280-22	\$ 812	May22 - Oct24	96%
	CCI	278-22	\$ 687	Mar22 - May24	100%
	UNAD	130-22	\$ 814	May22 - Ene25	49%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 726	Sep20 - May23	100%
	Consultoría Estratégica Integral S.A.S - CEINTE S.A.S	752-23	\$ 460	Jul23 - Jul24	18%

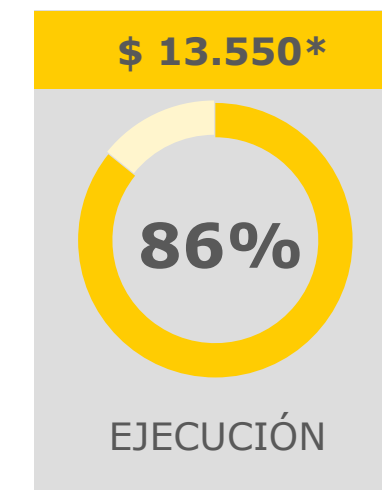



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Formación y capacitación en producción sostenible	Corporación parque tecnológico de innovación del café y su caficultura TECNICAFÉ	1207-23	\$ 647	Dic23 - Mar24	60%
	Federación Nacional de Cacaoteros	1206-23	\$ 647	Nov23 - May24	29%
	Asociación agropecuaria UCEBUL	1209-23	\$ 570	Dic23 - Mar24	50%
	Riosierra S.A.S.	1208-23	\$ 210	Dic23 - Mar24	25%
	Asociación agropecuaria UCEBUL	1211-23	\$ 160	Dic23 - Mar24	50%
	Asociación agropecuaria UCEBUL	1210-23	\$ 129	Dic23 - Mar24	50%
Prestación de Servicios Persona Natural	8 CPS	N/A	\$ 464	May22 - Jun24	55%
Auditoría	Deloitte & Touche S.A.S.	105-23	\$ 153	Feb23 - Jun24	50%
		44-21	\$ 100	Feb21 - N/A	100%
		104-23	\$ 43	Feb23 - Oct23	20%



# BID Facilidad



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 118	N/A	83%
Consultoría herramienta tecnológica	Víctor Andrés Valencia	636-23	\$ 51	May23 - May24	29%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	357-22	\$ 69	Abr22 - Jul23	40%
		447-22	\$ 20	Ago22 - Mar25	38%
Página web	High Quality Solutions La EU	353-22	\$ 21	May22 - May23	100%





Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 9.223

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	Sep-21	Liquidado
Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.595	Ene-23	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	\$ 1.585	Dic-22	En proceso de Liquidación
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	\$ 1.309	Sep-21	Liquidado
21 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 714	Nov-19	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 680	Abr-23	Liquidado
8 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 582	Nov-19	Liquidado
Corporación Colombiana internacional	844-21	\$ 545	Abr-23	Liquidado
Auditoría Deloitte & Touche Ltda.	45-21	\$ 154	Sep-23	Liquidado
Sinergia P&M S.A.S	326-22	\$ 86	Abr-23	Liquidado
Comunican S.A.	457-22	\$ 75	May-23	Liquidado
Pubblica S.A.S.	507-23	\$ 60	Jun-23	Liquidado



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Editorial La República S.A.S.	444-22	\$ 48	Dic-22	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	413-19	\$ 33	Jun-23	Liquidado
Compañía pedagógica SAS	482-22	\$ 9	Feb-23	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	412-19	\$ 3	Oct-21	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization for Development Cooperation	593-20	-	Ene-21	Liquidado



## Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2024





Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Herencia Colombia	\$ 276

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Fortalecimiento de la gestión integral en áreas protegidas	\$ 2.990
Defensa judicial	\$ 1

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 13.596

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia	1062-21	\$ 6.200	Dic21 - Abr24	100%
Estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana	Corporación grupo empresarial ASES	418-22	\$ 2.776	Ago22 - Abr24	37%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Nevados	321-22	\$ 1.561	May22 - Sep23	90%
Prestación de Servicios Persona Natural	19 CPS	N/A	\$ 1.387	Ene22 - May24	71%
Fortalecimiento de la gestión integral en las áreas protegidas	INVEMAR	228-24	\$ 761	Pendiente acta	0%
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	Consorcio Interparques 22	322-22	\$ 330	Abr22 - Abr23	27%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	N/A	4%
Interventoría	Consorcio Macaram	419-22	\$ 281	Ago22 - Abr24	35%

\$ 13.596\*

60%

EJECUCIÓN

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

**Terminados**  
**\$ 6.382**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Consortio Ingeurbano	1026-21	\$4.602	Feb-23	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	14 CPS	\$1.093	Ago-22	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	9 CPS	\$ 681	Sep-21	Liquidado
Publica S.A.S.	327-22	\$ 7	Abr-23	Liquidado



## Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2024





Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 1.377

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Defensa judicial	\$ 3





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	\$ 10.000	Sep21 - Jul23	99%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	\$ 7.000	Nov21 - Dic23	100%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	\$ 7.000	Sep21 - Nov23	90%
		708-21	\$ 5.000	Sep21 - Mar23	88%
Prestación de Servicios Persona Natural	39 CPS	N/A	\$ 4.353	Jul21 - Feb25	66%
Adquisición de insumos para dotación de viveros	Universidad de Cordoba	152-22	\$ 5.686	Mar22 - May23	18%
Implementar acciones de restauración ecológica	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia	1089-21	\$ 2.975	Mar22 - Dic23	80%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	\$ 1.469	Nov21 - Jul23	100%





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Negocios verdes	Innpulsa Colombia	1028-21	\$ 1.300	Ene22 - Jul23	90%
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Consortio Arqmara Estoraques	367-22	\$ 1.235	Ago22 - Dic23	39%
Implementar un esquema de pago por servicios	Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge	219-22	\$ 823	Feb22 - Jul23	67%
Fortalecimiento de la gestión integral en las áreas protegidas	INVEMAR	228-24	\$ 756	Pendiente acta	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	N/A	77%
Interventoría	Consortio estoraques HC	420-22	\$ 258	Ago22 - Dic23	25%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA Ltda.	425-22	\$ 113	Ago22 - Oct23	96%





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ013	\$ 55	Indeterminado	0%
Defensa judicial	Garrigues Colombia S.A.S.	IAJ014	\$ 41	Indeterminado	0%



Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 66.550

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Masbosques	1047-21	\$ 9.990	Feb-23	En proceso de Liquidación
Masbosques	224-22	\$ 7.434	Ago-23	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	128 CPS	\$ 7.298	Abr-22	En proceso de Liquidación
Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarena	1090-21	\$ 4.106	Dic-22	En proceso de Liquidación
Masbosques	774-21	\$ 3.971	Sep-22	Liquidado
Invemar	181-22	\$ 3.849	Jul-22	Liquidado
Universidad Nacional abierta y a distancia	1121-21	\$ 3.320	Oct-22	Liquidado
Arquiteck y asociados SAS	309-22	\$ 3.278	Nov-22	En proceso de Liquidación
Consorcio Arqmara Tayrona	311-22	\$ 3.008	Dic-22	En proceso de Liquidación
Corporación Ambiental Empresarial	429-21	\$ 2.940	Mar-23	Liquidado
Ecoflora SAS	772-21	\$ 2.345	Jun-22	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	35 CPS	\$ 2.148	Oct-21	Liquidado
RTVC	216-22	\$ 1.727	Dic-22	Liquidado
Consorcio Arqmara Iguaque	316-22	\$ 1.605	Mar-23	En proceso de Liquidación

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 66.550

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corpocaldas	35-22	\$ 1.500	Mar-23	En proceso de Liquidación
Universidad pontifica Bolivariana	1083-21	\$ 1.000	Nov-22	En proceso de Liquidación
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	1048-21	\$ 1.000	Ene-23	En proceso de Liquidación
Consorcio Arqmara Corales	319-22	\$ 871	Mar-23	En proceso de Liquidación
Valencia Producciones FX	878-21	\$ 757	Abr-22	En proceso de Liquidación
Wework	720-21	\$ 756	Sep-22	Liquidado
EMTEL E.S.P.	906-21	\$ 589	Oct-22	Liquidado
Saving the Amazon	1027-21	\$ 510	Mar-23	Liquidado
Coolechera	220-22	\$ 486	Oct-23	En proceso de Liquidación
Policía Nacional	689-21	\$ 400	Nov-22	Liquidado
Corporación Grupo Empresarial ASES	312-22	\$ 286	Feb-23	En proceso de Liquidación
Corporación Grupo Empresarial ASES	310-22	\$ 232	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	843-21	\$ 206	Oct-22	En proceso de Liquidación
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico	1112-22	\$ 200	Nov-22	En proceso de Liquidación

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 66.550

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Telecafé Limitada	1084-21	\$ 200	Mar-22	En proceso de Liquidación
Consortio JD 044	317-22	\$ 189	Abr-23	En proceso de Liquidación
Publica S.A.S.	327-22	\$ 132	Abr-23	Liquidado
703 S.A.S.	709-21	\$ 91	Oct-21	Liquidado
Pradilla Nuñez SAS	911-21	\$ 75	Dic-21	En proceso de Liquidación
I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	\$ 50	Dic-21	En proceso de Liquidación



# Agencia Nacional de Tierras 2019

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral (compra de predios)



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2024





Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible ANT 2019	\$ 234.963

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Compra de predios	\$ 484.034
Defensa judicial	\$ 0,45





Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Avalúos comerciales y/o levantamientos topográficos	<a href="#">ANT</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DECLARATORIA DE FALLIDA - BLOQUE I</li> <li>2. DECLARATORIA DE FALLIDA - BLOQUE II</li> <li>3. URBANOS Y RURALES S.A.S. - BLOQUE III</li> <li>4. ARBITRIUM S.A.S. - BLOQUE IV</li> <li>5. LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE CUNDINAMARCA – LONJACUN S.A.S. - BLOQUE V</li> <li>6. ECOMPASS S.A.S. - BLOQUE VI</li> <li>7. CONSORCIO APRA-ITGA - BLOQUE VII</li> <li>8. GEOLANDCOL S.A.S. - BLOQUE VIII</li> </ol>	\$ 40.000	22 de marzo de 2024

Disponibles

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución  
\$ 75.363

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 56.728	N/A	100%
Realizar, desarrollar y entrega de avalúos	Y Lonja de Propiedad Raíz de Cundinamarca S.A.S LONJACUN	1403-23	\$ 8.000	Dic23 - Abr24	0%
	Avaluadores Profesionales Asociados S.A.S APRA S.A.S.	50-24	\$ 4.000	Ene24 - May24	0%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 2.230	Sep21 - Sep23	50%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 1.344	Jul21 - Sep23	24%
Levantamiento de información y diligenciamiento de FISO	Consultores en información Infométrika S.A.S.	466-22	\$ 1.982	Oct22 - Sep23	0%
Contratos de prestación de servicio	10 CPS	-	\$ 579	Dic23 - Jul24	21%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 500	N/A	0%

\$ 75.363\*

76%

EJECUCIÓN



Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 1.303	Mar23	En proceso de liquidación
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 49	May21	Liquidado



## KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2020 - 2025





Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible KFW	\$ 22.697

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 594



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar y ejecutar proyectos priorizados	Consorcio AB Caquetá	1116-23	\$ 9.821	Oct23 - Mar25	40%
	UT San José 2023	1107-23	\$ 9.801	Sep23 - Feb25	5%
	Corporación Grupo Empresarial ASES	1063-23	\$ 9.640	Sep23 - Feb25	5%
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	Gopa Infra GMBH Sucursal Colombia	355-22	\$ 5.928	Ago22 - Ago25	45%
Interventoría	Yolanda Cabrera Balcázar	1053-23	\$ 1.764	Sep23 - Abr25	10%
	Parque natural El Retiro S.A.S.	1064-23	\$ 1.764	Sep23 - Abr25	9%
	Unión Temporal InterCaquetá	1123-23	\$ 1.764	Sep23 - Abr25	6%
Solución de software para control de proyectos	Business Intelligence Software Assessor Corporation S.A.S. BIC	1191-23	\$ 1.510	Nov23 - Nov24	5%





Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	6 CPS	N/A	\$ 530	Mar23 - Mar24	96%
Adquisición de camioneta	Distribuidora Los Coches	907-23	\$ 214	Ago23 - Oct23	100%
Arrendamiento	Fernando Cruz	649-23	\$ 87	May23 - Nov25	31%
Suministro de drones	GO-Drone S.A.S.	922-23	\$ 62	Sep23 - Nov23	68%
Adquisición de licenciamiento ArcGIS	ESRI Colombia S.A.S.	1177-23	\$ 55	Oct23 - May24	0%
Gastos de ARL	N/A	N/A	\$ 15	N/A	96%





Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S.	594-23	\$ 691	Jul-23	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1 CPS	\$ 100	Ene-23	Liquidado
Jimmy Pimentel	705-23	\$ 66	Ago-23	Liquidado
Grupo Supermotos S.A.S.	840-22	\$ 37	Abr-23	Liquidado





## AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2020 - 2024





Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible AFD	\$ 393



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF International	509-22	\$ 735	Nov22 - Oct23	100%
Estrategia de comunicación	Fundación Trenza	946-23	\$ 93	Jul23 - Dic23	100%
Estrategia de comunicación	RQ Comunicación Creativa S.A.S.	947-23	\$ 85	Ago23 - Dic23	100%





Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
ADEL CCZ - RM - DM	394-22	\$ 588	Abr-23	Liquidado



## VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible  
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2024



# Visión Amazonía



Disponible	
Nombre corto	Valor
Disponible Visión Amazonía	\$ 64

# Visión Amazonía



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$1.894	Nov20 - Mar23	100%
	ONF Andina Sucursal Colombiana	1429-23	\$ 842	Feb24 - Feb25	0%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 734	Nov20 - Oct24	100%
	Fundación equal Colombia	123-22	\$ 709	Mar22 - Ene24	100%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	\$ 680	Abr22 - Abr24	100%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	\$ 576	Mar22 - Nov23	100%
	ASOGANADO	787-20	\$ 432	Nov20 - Mar23	100%
	ASOPRODAMET	285-22	\$ 396	Mar22 - Abr23	100%
	Asociación de economía solidaria del medio y bajo Caguán - ASOES	648-23	\$ 373	Jul23 - Jul24	100%
		286-22	\$ 277	Mar22 - Sep23	100%
Instituto amazónico de investigaciones científicas SINCHI	97-22	\$ 218	Jun22 - Dic24	100%	
Planificación predios	11 CPS	N/A	\$ 233	Ago23 - Feb24	56%




# Visión Amazonía



Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
ASOHECA	859-20	\$ 518	Oct-22	En proceso de liquidación
CORPOJAGUAR	789-20	\$ 382	Nov-22	En proceso de liquidación
Manufacturas e Inversiones Alsava	869-23	\$ 45	Sep-23	Liquidado
Rape Región Central	443-22	\$ -	Sep-23	Liquidado
Prestación de servicios	1 CPS	\$ -	Sep-23	Liquidado





## Niñez y Adolescencia ICBF



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Acompañar a las niñas, los niños y adolescentes en la construcción de sus planes de vida, a través de procesos de formación basados en metodologías participativas para el fortalecimiento de sus habilidades, la exploración de sus vocaciones, la potencialización de sus talentos, el fortalecimiento de hábitos de cuidado para la salud mental, el fortalecimiento de los entornos próximos de desarrollo, así como la incidencia en los determinantes sociales de los riesgos específicos con mayores afectaciones en sus territorios.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2026





Disponibles	
Nombre corto	Valor
Disponibles ICBF Sacúdete	\$ 58.296

En trámite	
Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 478
Defensa judicial	\$ 179

# Niñez y Adolescencia ICBF



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Contratos de prestación de servicios	3 CPS	N/A	\$ 283	Pendiente acta	0%
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 108	N/A	1%



# Niñez y Adolescencia ICBF

Disponible

En Trámite

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados  
\$ 30.662

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Asociación Colombiana Renaciente	925-21	\$ 2.246	May-22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	\$ 1.977	May-22	Liquidado
FUNDAFES	853-21	\$ 1.655	Abr-22	Liquidado
FUNDAFES	968-21	\$ 1.544	Jun-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	986-21	\$ 1.503	Jul-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	\$ 1.319	Jun-22	Liquidado
Universidad del Magdalena	724-21	\$ 1.232	Abr-22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	740-21	\$ 1.469	Abr-22	Liquidado
Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	\$ 995	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	\$ 940	Abr-22	Liquidado
Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	\$ 965	Abr-22	Liquidado
Corporación Oxsan	856-21	\$ 963	Abr-22	Liquidado
Corporación Trigal del Norte	722-21	\$ 904	Mar-22	Liquidado
CORPOASES	839-21	\$ 852	Jun-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	808-21	\$ 802	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social Creciendo	698-21	\$ 794	Mar-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# Niñez y Adolescencia ICBF



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	\$ 768	Mar-22	Liquidado
Fundación para el desarrollo y soluciones	812-21	\$ 761	Jun-22	Liquidado
Prestación de servicios	10 CPS	\$ 735	Sep-22	En proceso de Liquidación
AEMG	987-21	\$ 735	Jun-22	Liquidado
Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	\$ 725	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el desarrollo y soluciones	813-21	\$ 715	Jul-22	Liquidado
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	\$ 705	Abr-22	Liquidado
Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	\$ 622	Abr-22	En proceso de Liquidación
FAVANSO	855-21	\$ 647	May-22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP	988-21	\$ 608	Jun-22	Liquidado
Universidad del Magdalena	814-21	\$ 548	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	\$ 511	Mar-22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP IS	840-21	\$ 457	Jun-22	Liquidado
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	\$ 477	Jun-22	En proceso de Liquidación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  
 \*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# Niñez y Adolescencia ICBF



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Fundalianza	910-21	\$ 437	Jun-22	Liquidado
Universidad del Magdalena	900-21	\$ 349	Jun-22	En proceso de Liquidación
Corpollanos	924-21	\$ 344	May-22	Liquidado
Fundalianza	908-21	\$ 249	Jun-22	En proceso de Liquidación
UT San Pedro	743-21	\$ 107	Sep-22	Liquidado
Vélez Tours SAS	217-22	\$ 0,7	Sep-22	Liquidado



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  
 \*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas





## Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Proceso de Cierre



Temporalidad: 2023



# Zona ZEII Catatumbo



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Unión temporal Ludark	391-22	\$ 210	Oct-22	Liquidado
1 CPS	N/A	\$ 110	Oct-22	Liquidado



Disponible  
\$ 94.951

En Trámite  
\$ 1.943

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ 17.091

Adjudicación  
\$ -

Ejecución  
\$ 45.761

Terminado  
\$ 6.335

## Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2024

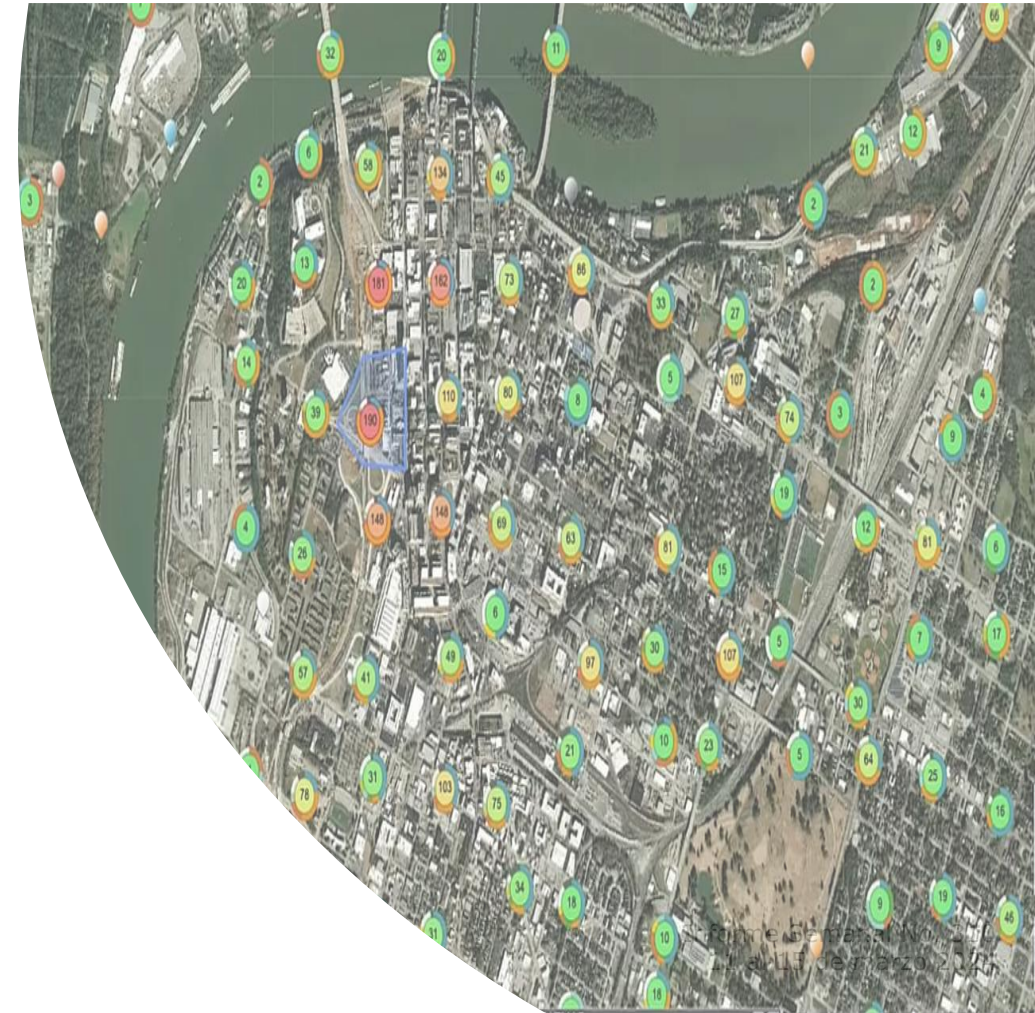

# Catastro Multipropósito



Disponibles	
Nombre corto	Valor
Disponibles Catastro Multipropósito	\$ 94.951

En Trámite	
Nombre corto	Valor
Tiquetes aéreos	\$ 1.320
Contratos de prestación de servicios	\$ 623

# Catastro Multipropósito



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Transporte multimodal	<u>IGAC</u>	\$ 17.091	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNIÓN TEMPORAL TSS FCP 2024</li> <li>2. TRANSPORTE ESPECIALES ACAR S.A.</li> <li>3. UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSPORTE MULTIMODAL OTE 2024</li> <li>4. UNIÓN TEMPORAL CATASTRO 2024</li> <li>5. UNIÓN TEMPORAL TDS</li> <li>6. TRANSPORTES ESPECIALES AYS S.A.S.</li> <li>7. UNIÓN TEMPORAL TRANS UNIDOS FCP</li> <li>8. UT TRANSPORTE IGAC-FCP 2024</li> <li>9. UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE TCMR</li> <li>10. CONSORCIO TRANSPORTE TNEAT</li> <li>11. AS TRANSPORTES</li> <li>12. UT VIACOOOP</li> </ol>	02 de abril de 2024

# Catastro Multipropósito



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Empresa de servicios temporales	Punto Empleo S.A.S	202-24	\$21.578	Pendiente acta	0%
Generar Productos Cartográficos	UT Carto 044 2022	483-22	\$ 6.354	Sep22 - Mar24	52%
Operador logístico	Unión temporal para la Paz 2023 SMA	116-24	\$ 5.000	Ene24 - Ene25	0%
Servicio de transporte multimodal	Unión temporal TCSC - Sabana FCP 2024	114-24	\$ 4.849	Ene24 - Ene25	0%
Adquirir estaciones de referencia de operación continua CORS	Datum Ingeniería S.A.S.	837-22	\$ 3.046	Ene23 - Ago23	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	21 CPS	N/A	\$ 2.666	Pendiente acta	0%
Arrendamiento de inmuebles	ALDESARROLLO	211-24	\$ 1.242	Pendiente acta	0%
Captura de coordenadas de precisión	Consortio apoyo PDET	562-22	\$ 535	Ene23 - Oct23	89%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 247	N/A	0%
Tiquetes aéreos	Publica S.A.S.	52-24	\$ 244	Ene24 - Ene25	0%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.  
 \*La variación corresponde a la suscripción de 6 CPS y al CDP de gastos de desplazamiento

# Catastro Multipropósito



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Unión temporal Ingecálculo	387-22	\$ 4.940	Feb-22	Liquidado
Geospatial S.A.S	386-22	\$ 1.132	Nov-22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 13 CPS	N/A	\$ 263	Mar-22	Liquidado





## Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz  
Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales



Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.



Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 2024



# Zona ZEII Catatumbo - Catastro



Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Operación Catastral	Geodesia por Satélite de Colombia LTDA.	2-23	\$ 1.082	Feb23 - Sep23	100%
	Asomunicipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña Y Sur del Cesar	422-22	\$ 194	Ago22 - Nov23	80%
	Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar - ASOMUNICIPIOS	188-24	\$ 78	Feb24 - Jun24	0%



# Zona ZEII Catatumbo - Catastro



Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar.	218-22	\$ -	May 22	Liquidado





Fondo Colombia  
en Paz - **FCP**



[www.fcp.gov.co](http://www.fcp.gov.co)



@fcolombiapaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz
