INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

04 al 08 de noviembre de 2019

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución
- BID Préstamo
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 2.301.120	$ 2.274.561	$ 26.559
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 1.904.699	$ 1.889.330	$ 15.369
TOTAL EJECUTADO	$ 1.493.224	$ 1.485.157	$ 8.066

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $3.035 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.271.052	$ 1.076.032	85%	$ 195.020	15%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 409.751	$ 398.302	97%	$ 11.449	3%
Reincorporación	$ 368.443	$ 302.005	82%	$ 66.438	18%
BID Préstamo	$ 96.885	$ 12.870	13%	$ 84.015	87%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.218	$ 42.668	96%	$ 1.549	4%
Funcionamiento	$ 37.243	$ 32.596	88%	$ 4.647	12%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 21.703	$ 0	0%	$ 21.703	100%
Primera Infancia	$ 20.552	$ 19.615	95%	$ 937	5%
Estabilización	$ 14.196	$ 12.848	91%	$ 1.348	9%
BID Facilidad	$ 9.650	$ 358	4%	$ 9.292	96%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.870	$ 2.847	99%	$ 23	1%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 2.301.120	$ 1.904.699	83%	$ 396.421	17%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera



Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.076.032	$ 986.731	92%	$ 89.301	8%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 398.302	$ 151.852	38%	$ 246.450	62%
Reincorporación	$ 302.005	$ 283.898	94%	$ 18.107	6%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 42.668	$ 26.441	62%	$ 16.227	38%
Funcionamiento	$ 32.596	$ 22.534	69%	$ 10.062	31%
Primera Infancia	$ 19.615	$ 5.580	28%	$ 14.035	72%
BID Préstamo	$ 12.870	$ 259	2%	$ 12.610	98%
Estabilización	$ 12.848	$ 8.555	67%	$ 4.294	33%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.847	$ 2.804	98%	$ 43	2%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
BID Facilidad	$ 358	$ 13	3%	$ 346	97%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 1.904.699	$ 1.493.224	78%	$ 411.475	22%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo

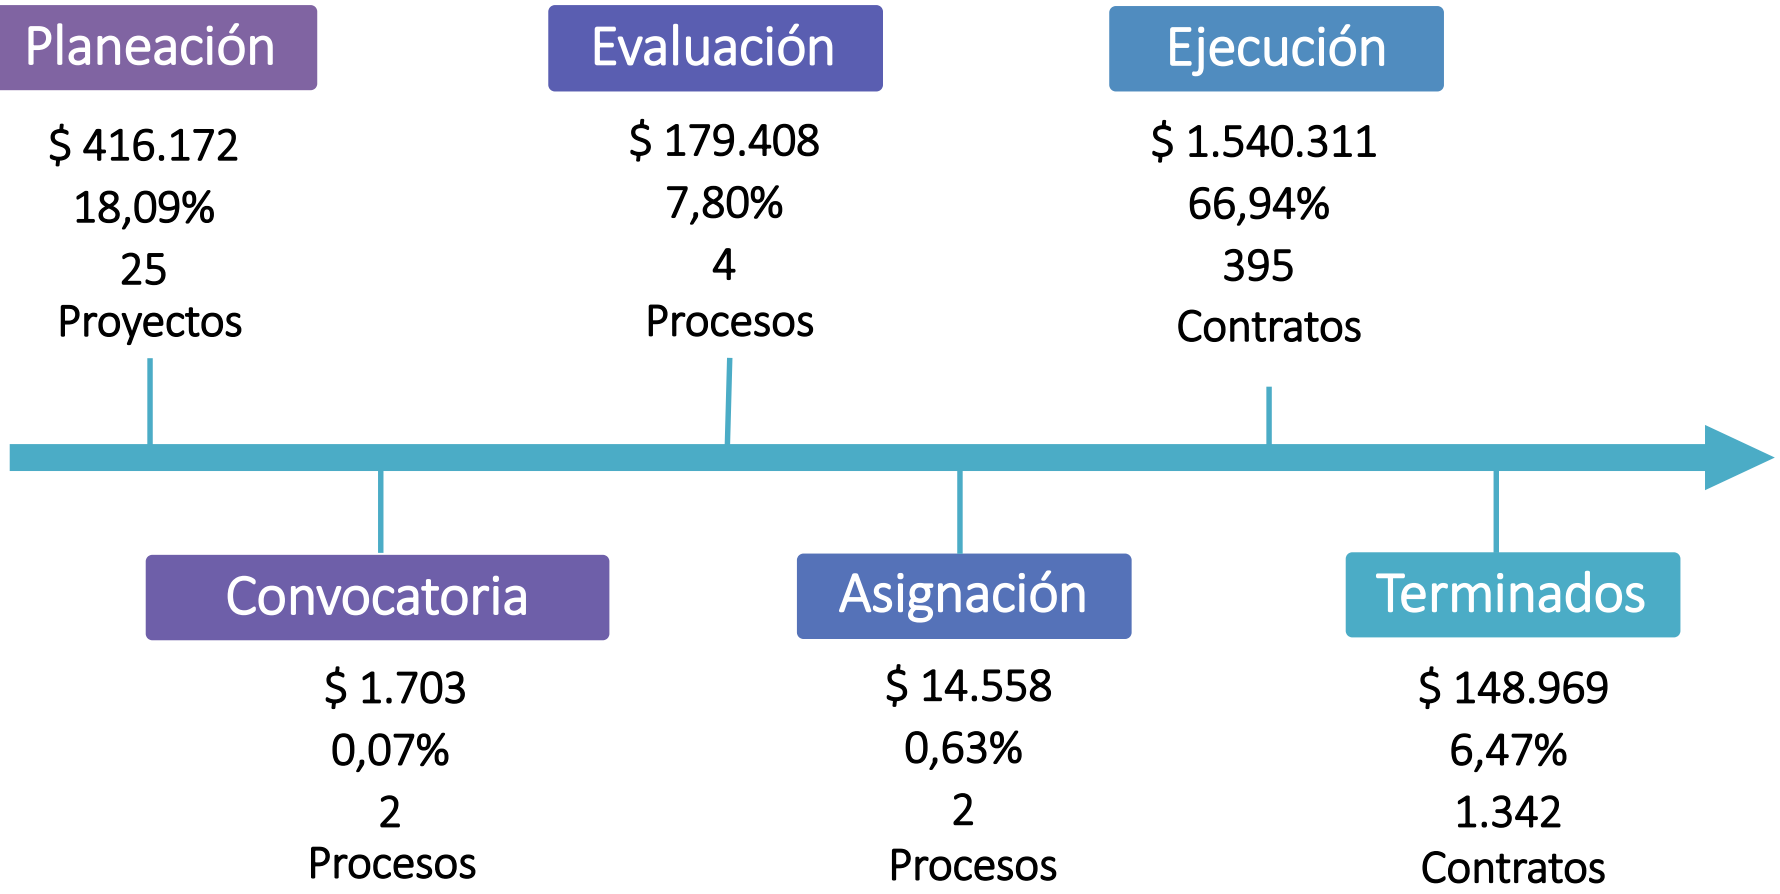

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 199.744	$ 1.703	$ -	$ -	$ 1.057.712	$ 11.894

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 199.744

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN

Nombre corto	Valor
Por asignar	$ 195.020
Arrendamiento	$ 2.945
Contratos de Prestación de Servicios	$ 1.450
Interventoría Fedecacao	$ 320
Tiquetes Aéreos	$ 9

Planeación | **Convocatoria $ 1.703** | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	$ 881	8 de noviembre 2019
Transporte Terrestre	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	$ 821	13 de noviembre 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 1.057.712** | Terminados

SUSTITUCIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$ 644.782	Nov 2017 Dic 2019	99%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	$319.078	Dic 2017 Jun 2020	82%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	$ 67.500	Sep 2017 Dic 2019	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 10.946	Ene 2018 Ene 2020	33%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	$ 9.791	Nov 2017 Oct 2020	77%
Prestación de Servicios Persona Natural	132	N/A	$ 4.891	Feb 2019 Oct 2020	18%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 724	N/A	7%

$1.057.712*

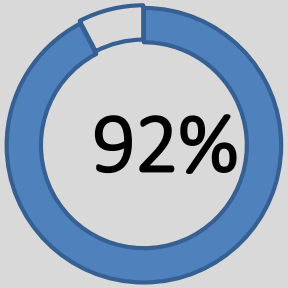

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*El incremento corresponde a pagos por asistencia alimentaria, adición al contrato AF002 y la suscripción de 12 contratos de Prestación de Servicios

SUSTITUCIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
5 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 305	dic-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 190	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 12.067	$ -	$ 173.900	$ -	$ 153.314	$ 70.470

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 12.067

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Valor
Por asignar ART	$ 11.449
Contratos de prestación de servicios	$ 461
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	$ 158

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	1. COMFACESAR – Caja de Compensación Familiar del Cesar 2. Consorcio GUAPI 2018 3. Cooperativa de Servicios y Comercialización PROINMAT 4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima 5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar 6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca Piedemonte 7. Global Communities 8. Unión Temporal Desarrollo Urabá Antioqueño 9. Consorcio Pacífico Medio PDET 10. Consorcio Construyendo Paz 11. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	15 de noviembre de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	12. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial 13. Consorcio Nuevo Catatumbo 14. Consorcio Obras para la Paz 2019 15. Consorcio Obras para la Paz VI 16. Consorcio CONSTRUPAZ 17. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 18. Condugas S.A. 19. Unión Temporal PDET Caguán 2019 20. Proyectos Paz Colombia 21. Unión Temporal Desarrollo Montes de María 22. Global Communities 23. Unión Temporal Proyectos Paz Colombia 24. Unión Temporal Territorio 2019	15 de noviembre 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	25. Consorcio FUNDYPROC 26. Fundación Plan 27. Fundación Plan 28. Consorcio PDET Urabá 2019 29. Unión Temporal Virgen de la Candelaria 30. Unión Temporal los Manglares 31. Unión Temporal ASOPRO – OBRAS 2019 32. Unión Temporal Obras Urabá 33. Unión Temporal Bolívar en Paz 34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca para la Paz 35. Consorcio Choco 11 36. Consorcio Catatumbo	15 de noviembre 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	37. Caja de Compensación Familiar del Choco – COMFACHOCO 38. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Montes de María 39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO 40. Consorcio EGA 41. Unión Temporal Enfoque Territorial 42. Unión Temporal Alto Patía 43. SANGEM S.A.S. 44. Unión Temporal Obras de Paz 45. Consorcio Proyectos Montes de María 46. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 47. Unión Temporal Obras PDET 48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 OHAL – CONSUCOL 49. Unión Temporal Obras PDET 2019	15 de noviembre 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	50. Unión Temporal GHM Arauca 51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 54. Electrizaje S.A.S. 55. Consorcio Arauca FCP 2019 56. Unión Temporal Desarrollo Sierra Nevada 57. Unión Temporal PDET Arauca 2019 58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019 59. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Sierra Nevada 60. Consorcio EGA 61. Constructora INCO S.A.S. 62. Consorcio Paz S.A.S. 63. Consorcio EGA	15 de noviembre 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría	ART	$ 22.177	1. Consorcio V-2C-I 2. Consorcio PDET INCO – NOG 3. Consorcio Nueva Alianza 4. Consorcio JMS 5. Consorcio Interobras 2019 6. Consorcio Interproyectos 20109 7. Grupo Solutions S.A.S. 8. Consorcio Tecni ART 9. Consorcio Bienestar Comunitario 10. Consorcio Interproyectos DMCT 2019 11. Consorcio Territorios – ART 12. Consorcio Territorios – ART 13. Consorcio Comunitario 2019 14. Consorcio Comunitario 2019	Suspendida

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.900** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría	ART	$ 22.177	15. Sociedad Técnica Sota Ltda. 16. 360 Mantenimiento y Construcción S.A.S. 17. J.A.H. Ingeniería Industrial S.A.S. 18. Unión Temporal Colombia en Paz 19. Unión Temporal Vive Colombia 20. Consorcio PDET INCO – NOG	Suspendida

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 153.314** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	Feb18 – Jun20	64%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	Mar18 – Feb20	64%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	$16.467	May18 – Feb20	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	Mar18 – Feb20	71%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	$13.890	Feb18 – Ene20	60%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	$8.769	May18 – Feb20	32%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	Feb18 – Dic19	64%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	Feb18 – Suspendido	63%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	Feb18 – Feb20	60%
	Corporación Prohaciendo	542-18	$2.759	Mar18 – Dic19	74%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	Abr18 – Suspendido	57%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$5.272	Ene19 – Dic19	10%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$5.225	Ene19 – Dic19	8%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	$ 5.187	Jul19– Jul20	30%
Prestación de Servicios	109 OPS	N/A	$5.569	Abr19 –Jul20	42%

$153.314*

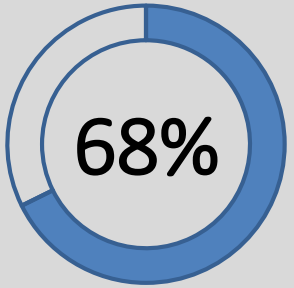

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*El incremento corresponde a la suscripción del contrato 292-19

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 153.314** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Hoja de ruta	Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	$ 1.965	Ago19 – Feb20	10%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	160-19	$ 1.916	Ago19 – Ago20	18%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	$ 1.341	Oct19 – Jul20	0%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$1.036	Feb19 – Nov19	50%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$990	Ago18 – Nov19	73%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$440	Jun19 – Dic19	10%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$470	N/A	52%

$153.314*

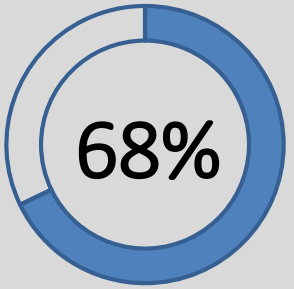

EJECUCIÓN

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*El incremento corresponde a la adición del CDP de gastos de desplazamiento.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 70.470

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$52.764	feb-19	Liquidado
943 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 17.267	feb-19	En proceso de liquidación
46 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 429	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 10	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 66.438	$ -	$ -	$ 11.883	$ 277.215	$ 12.907

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 66.438

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	$ 66.438

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 11.883** | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Víveres Secos	ARN	Consorcio Semillas para Alimentar	$ 11.883	18 de noviembre de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 277.215** | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 215.271	Sep 2017 Sep 2020	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 25.728	Sep 2017 May 2020	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	$ 19.895	Jun 2018 Dic 2019	100%
Víveres Secos y Víveres Frescos	Integral Servicios S.AS.	42-19	$ 12.219	May 2019 Nov 2019	67%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa	142-19	$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	47%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	$ 526	Feb 2019 Nov 2019	50%

$277.215*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*El incremento en la ejecución corresponde a pagos de BEPS y Pensión

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$ 4.037	may-19	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$1.050	jun-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.669	$ -	$ -	$ -	$ 17.025	$ 25.523

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 1.669

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	$ 1.549
Contratos de Prestación de Servicios	$ 120

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 17.025** | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	$9.139	Ago2019 Ago2020	0%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	$5.376	Jul2019 Mar2022	3%
Prestación de Servicios Persona Natural	21	N/A	$1.764	Nov 2018 Sep2020	34%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	Ene 2019 Suspendido	40%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	Jun 2018 Nov 2019	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$80	N/A	71%

$17.025

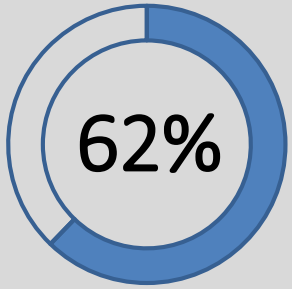

EJECUCIÓN

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 25.523**

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
131 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 5.467	nov-18	Liquidado
87 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 3.666	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$485	abr-19	En proceso de liquidación
IFX Networks Colombia SAS	796-18	$363	oct-79	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	mar-19	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 3.102	$ -	$ 3.707	$ 2.675	$ 5.861	$ 5.207

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 3.102

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	$ 1.100
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	$ 1.004
Por asignar Primera Infancia	$ 937
Contratos de prestación de servicios	$ 61

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 3.707** | Asignación | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	$ 3.707	1. Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación. 2. Fundación para el Fomento de la Lectura	14 de noviembre de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 2.675** | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	$ 2.675	18 de Noviembre de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 5.861** | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Modalidad Familiar	Fundación de Atención a la Niñez	213-19	$1.846	Sep 2019 Abr 2020	0%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	$1.499	Sep 2019 Ago 2020	0%
Modalidad Familiar	Fundación Hogar Juvenil	211-19	$1.096	Sep 2019 Abr 2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	17	N/A	$919	Ene 2019 Mar 2020	40%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$341	N/A	0,2%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$160	Jun 2019 Dic 2019	0,4%

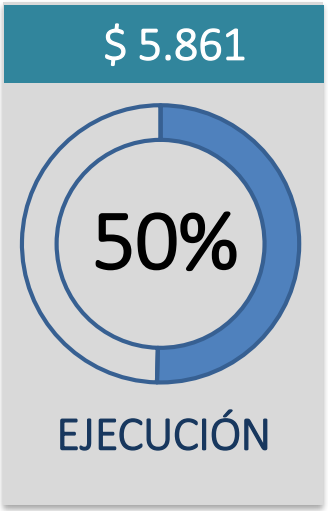

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 5.207

PRIMERA INFANCIA

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$ 1.076	ago-18	Liquidado
29 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 874	feb-19	Liquidado
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 59	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.847

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 23

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre corto	Valor
Por asignar ANT	$ 23

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.847

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
68 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 2.423	dic-18	En proceso de liquidación
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 419	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 4.647	$ -	$ -	$ -	$ 24.157	$ 8.439

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 4.647

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	$ 4.647

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 24.157** | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18	$ 9.571	Abr18 - May19	65%
Nómina	N/A	N/A	$ 5.309	Sep17 - Oct19	77%
Nómina	Gente Oportuna S.A.S.	43-19	$ 4.076	May19 - Feb20	60%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 1.773	Nov18 - Oct19	2%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	40-19	$ 1.585	May19 - Feb20	45%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	$ 643	May19 - Mar20	30%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 564	Dic18 - Dic20	43%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-2019	$200	Jun19 - Dic19	10%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	$ 79	May19 - May20	31%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 77	Ene18 - Dic19	38%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 29	Feb19 - Dic19	23%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 190	N/A	11%
Adecuaciones	Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	$ 34	Oct19 - Nov19	0%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	108-19	$ 15	Jun19 – N/A	92%
Servicios	Irotama SAS	280-19	$ 7	Sep19 – Nov19	96%
Servicios	Vector Ltda.	375-19	$ 5	Nov19 – Nov19	0%

$24.157*

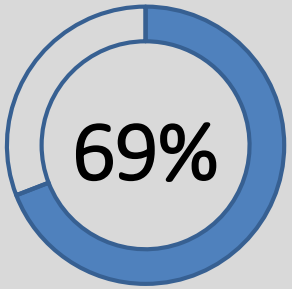

EJECUCIÓN

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*El incremento corresponde al aumento en CDP de nomina y al CDP de gastos de desplzamiento.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 8.439**

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	$ 605	Jul19	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 335	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 308	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 8.439**

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 7	jun-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	$ 5	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.348	$ -	$ 1.800	$ -	$ 3.923	$ 7.125

Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 1.348

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

ESTABILIZACIÓN

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	$ 1.348

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 1.800** | Asignación | Ejecución | Terminados

ESTABILIZACIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	$ 1.800	1. Consorcio Eventos y Logística CPE y DAPRE 2019 2. U.T. Logística Social 3. Sotavento Group S.A.S. 4. U.T. Logística Integral FCP 2019 5. Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios S.A.S. 6. Red Logística y Gestión S.A.S. 7. Douglas Trade S.A.S. 8. Geometry Global Colombia S.A.S. 9. Imagen y Color Publicitario S.A.S. 10. Marcas Vitales BMV S.A.S. 11. Dreams Event Planning Services S.A.S. 12. Eventos y Protocolo Empresarial S.A.S.	21 de noviembre de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 1.800** | Asignación | Ejecución | Terminados

ESTABILIZACIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	$ 1.800	13. Dubrands S.A.S. 14. A2 Marketing Producción de Eventos Conciertos y Publicidad S.A.S. 15. Dinamo Eventos S.A.S. 16. Century Media S.A.S. 17. Unión Temporal Novatour – Prime Producciones 06 de 2019 18. U.T. Visión Paz 2019 19. Atenas Asesorías y Comunicaciones S.A.S.	21 de noviembre de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 3.923** | Terminados

ESTABILIZACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	23	N/A	$2.533	Dic 2018 Oct 2020	36%
Campaña de Desminado	Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	Feb 2018 Suspendido	50%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 300	Jun 2019 Dic 2019	5%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 75	N/A	76%
Gastos Varios	N/A	N/A	$ 24	N/A	73%

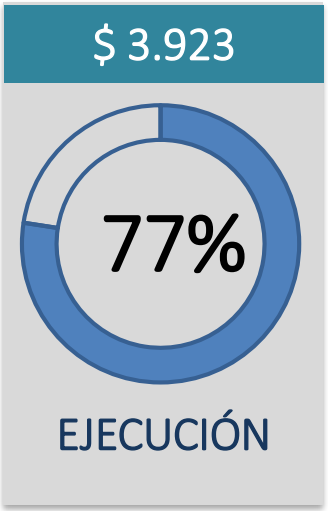

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 7.125

ESTABILIZACIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.770	jul-18	Liquidado
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 799	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 251	jul-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 164	jun-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	$16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En liquidación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 1.820

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.738

COLOMBIA SOSTENIBLE

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 96.040	$ -	$ -	$ -	$ 845	$ -

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 96.040

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

BID PRÉSTAMO

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	$ 84.015
Estructuración Integral de Proyectos	$ 10.390
Interventoría	$ 882
Contratos de Prestación de Servicios	$ 377
Auditoría	$ 375

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 845** | Terminados

BID PRÉSTAMO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Contratos de Prestación de Servicios	37	N/A	$723	Ago 2019 Nov 2019	31%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	$ 93	Ago 2019 Jun 2020	6%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 29	Ago 2019 Oct 2019	100%

$ 845

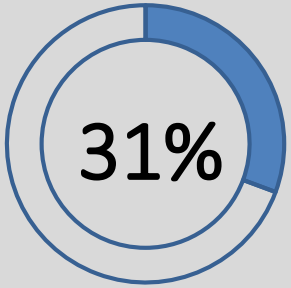

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 9.390	$ -	$ -	$ -	$ 260	$ -

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 9.390

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

BID FACILIDAD

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad Línea 13	$ 9.292
Tiquetes Aéreos	$ 99

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 260** | Terminados

BID FACILIDAD

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	12	N/A	$ 248	Ago 2019 Ene 2020	3%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 11	Ago 2019 Dic 2019	51%

$ 260*

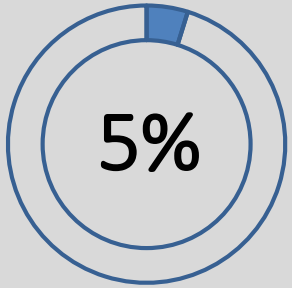

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*El incremento corresponde a la suscripción de 11 contratos de OPS

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 21.703	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 21.703

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 2019

Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	$ 21.703

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Fondos Multidonante para el Posconflicto

Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Noviembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 85.668.040
En ejecución (USD):	$ 80.9 millones
Gastos administrativos	$3.064.073
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

Total movilizado

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

NACIONES UNIDAS

111

Proyectos aprobados por USD $83.7 Millones (2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
	Total: USD 85.668.040*

*Con intereses Y devoluciones el total es de USD 87.2

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 36.9 millones
Presupuesto en ejecución (USD):	$ -
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD 36.9 mill

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 5.092.400	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
Noruega	USD 9.290.421	
Corea	USD 500.000	
Suecia		USD 4.719.455
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
Suiza	USD 491.592	USD 498.505
Total:	**USD 26.596.608**	**USD 10.300.191**

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia contribuirá con EUR 150.000
- PBF contribuirá USD 2.000.000 (para proyecto de la Comisión de la Verdad)

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2019
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	$ 6.860.000
Saldo disponible (dólares):	$ 80.000

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total

Fondo para la Paz y el Posconflicto

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

5 Proyectos aprobados

Donante	Recursos Registrados
Banco Mundial	USD 4.000.000
Suecia	USD 3.100.000
Total	USD7.100.000

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) **En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)** se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más.
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.970.810
Presupuesto en ejecución:	€ 74.300.580
Monto Proyectos en fase administrativa*:	34.500.000 (aproximadamente)
Saldo disponible:	7.370.230
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	8.800.000

Fondo Europeo para la Paz

EUR 116.840.133

EUR 2.320.677

Contribuciones pendientes

EUR 127.970.810*

Total Presupuesto Teórico

Fondo Europeo para la Paz

28

Proyectos en ejecución por un total de € 74.3* millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.890.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 3.000.000	
Francia	EUR 2.400.000	EUR 600.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 2.250.000	EUR 750.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 36.000	
Luxemburgo	EUR 40.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 30.000	
Suecia	EUR 2.146.323	EUR 970.677
CHILE	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Bank interests	EUR 775,62	
Total:	EUR 116.840.133	EUR 2.320.677

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	$ 250.000.000
Presupuesto en ejecución (dólares):	$ 8.540.000

BID

BID Colombia Sostenible

USD 19.658.355

Desembolsados al Fondo

USD 12.000.000

Contribuciones pendientes a febrero 2019, correspondientes al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 (líneas de trabajo 2018)

BID

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto "Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico" con el Fondo Acción y MADS	US$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US$ 1.5 Millones
TOTAL	US $ 8.540.000

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que iniciaron ejecución física y financiera 2019 *

BID

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US$ 1.14 Millones
Promoción de Estrategias Innovadoras para el Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación Ambiental	US$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de Proyectos e Innovación Territorial	US$ 1.00 Millones
TOTAL	US $ 4.360.000

Fondo Colombia Sostenible

BID

Donante	Recursos Desembolsados para el POA 2018	Recursos Desembolsados POA 2019**
Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
Suiza	USD 3.00.000	N/A
Total:		
*Componente de pago por resultados .	USD 19.658.355	USD 12.000.000

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD $ 5,479,312 que pasa al POA 2019*

- Noruega, anunció donación por USD$ 11 millones
- Suecia, anunció la donación de USD $ 1 millón
