INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de febrero de 2019

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución de Cultivos
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible BID
- Sociedad de Activos Especiales
- Presidencia Posconflicto
- Funcionamiento

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 1.668.950	$ 1.654.583	$ 14.368
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 1.109.073	$ 1.096.450	$ 12.623
TOTAL EJECUTADO	$ 948.907	$ 943.293	$ 5.614

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $886 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 970.252	$ 631.194	65%	$ 339.059	35%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 407.634	$ 209.092	51%	$ 198.542	49%
Reincorporación	$ 171.229	$ 169.597	99%	$ 1.632	1%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.493	$ 41.606	94%	$ 2.887	6%
Primera Infancia	$ 20.552	$ 18.539	90%	$ 2.013	10%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 4.618	$ 4.618	100%	$ 0	0%
Funcionamiento	$ 28.138	$ 18.447	66%	$ 9.691	34%
Presidencia Posconflicto	$ 14.285	$ 8.230	58%	$ 6.054	42%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 5.000	$ 5.000	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.750	$ 2.750	100%	$ 0	0%
TOTAL	$ 1.668.950	$ 1.109.073	66%	$ 559.877	34%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera



Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 631.194	$ 612.221	97%	$ 18.972	3%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 209.092	$ 109.698	52%	$ 99.395	48%
Reincorporación	$ 169.597	$ 166.251	98%	$ 3.347	2%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 41.606	$ 24.923	60%	$ 16.683	40%
Primera Infancia	$ 18.539	$ 5.172	28%	$ 13.367	72%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 4.618	$ 2.804	61%	$ 1.814	39%
Funcionamiento	$ 18.447	$ 12.867	70%	$ 5.580	30%
Presidencia Posconflicto	$ 8.230	$ 7.233	88%	$ 997	12%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 5.000	$ 5.000	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.750	$ 2.738	100%	$ 12	0%
TOTAL	$ 1.109.073	$ 948.907	86%	$ 160.166	14%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo

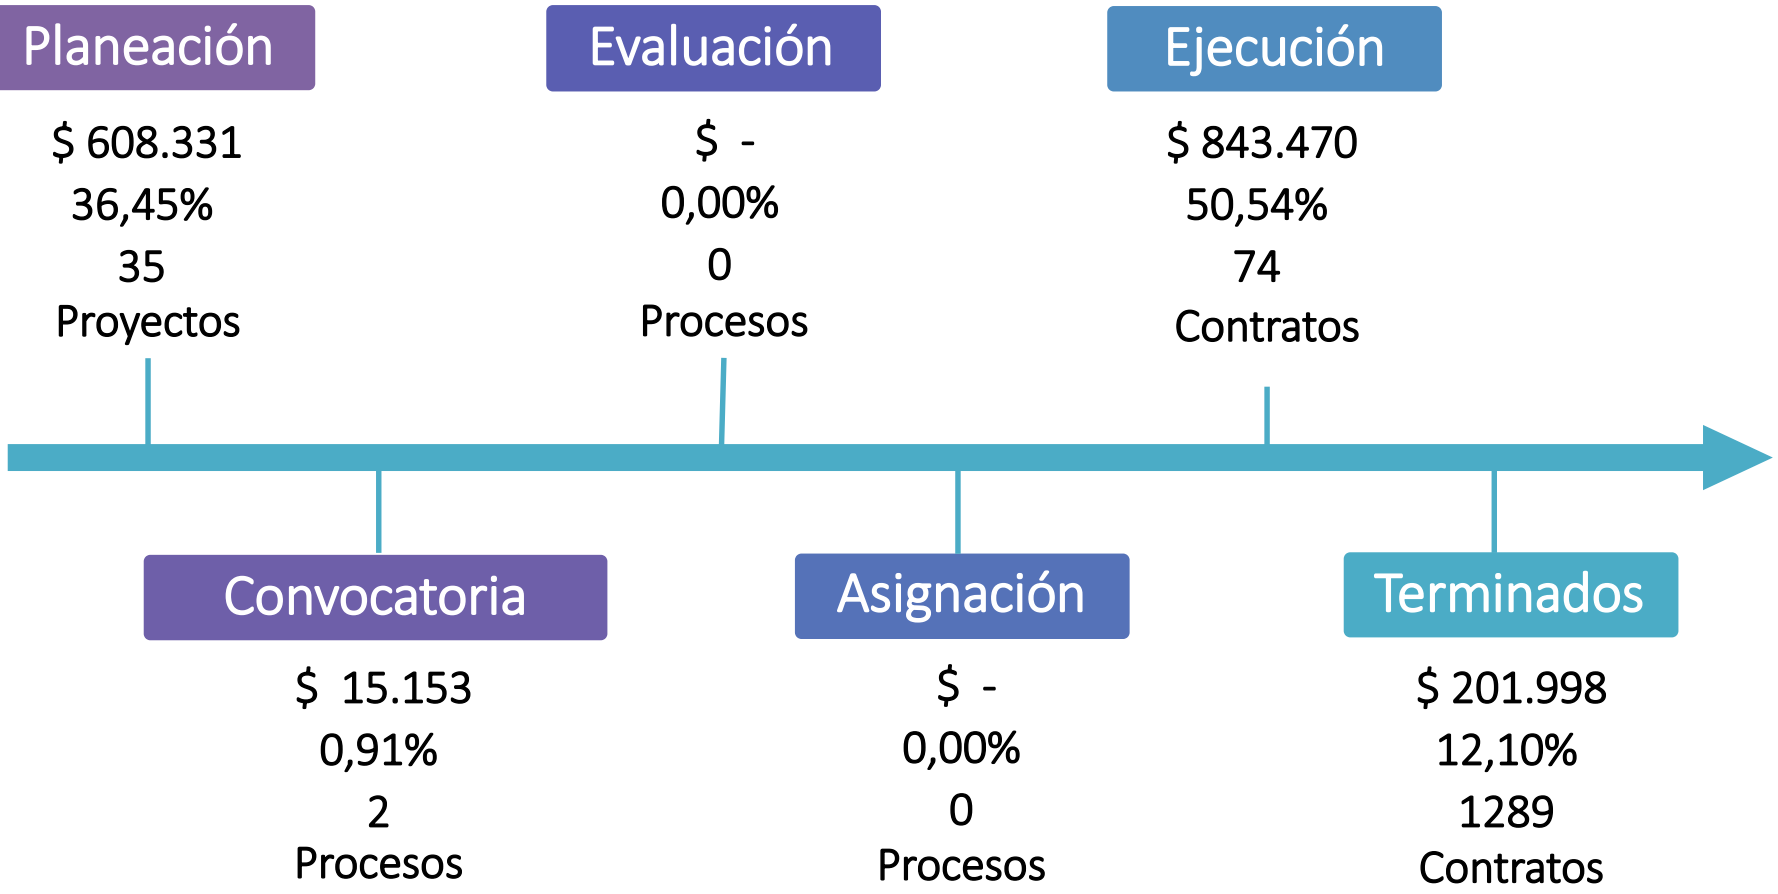

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 339.448	$ -	$ -	$ -	$ 500.660	$ 130.144

Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 339.448

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	$ 339.059	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecacao	$ 320	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	$ 60	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 9	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 500.660** | Terminados

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$405.323	Nov 2017 Mar 2019	100%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	$60.000	Sep 2017 Jul 2019	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$14.280	Ene 2018 Ene 2020	10%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	$9.825	Ene 2018 Mar 2019	70%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	$9.791	Nov 2017 Oct 2019	73%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	$880	Ene 2018 Oct 2019	88%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	$463	Jun 2018 Feb 2019	95%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	$75	Ago 2018 Mar 2019	78%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	$24	N/A	87%

$500.660*

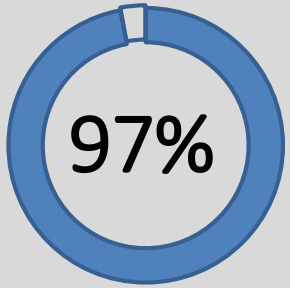

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aumenta el valor en ejecución debido al pago a familias por sustitución de cultivos ilícitos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 130.144

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	$129.855	dic-19	En proceso de liquidación
5 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$289	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 229.173	$ -	$ -	$ -	$ 159.113	$ 19.348

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 229.173 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	$ 198.542	ART	Por definir
Unión Temporal Urabá en desarrollo	$ 7.371	ART	Por definir
Consorcio Infraestructura Sostenible	$ 7.312	ART	Por definir
Adición contrato Carvajal	$ 4.701	ART	Por definir
Consorcio Caguán 2018	$ 4.595	ART	Por definir
Unión Temporal Guanga	$ 2.894	ART	Por definir
Unión Temporal Renacer 2017	$ 2.783	ART	Por definir
Corporación para la promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial	$ 891	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 85	ART	Por definir

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 159.113** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$51.448	Nov17 - Feb 19	92%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	$16.467	Feb18 - Jul19	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$14.959	Feb18 - Feb19	60%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$14.772	Mar18 - Feb19	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	$13.238	Feb18 -May19	51%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	$9.295	Feb18 - Feb19	60%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	$8.769	May18 - May19	25%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$5.641	Feb18 - Feb19	60%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	Feb18 - May19	48%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	Feb18 - Feb19	30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	Feb18 – May19	20%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$ 4.547	Ene19 – Oct19	0%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$ 4.252	Ene19 – Oct19	0%
Prestación de Servicios	25 OPS	N/A	$520	Nov18 - Jun19	61%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$1.036	Feb19 – Nov19	0%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$990	Ago18 - Jul19	0%
Viáticos	Viáticos	N/A	$120	Nov18 – Mar19	35%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	$10	Nov17 - Mar19	100%

$159.113

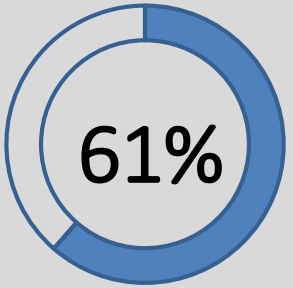

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 19.348

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
815 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$17.315	feb-19	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	$1.868	feb19	En proceso de liquidación
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$164	jul-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 4.452	$ -	$ -	$ -	$ 160.727	$ 6.050

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 4.452

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
SOLUCIONES J.R. E.U.	$ 2.820	ARN	Por definir
Por asignar ARN	$ 1.632	ARN	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 160.727** | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$137.888	Abr 2018 Feb 2019	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$15.929	Abr 2018 Feb 2019	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	$6.384*	Jun 2018 Feb 2019	100%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$526	Feb 2019 Nov 2019	0%

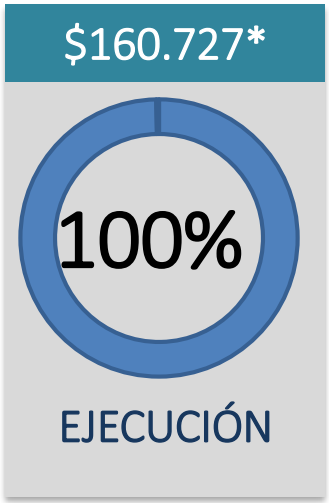

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
* El valor en ejecución aumenta debido al pago de Proyectos Productivos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 6.050

REINCORPORACIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 2.887	$ 15.153	$ -	$ -	$ 2.820	$ 23.632

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 2.887

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	$ 2.887	JEP	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | **Convocatoria $ 15.153** | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Sistema de Gestión Judicial	JEP	$ 9.708	15 de marzo de 2019
Gestión Documental	JEP	$ 5.446	22 de febrero de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 2.820** | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	793-18	$798	May 2018 Feb 2019	96%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 (2018)	N/A	$335	Ago 2018 Ago 2019	27%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	Ene 2019 Jun 2019	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$485	Abr 2018 Mar 2019	94%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	$250	May 2018 May 2019	48%
Servicio de Impresión	Solution Copy Ltda.	1082-18	$200	Nov 2018 Mar 2019	32%
Viáticos	N/A	N/A	$80	Oct 2018 Mar 2019	71%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	Jun 2018 Feb 2019	94%
Servicios Públicos	N/A	N/A	$6	Jun 2018 Dic 2018	100%

$2.820

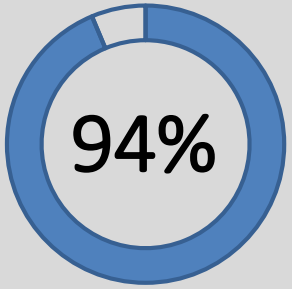

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 23.632

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
173 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 7.779	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
42 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 1.241	nov-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Universidad de los Andes	402-18	$ 597	Nov-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 15.081	$ -	$ -	$ -	$ 290	$ 5.180

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Consejería Presidencial para la Primera Infancia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 15.081

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar	$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	$ 3.741	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	$ 2.757	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	$ 2.013	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	$ 1.113	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	$ 1.048	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 373	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 290** | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	4	N/A	$290	Ene 2019 Dic 2019	8%

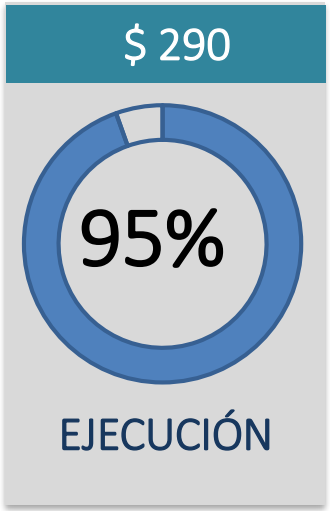

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 5.180

PRIMERA INFANCIA

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$ 1.089	ago-18	En proceso de liquidación
10 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 276	sep-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 617	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.186	$ -	$ -	$ -	$ 549	$ 2.884

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 1.186

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Contratos de prestación de servicios	$ 821	ANT	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 364	ANT	Por definir

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 549** | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Viajes	N/A	N/A	$549	Jun 2018 Dic 2018	1%
Gastos Varios	N/A	N/A	$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%

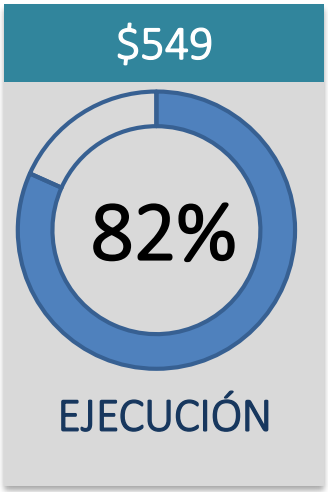

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.884

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
88 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$2.881	dic-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$3	jul-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 10.049	$ -	$ -	$ -	$ 13.845	$ 4.244

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 10.049

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	$ 9.691	FCP	Por definir
UT ITELCOM	$ 310	FCP	Por definir
Gestión Documental	$ 42	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	$ 6	FCP	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 13.845** | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	N/A	N/A	$ 5.270	Ene18 -Mar19	48%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18	$ 4.164	Abr18-Mar19	75%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	$ 1.397	Jun18-Mar19	100%
Tecnologías de la información	U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 1.599	Feb18-Mar19	91%
Auditoría	Ernst & Young	1093-18	$ 605	Ene19-Jul19	0%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 564	Dic18-Dic20	7%
Viáticos	N/A	N/A	$ 70	Ene18-Mar19	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	$ 61*	Mar18-Feb19	74%
Servicios Públicos	N/A	N/A	$ 39	Ene18-Mar19	100%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$29	Feb19-Dic19	0%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	$ 18	Mar18-Mar19	0%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 17	Ene18-Mar19	81%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 7	Ago18-Mar19	69%
Gastos Admin. y de Operación	N/A	N/A	$ 5	Dic 2018	100%

$13.845*

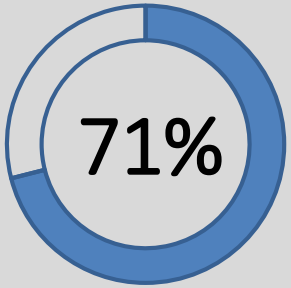

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*El valor en ejecución aumento debido a la adición al Contrato 781-18

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 4.244

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 622	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 54	nov-18	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 6.054	$ -	$ -	$ -	$ 466	$ 7.764

Presidencia Posconflicto

Transversal

Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 6.054

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	$ 6.054	DAPRE	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 466** | Terminados

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	7	N/A	$464	Dic 2018 Dic 2019	13%
Viáticos	N/A	N/A	$2	Ene 2019 Mar 2019	100%

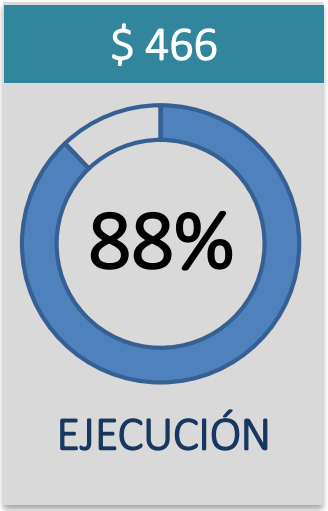

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 7.764

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	nov-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$ 16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000	$ -

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 5.000** | Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	$5.000	Dic 2020	100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.750

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.750

COLOMBIA SOSTENIBLE

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 252	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Fondos de Cooperación

Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Noviembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 85.668.040
En ejecución (USD):	$ 80.9 millones
Gastos administrativos	$3.064.073
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

contribuciones pendientes

USD

Total movilizado

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

NACIONES UNIDAS

109

Proyectos aprobados
por USD $80.9 M
(2016, 2017 y 2018)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
	Total: USD 85.668.040

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 29.592.761
Presupuesto en ejecución (USD):	$ -
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos
Reino Unido	USD 5.092.400	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
Irlanda	USD 281.826	
Noruega	USD 9.290.422	
Corea	USD 500.000	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
Total:	USD 24.510.530	USD 5.082.231

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2019
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	$ 6.860.000
Saldo disponible (dólares):	$ 240.000

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total

Fondo para la Paz y el Posconflicto

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

5 Proyectos aprobados

Donante	Recursos Registrados
Banco Mundial	USD 4.000.000
Suecia	USD 3.100.000
Total	USD7.100.000

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)
Donantes:	Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	113.047.000
Presupuesto en ejecución:	61.309.616
Monto Proyectos en fase administrativa*:	14.607.301
Saldo disponible:	34.130.083
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	5.414.590
Anuncios:	- España: € 3M. - Alemania: € 3M - República Checa: €10.000 - Chile: usd 100.000

Fondo Europeo para la Paz

EUR

Desembolsados al Fondo

EUR 5.414.590

Contribuciones pendientes

EUR

Presupuesto Total

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Europeo para la Paz

Fondo Europeo para la Paz Colombia

23

Proyectos en ejecución por un total de 61,3 Millones de Euros

Donante	Contribuciones Recibidas	Contribuciones Pendientes
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 2.010.000	EUR 990.000
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 1.500.000	EUR 1.500.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 24.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 20.319	
Suecia	EUR 1.392.410.	EUR 1.784.590
Total:	EUR 113.047.000	EUR 5.414.590

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Presupuesto total (dólares):	$ 208.750.000
Presupuesto en ejecución (dólares):	$ 8.540.000

BID

BID Colombia Sostenible

USD 18.575.437

Desembolsados al Fondo

USD 190.174.563

Contribuciones pendientes

USD 208.750.000

Presupuesto total

Fondo Colombia Sostenible

BID

Donante	Recursos Desembolsados al Fondo	Recursos comprometidos
Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 14.250.000	$ 185.750.000
Suecia	USD 1.575.437	$ 4.424.563
Suiza	USD 2.750.000	
Total	USD 18.575.437	$ 190.174.563

*Componente de pago por resultados

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 (líneas de trabajo 2018)

BID

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS	US$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US$ 1.5 Millones
