INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

20 al 24 de mayo de 2019

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución de Cultivos
- BID Préstamo
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 1.852.667	$ 1.838.076	$ 14.592
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 1.605.608	$ 1.592.331	$ 13.277
TOTAL EJECUTADO	$ 1.211.224	$ 1.205.563	$ 5.661

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $918 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución	$ 970.252	$ 883.375	91%	$ 86.877	9%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 407.634	$ 390.010	96%	$ 17.624	4%
Reincorporación	$ 354.745	$ 225.145	63%	$ 129.600	37%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.493	$ 41.573	93%	$ 2.920	7%
Primera Infancia	$ 20.552	$ 19.576	95%	$ 976	5%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.870	$ 2.870	100%	$ 0	0%
Funcionamiento	$ 33.267	$ 28.895	87%	$ 4.372	13%
Estabilización	$ 14.285	$ 9.595	67%	$ 4.690	33%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.823	$ 1.823	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018)	$ 2.747	$ 2.747	100%	$ 0	0%
BID Préstamo	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
BID Facilidad	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 1.852.667	$ 1.605.608	87%	$ 247.059	13%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera



Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución	$ 883.375	$ 825.045	93%	$ 58.330	7%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 390.010	$ 115.170	30%	$ 274.840	70%
Reincorporación	$ 225.145	$ 209.204	93%	$ 15.942	7%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 41.573	$ 25.222	61%	$ 16.351	39%
Primera Infancia	$ 19.576	$ 5.268	27%	$ 14.307	73%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.870	$ 2.804	98%	$ 66	2%
Funcionamiento	$ 28.895	$ 16.432	57%	$ 12.463	43%
Estabilización	$ 9.595	$ 7.519	78%	$ 2.076	22%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.823	$ 1.823	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018)	$ 2.747	$ 2.738	100%	$ 9	0%
BID Préstamo	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
BID Facilidad	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 1.605.608	$ 1.211.224	75%	$ 394.384	25%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo

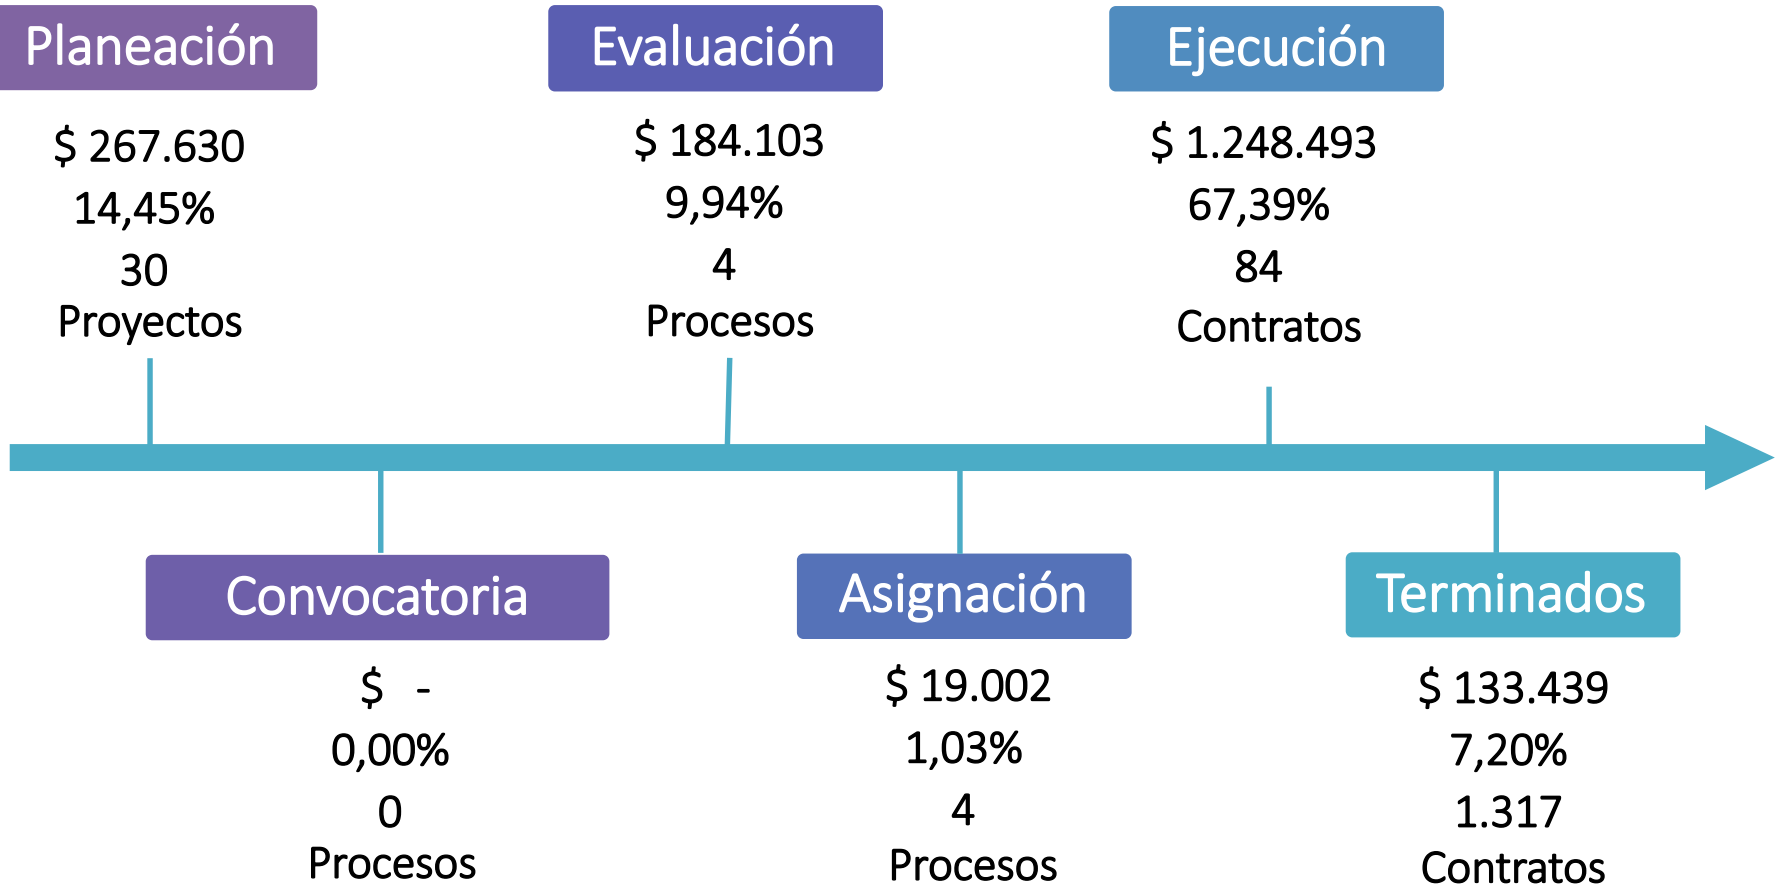

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 87.327	$ -	$ -	$ -	$ 882.561	$ 364

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 87.327

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	$ 86.877	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecacao	$ 320	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	$ 120	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 9	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 882.561** | Terminados

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$ 519.124	Nov 2017 Jul 2019	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	$260.383	Dic 2017 Dic 2019	85%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	$ 67.500	Sep 2017 Jul 2019	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 14.280	Ene 2018 Ene 2020	10%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Agrosavia	561-18	$ 9.825	Ene 2018 Sep 2019	70%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	$ 9.791	Nov 2017 Oct 2019	73%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	$ 880	Ene 2018 Oct 2019	88%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 695	Jun 2018 Jul 2019	72%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	$ 60	Ago 2018 Ago 2019	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 24	N/A	87%

$882.561

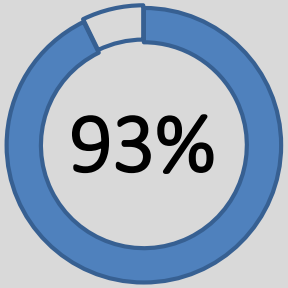

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 364

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
6 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$364	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 23.659	$ -	$ 173.295	$ -	$ 136.591	$ 74.089

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 23.659

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	$ 17.536	ART	Por definir
Sociedad Hotelera Tequendama	$ 5.187	ART	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 440	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 496	ART	Por definir

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.295** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	1. COMFACESAR – Caja de Compensación Familiar del Cesar 2. Consorcio GUAPI 2018 3. Cooperativa de Servicios y Comercialización PROINMAT 4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima 5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar 6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca Piedemonte 7. Global Communities 8. Unión Temporal Desarrollo Urabá Antioqueño 9. Consorcio Pacífico Medio PDET 10. Consorcio Construyendo Paz 11. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	11 de junio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.295** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	12. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial 13. Consorcio Nuevo Catatumbo 14. Consorcio Obras para la Paz 2019 15. Consorcio Obras para la Paz VI 16. Consorcio CONSTRUPAZ 17. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 18. Condugas S.A. 19. Unión Temporal PDET Caguán 2019 20. Proyectos Paz Colombia 21. Unión Temporal Desarrollo Montes de María 22. Global Communities 23. Unión Temporal Proyectos Paz Colombia 24. Unión Temporal Territorio 2019	11 de junio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.295** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	25. Consorcio FUNDYPROC 26. Fundación Plan 27. Fundación Plan 28. Consorcio PDET Urabá 2019 29. Unión Temporal Virgen de la Candelaria 30. Unión Temporal los Manglares 31. Unión Temporal ASOPRO – OBRAS 2019 32. Unión Temporal Obras Urabá 33. Unión Temporal Bolívar en Paz 34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca para la Paz 35. Consorcio Choco 11 36. Consorcio Catatumbo	11 de junio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.295** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	37. Caja de Compensación Familiar del Choco – COMFACHOCO 38. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Montes de María 39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO 40. Consorcio EGA 41. Unión Temporal Enfoque Territorial 42. Unión Temporal Alto Patía 43. SANGEM S.A.S. 44. Unión Temporal Obras de Paz 45. Consorcio Proyectos Montes de María 46. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20 47. Unión Temporal Obras PDET 48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 OHAL – CONSUCOL 49. Unión Temporal Obras PDET 2019	11 de junio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.295** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	ART	$ 151.723	50. Unión Temporal GHM Arauca 51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019 54. Electrizaje S.A.S. 55. Consorcio Arauca FCP 2019 56. Unión Temporal Desarrollo Sierra Nevada 57. Unión Temporal PDET Arauca 2019 58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019 59. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Sierra Nevada 60. Consorcio EGA 61. Constructora INCO S.A.S. 62. Consorcio Paz S.A.S. 63. Consorcio EGA	11 de junio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 173.295** | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría Técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable	ART	$ 21.572	1. Consorcio Estrategia 2019 2. Unión Temporal Consultorías Asesorías e Interventorías 2019 3. Consorcio Despertar 4. Consorcio Gaving 5. Consorcio Inter PDET 6. Consorcio Unidos Somos Más	29 de mayo de 2019*

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 5 de fecha 20 de mayo de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 136.591** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	Feb18 – Oct19	40%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	Mar18 – Oct19	40%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	$16.467	Feb18 – Jul19	30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	Feb18 – Oct19	42%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	$13.890	Feb18 – Oct19	40%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	$8.769	May18 – Oct19	25%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	Feb18 – Oct19	40%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	Feb18 – May19	48%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	Feb18 – Nov19	30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	$2.759	Feb18 – Oct19	41%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	Feb18 – Ago19	40%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$ 4.547	Ene19 – Oct19	0%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$ 4.252	Ene19 – Oct19	0%
Prestación de Servicios	28 OPS	N/A	$1.742	Nov18 –Dic20	2%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$1.036	Feb19 – Nov19	50%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$990	Ago18 – Jul19	6%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$120	Nov18 – Jul19	44%

$136.591*

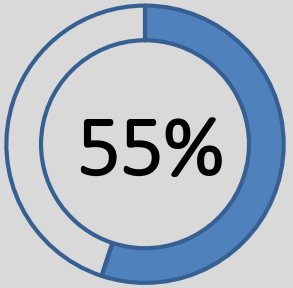

EJECUCIÓN

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumento debido a la suscripción de 5 OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 74.089

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$56.149	feb-19	En proceso de liquidación
835 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 17.720	feb-19	En proceso de liquidación
6 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 209	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 10	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 129.600	$ -	$ -	$ 9.388	$ 206.887	$ 8.870

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 129.600

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	$ 126.223	ARN	Por definir
Innpulsa	$ 3.376	ARN	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 9.388** | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Víveres Secos y Víveres Frescos	ARN	Integral Servicios S.AS.	$ 9.388	31 de mayo de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 206.887** | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 171.700	Abr 2018 Jul 2019	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 19.505	Abr 2018 Jul 2019	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	$ 11.120	Jun 2018 Jul 2019	100%
Víveres Secos	Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$ 4.037	Mar 2019 May 2019	0%
Estabilización Social	BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$ 526	Feb 2019 Nov 2019	50%

$206.887

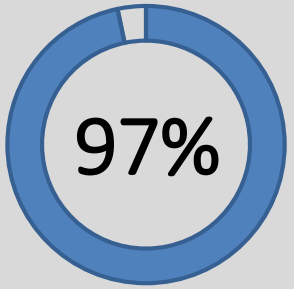

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 8.870

REINCORPORACIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
SOLUCIONES J.R. E.U.	3-19	$2.820	mar-19	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$1.050	jun-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 2.920	$ -	$ 9.708	$ 5.446	$ 1.362	$ 25.057

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 2.920

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	$ 2.920	JEP	Por definir

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 9.708** | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Sistema de Gestión Judicial	JEP	$ 9.708	1. Robotec Colombia S.A.S. 2. SoftPlan Sistemas Colombia	14 de junio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 5 del 17 de mayo de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 5.446** | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Gestión Documental	JEP	Servisoft S.A.S.	$ 5.446	29 de mayo de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 1.362** | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	Ene 2019 Jun 2019	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 (2018)	N/A	$254	Ago 2018 Ene 2020	55%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	$363	May 2018 Oct 2019	56%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	Jun 2018 Jul 2019	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$80	Oct 2018 Jul 2019	71%

$1.362*

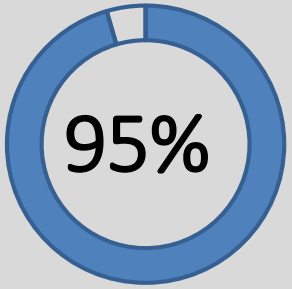

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido a la suscripción de otrosí y adición al Contrato 796-18

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 25.057

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
107 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 4.652	dic-18	En proceso de liquidación
109 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 4.377	nov-18	Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$485	abr-19	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	mar-19	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 13.639	$ -	$ 1.100	$ -	$ 631	$ 5.182

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Consejería Presidencial para la Primera Infancia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 13.639

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	$ 3.716	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Modalidad Familiar	$ 2.942	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria “Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida”, en municipios PDET	$ 2.675	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Interventoría Procesos Judiciales	$ 1.500	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	$ 1.018	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	$ 976	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 652	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 160	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 1.100** | Asignación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	Alta Consejería Primera Infancia	$ 1.100	1. Unión Temporal Novatours – Visión Tours 12 de 2019 2. Colaéreo S.A.S. 3. Festival Tours S.A.S. 4. Subatours S.A.S.	30 de mayo de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 631** | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$341	May 2019 Jul 2019	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	4	N/A	$290	Ene 2019 Dic 2019	41%

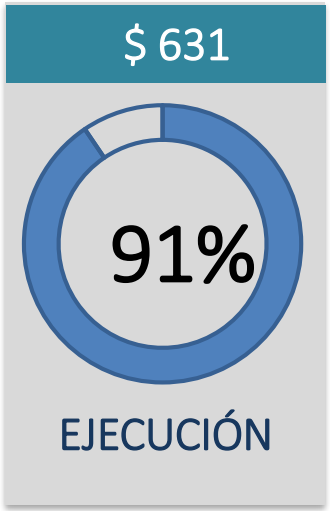

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 5.182

PRIMERA INFANCIA

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$ 1.089	ago-18	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 312	sep-18	En proceso de liquidación
18 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 583	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.870

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.870

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
87 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 2.858	dic-18	En proceso de liquidación
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 7	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 5.408	$ -	$ -	$ 4.168	$ 18.027	$ 5.663

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 5.408

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	$ 4.372	FCP	Por definir
Auditoría	$ 823	FCP	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 200	FCP	Por definir
Empresa de Servicios Integrales S.A.S.	$ 8	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	$ 6	FCP	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 4.168** | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Nómina	FCP	Gente Oportuna S.A.S.	$ 4.076	16 de mayo de 2019
Aseo y Cafetería	FCP	Mundo Limpieza Ltda.	$ 92	16 de mayo de 2019

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 18.027** | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18	$ 6.143	Abr18 - Jul19	70%
Nómina	N/A	N/A	$ 5.047	Ene18 - Jul19	80%
Tecnologías de la información	U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.135	Feb18 - May19	94%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 1.745	Nov18 - Jul19	1%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	40-2019	$ 1.585	May19 – Feb20	0%
Auditoría	Ernst & Young	1093-18	$ 605	Ene19 - Jul19	33%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 564	Dic18 - Dic20	22%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 77	Ene18 - Jul19	27%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	$ 61	Mar18 - May19	95%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 29	Feb19 - Dic19	4%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 28	Ene18 - Jul19	77%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 7	Ago18 - Jun19	73%

$18.027*

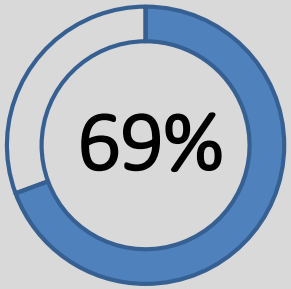

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* El valor en ejecución aumenta debido a la suscripción del Contrato 896-18

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 5.663

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
16 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 582	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
6 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 71	nov-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	121-17	$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	$ 39	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	-	$ 5	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 5.077	$ -	$ -	$ -	$ 2.434	$ 6.774

Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 5.077

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

POSCONFLICTO

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	$ 4.690	DAPRE	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 300	DAPRE	Por definir
Ortegón Pulido Asociados S.A.S.	$ 62	DAPRE	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	$ 25	DAPRE	Por definir

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 2.434** | Terminados

POSCONFLICTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	15	N/A	$1.432	Dic 2018 May 2020	24%
Campaña de Desminado	Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	Feb 2018 Suspendido	50%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$12	Ene 2019 Jul 2019	45%

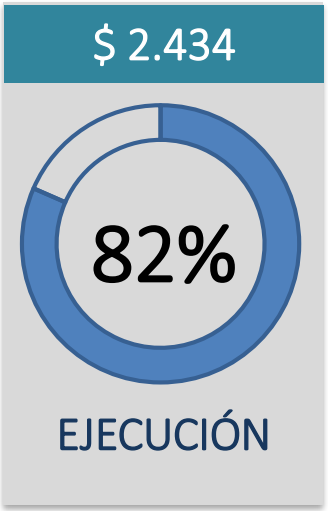

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 6.774

POSCONFLICTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$ 16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.823

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 1.823

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.823	Abr 2019	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.747

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.747

COLOMBIA SOSTENIBLE

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 246	jun-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 3	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 96.885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En preparación para ejecución de convocatorias y adquisiciones

Temporalidad: 5 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: DAPRE

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Planeación

Temporalidad: Hasta 10 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Fondos de Cooperación

Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Noviembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 85.668.040
En ejecución (USD):	$ 80.9 millones
Gastos administrativos	$3.064.073
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

Total movilizado

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

NACIONES UNIDAS

109

Proyectos aprobados por USD $80.9 M (2016, 2017 y 2018)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
	Total: USD 85.668.040

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 29.592.761
Presupuesto en ejecución (USD):	$ -
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos
Reino Unido	USD 5.092.400	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
Irlanda	USD 281.826	
Noruega	USD 9.290.422	
Corea	USD 500.000	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
Total:	USD 24.510.530	USD 5.082.231

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2019
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	$ 6.860.000
Saldo disponible (dólares):	$ 240.000

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.100.000
Desembolsados al Fondo

USD 0
Contribuciones pendientes

USD 7.100.000
Presupuesto total

Fondo para la Paz y el Posconflicto

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

5 Proyectos aprobados

Donante	Recursos Registrados
Banco Mundial	USD 4.000.000
Suecia	USD 3.100.000
Total	USD7.100.000

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)
Donantes:	Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	113.047.000
Presupuesto en ejecución:	62.309.616
Monto Proyectos en fase administrativa*:	14.607.301
Saldo disponible:	34.130.083
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	5.414.590
Anuncios:	- España: € 3M. - Alemania: € 3M - República Checa: €10.000 - Chile: USD 100.000

Fondo Europeo para la Paz

EUR

Desembolsados al Fondo

EUR 5.414.590

Contribuciones pendientes

EUR

Presupuesto Total

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Europeo para la Paz

Fondo Europeo para la Paz Colombia

25

Proyectos en ejecución por un total de 62,009 Millones de Euros

Donante	Contribuciones Recibidas	Contribuciones Pendientes
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 2.010.000	EUR 990.000
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 1.500.000	EUR 1.500.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 24.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 20.319	
Suecia	EUR 1.392.410.	EUR 1.784.590
Total:	EUR 113.047.000	EUR 5.414.590

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	$ 250.000.000
Presupuesto en ejecución (dólares):	$ 8.540.000

BID

BID Colombia Sostenible

USD 18.575.437

Desembolsados al Fondo

USD 12.000.000

Contribuciones pendientes a febrero 2019, correspondientes al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 (líneas de trabajo 2018)

BID

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto "Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico" con el Fondo Acción y MADS	US$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US$ 1.5 Millones
TOTAL	US $ 8.540.000

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que inician ejecución física y financiera en Marzo 2019 *

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US$ 1.14 Millones
Desarrollo rural sostenible, operatividad de la Unidad técnica de coordinación	US$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de capacidades locales	US$ 1.00 Millones
TOTAL	US $ 4.360.000

Fondo Colombia Sostenible

BID

Donante	Recursos Desembolsados al Fondo 2018	Recursos por desembolsar 2019**
Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 14.250.000	USD 11.000.000
Suecia	USD 1.575.437	USD 1.000.000
Suiza	USD 2.750.000	N/A
Total:	USD 18.575.437	USD 12.000.000

**Componente de pago por resultados*

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD $ 5,479,312 que pasa al POA 2019*
