INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

02 al 06 de marzo de 2020

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución
- BID Préstamo
- KFW
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- AFD
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia
- Agencia Nacional de Tierras 2019

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 2.464.445	$ 2.437.418	$ 27.027
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 2.131.680	$ 2.115.620	$ 16.061
TOTAL EJECUTADO	$ 1.720.302	$ 1.708.000	$ 12.302

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $3.335 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones / Otros ingresos no operacionales – Sustitución por $168 millones

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.271.220	$ 1.215.209	96%	$ 56.011	4%
Reincorporación	$ 524.954	$ 372.091	71%	$ 152.863	29%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 409.751	$ 406.696	99%	$ 3.055	1%
BID Préstamo	$ 96.885	$ 13.409	14%	$ 83.476	86%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.137	$ 44.065	100%	$ 72	0%
Funcionamiento	$ 37.369	$ 37.367	100%	$ 2	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 21.703	$ 552	3%	$ 21.151	97%
Primera Infancia	$ 20.852	$ 19.722	95%	$ 1.130	5%
Estabilización	$ 20.519	$ 14.700	72%	$ 5.819	28%
BID Facilidad	$ 9.650	$ 473	5%	$ 9.177	95%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.847	$ 2.837	100%	$ 10	0%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
KFW	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
AFD	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 2.464.445	$ 2.131.680	86%	$ 332.765	14%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera



Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.215.209	$ 1.114.680	92%	$ 100.529	8%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 406.696	$ 178.318	44%	$ 228.378	56%
Reincorporación	$ 372.091	$ 339.766	91%	$ 32.325	9%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.065	$ 28.026	64%	$ 16.039	36%
Funcionamiento	$ 37.367	$ 29.442	79%	$ 7.925	21%
Primera Infancia	$ 19.722	$ 8.908	45%	$ 10.815	55%
Estabilización	$ 14.700	$ 9.387	64%	$ 5.313	36%
BID Préstamo	$ 13.409	$ 3.600	27%	$ 9.809	73%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.837	$ 2.804	99%	$ 34	1%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 552	$ 552	0%	$ 0	0%
BID Facilidad	$ 473	$ 261	55%	$ 213	45%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
KFW	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
AFD	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 2.131.680	$ 1.720.302	81%	$ 411.378	19%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo

Planeación
$ 355.782
14,44%
18
Proyectos

Convocatoria
$ 78.544
3,19%
1
Procesos

Evaluación
$ 21.287
0,86%
1
Proceso

Asignación
$ 140.144
5,69%
4
Procesos

Ejecución
$ 1.554.141
63,06%
494
Contratos

Terminados
$ 314.547
12,76%
1.516
Contratos

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 56.558	$ 78.544	$ -	$ -	$ 1.055.505	$ 80.614

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 56.558

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN

Nombre corto	Valor
Por asignar	$ 56.011
Contratos de Prestación de Servicios	$ 547

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | **Convocatoria $ 78.544** | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador Logístico	PNIS	$ 78.544	20 de marzo de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 1.055.505** | Terminados

SUSTITUCIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$ 702.770	Nov 2017 Dic 2020	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	$319.078	Dic 2017 Jun 2020	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 10.946	Ene 2018 Oct 2020	50%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	$ 9.791	Nov 2017 Oct 2020	77%
Prestación de Servicios Persona Natural	173	N/A	$ 7.589	Feb 2019 Mar 2021	45%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	$ 2.945	Oct 2019 Oct 2021	21%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	$ 881	Dic 2019 Dic 2020	1%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	$ 780	Ene 2020 Ago 2020	14%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 724	N/A	40%

$1.055.505*

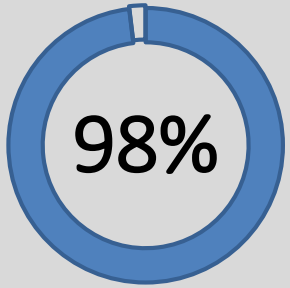

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a incremento en pagos a familias y suscripción de 4 OPS.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 80.614

SUSTITUCIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 001	$ 67.500	dic-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
40 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 1.240	dic-18	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
9 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 475	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 21.816	$ -	$ -	$ 139.875	$ 96.674	$ 151.386

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 21.816 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Valor
Obras Civiles	$ 18.067
Por asignar ART	$ 3.055
Contratos de prestación de servicios	$ 694

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 139.875** | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Obras Civiles (Grupo1)	ART	Fundación Plan	$ 27.589	13 de marzo de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo3)	ART	Fundación SOCYA	$ 18.641	13 de marzo de 2020
Obras Civiles (Grupo5)	ART	Consorcio EGA	$ 15.017	13 de marzo de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo2)	ART	Consorcio FAM	$ 14.746	13 de marzo de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo5)	ART	Consorcio CEG-OME	$ 14.691	13 de marzo de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo4)	ART	U.T. Futuro Pazcifico	$ 11.137	13 de marzo de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 139.875** | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Obras Civiles-2 (Grupo8)	ART	Corporación Ayuda Humanitaria	$ 9.475	13 de marzo de 2020
Obras Civiles (Grupo3)	ART	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	$ 8.098	13 de marzo de 2020
Interventoría (Grupo 3)	ART	Consorcio Bienestar Comunitario	$ 7.448	13 de marzo de 2020
Obras Civiles (Grupo8)	ART	Consorcio EGA	$ 5.646	13 de marzo de 2020
Obras Civiles (Grupo2)	ART	Consorcio Construyendo Paz	$ 4.136	13 de marzo de 2020
Obras Civiles-2 (Grupo7)	ART	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	$ 3.250	13 de marzo de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 96.674** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	Feb18 – Mar20	82%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	Mar18 – Suspendido	82%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	$8.769	May18 – Feb20	67%
Prestación de Servicios	176 OPS	N/A	$9.124	Abr19 – Ene21	35%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	$ 7.805	Ene20 – Abr21	0%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	$ 6.924	Ene20 – Abr21	0%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$5.272	Ene19 – Mar20	23%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$5.225	Ene19 – Mar20	48%

$96.674*

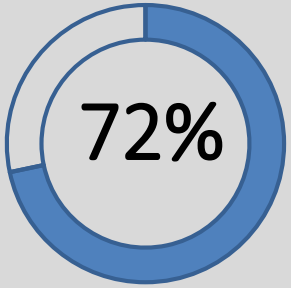

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde suscripción de 4 OP.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 96.674** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	$ 5.187	Jul19 – Jul20	30%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	$ 2.104	Oct19 – Jul20	20%
Hoja de ruta	Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	$ 1.965	Ago19 – Mar20	40%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	160-19	$ 1.916	Ago19 – Ago20	52%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$ 1.420	N/A	37%
Formulación planes de Turismo	Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	$ 1.078	Ene20 – Jul20	0%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	$ 984	Ene20 – Ene21	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$440	Jun19 – Jul20	35%

$96.674*

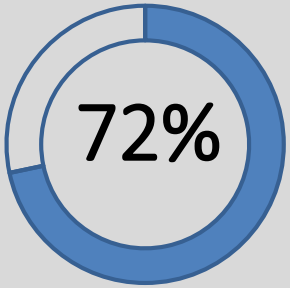

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde suscripción de 4 OP.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 151.386**

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$52.764	feb-19	Liquidado
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	873 OPS	$ 19.011	feb-19	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	$16.467	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	$ 13.890	ene-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	feb-20	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	$2.759	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$1.036	nov-19	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$990	nov-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	74 OPS	$ 902	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 10	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 152.863	$ -	$ 21.287	$ -	$ 325.034	$ 25.770

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 152.863

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	$ 152.863

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 21.287** | Asignación | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Víveres Secos	ARN	$ 21.287	1. Unión Temporal UT FCP 2020 2. Integral Servicios SAS 3. Consorcio Alimentos 2020	19 de marzo 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 325.034** | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 250.516	Sep 2017 Sep 2020	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	$ 28.935	Jun 2018 May 2020	99%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 27.361	Sep 2017 May 2020	100%
Víveres secos	Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	$ 13.902	Oct 2019 Mar 2020	43%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa	142-19	$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	47%
Prestación de Servicios	10 OPS	N/A	$ 641	Ene 2020 Ene 2021	7%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	24-20	$ 82	Feb 2020 Jun 2020	0%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	$ 22	Feb 2020 May 2020	4%

$325.034*

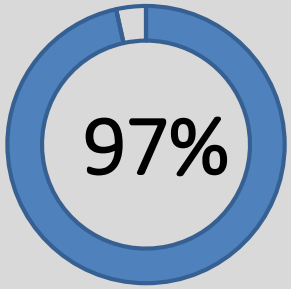

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a incremento en pagos de asignaciones únicas, pensión, BEPS e incremento en CDP de proyectos productivos y gastos de desplazamiento.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 25.770

REINCORPORACIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios S.AS.	42-19	$ 12.219	nov-19	En proceso de liquidación
Fundapanaca	550-17	$5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$4.037	may-19	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$1.050	jun-18	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	$ 526	Nov-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	$ 118	Feb-20	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 72	$ -	$ -	$ -	$ 18.320	$ 25.745

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 72 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	$ 72

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 18.320** | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	$9.139	Ago2019 Ago2020	10%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	$5.376	Jul2019 Mar2022	3%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	$ 1.550	Feb2020 Dic2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	18	N/A	$1.508	Nov 2018 Sep2020	65%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	Ene 2019 Mar 2020	40%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	Jun 2018 May 2020	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$80	N/A	71%

$18.320

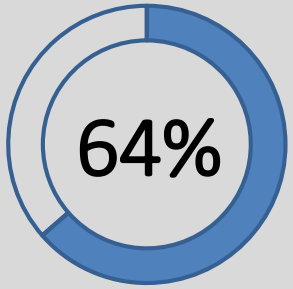

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 25.745**

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	188 OPS	$ 7.808	nov-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	33 OPS	$ 1.547	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	$363	oct-79	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 2.290	$ -	$ -	$ -	$ 13.124	$ 5.437

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 2.290 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	$ 1.129
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	$ 1.100
Contratos de prestación de servicios	$61

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 13.124** | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	$ 3.477	Ene 2020 Jun 2020	0%
Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	$ 2.675	Oct 2019 Mar 2020	80%
Modalidad Familiar	Fundación de Atención a la Niñez	213-19	$1.846	Sep 2019 Abr 2020	20%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	$1.499	Sep 2019 Ago 2020	10%
Modalidad Familiar	Fundación Hogar Juvenil	211-19	$1.096	Sep 2019 Abr 2020	20%
Prestación de Servicios Persona Natural	18	N/A	$1.026	Ene 2019 Dic 2020	55%
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	$1.004	Dic 2019 May 2020	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$341	N/A	6%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$160	Jun 2019 Dic 2019	6%

$ 13.124*

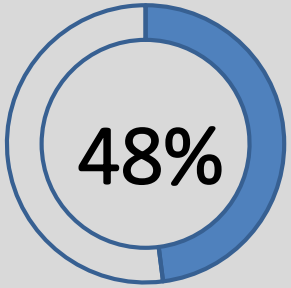

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*El incremento corresponde a la adición a un contrato de OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 5.437

PRIMERA INFANCIA

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$ 1.076	ago-18	Liquidado
30 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 907	feb-19	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 257	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.837

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 10 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	$ 10

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.837

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
49 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 2.022	dic-18	En proceso de liquidación
40 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 810	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.895	$ -	$ -	$ 269	$ 26.775	$ 8.429

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 1.895 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Valor
Servicios TIC	$ 1.887
Servicio de Difusión de Información	$ 6
Por asignar Funcionamiento	$ 2

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 269** | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Custodia de Documentos	FCP	Protech Ingeniería S.A.S.	$ 269	05 de marzo 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 26.775** | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18 001-19	$ 9.483	Abr18 – May20	81%
Nómina	Gente Oportuna S.A.S.	43-19	$ 6.114	May19 - Jun20	70%
Nómina	N/A	N/A	$ 5.463	Sep17 – May20	90%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	40-19	$ 1.976	May19 - Abr20	61%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 1.900	Nov18 – May20	88%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	$ 643	May19 - Mar20	70%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 564	Dic18 - Dic20	61%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-2019	$200	Jun19 – Jul20	58%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 190	N/A	75%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	$ 79	May19 - May20	60%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 77	Ene18 – May20	57%
Adecuaciones	Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	$ 34	Oct19 – N/A	50%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 29	Feb19 - Dic19	37%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	108-19	$ 23	Jun19 – N/A	88%

$26.775*

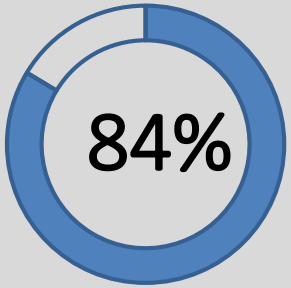

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.
*La variación corresponde a incremento en CDP de Nomina

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 8.429**

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	$ 605	Jul19	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 539	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 83	jun-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 8.429**

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	$ 5	nov-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 5.953	$ -	$ -	$ -	$ 5.798	$ 8.767

Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 5.953 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

ESTABILIZACIÓN

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	$ 5.819
Contratos de prestación de servicios	$ 134

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 5.798** | Terminados

ESTABILIZACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	28 OPS	N/A	$3.433	Dic 2018 Mar 2021	31%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	$1.800	Dic 2019 Dic 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 300	Jun 2019 Jul 2020	17%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 112	N/A	86%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	$ 80	Mar 2020 Mar 2021	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	$ 74	N/A	27%

$ 5.798*

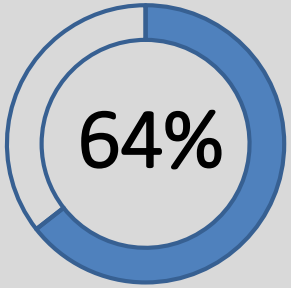

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 53-20, suscripción de 5 contratos de OPS e incremento en CDP de gastos de desplazamiento.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 8.767**

ESTABILIZACIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	21 OPS	$ 1.111	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	11 OPS	$ 504	jun-18	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 1.820

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.738

COLOMBIA SOSTENIBLE

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 83.997	$ -	$ -	$ -	$ 12.165	$ 723

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 83.997 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

BID PRÉSTAMO

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	$ 83.476
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	$ 450
Auditoría	$ 71

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 12.165** | Terminados

BID PRÉSTAMO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	Corporación Colombia Internacional	399-19	$2.031	Nov19-Mar20	25%
	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	$1.929	Nov19-Mar20	25%
	U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	$1.927	Nov19-Mar20	25%
	Prodesarrollo Ltda.	411-19	$1.538	Nov19-Mar20	25%
	Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	$1.527	Nov19-Mar20	25%
	U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	$1.438	Nov19-Mar20	25%
Interventoría	U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	$ 882	Nov19-Abr20	25%
Prestación de Servicios	14 OPS	N/A	$ 762	Ene20-Oct20	5%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	$ 93	Ago19-Jun 20	6%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 37	Ago19-May20	92%

$ 12.165

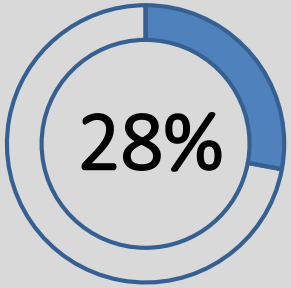

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 723**

BID PRÉSTAMO

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
37 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$723	Oct 2019	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 9.177	$ -	$ -	$ -	$ 193	$ 280

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 9.177 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

BID FACILIDAD

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	$ 9.177

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 193** | Terminados

BID FACILIDAD

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	$ 71	Ene 2020 Oct 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	$ 51	Nov 2019 Jun 2020	2%
		412-19	$ 48		0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 23	Ago 2019 May 2020	49%

$ 193*

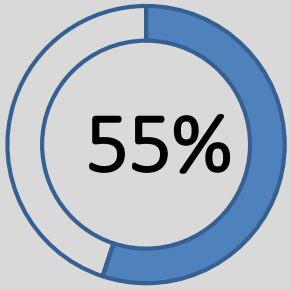

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 280

BID FACILIDAD

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$280	Nov 2019	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 21.151	$ -	$ -	$ -	$ 552	$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 21.151 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 2019

Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	$ 21.151

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 552** | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	N/A	$552	Nov2019 - N/A	100%

$552

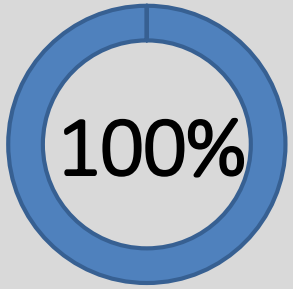

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

KFW

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

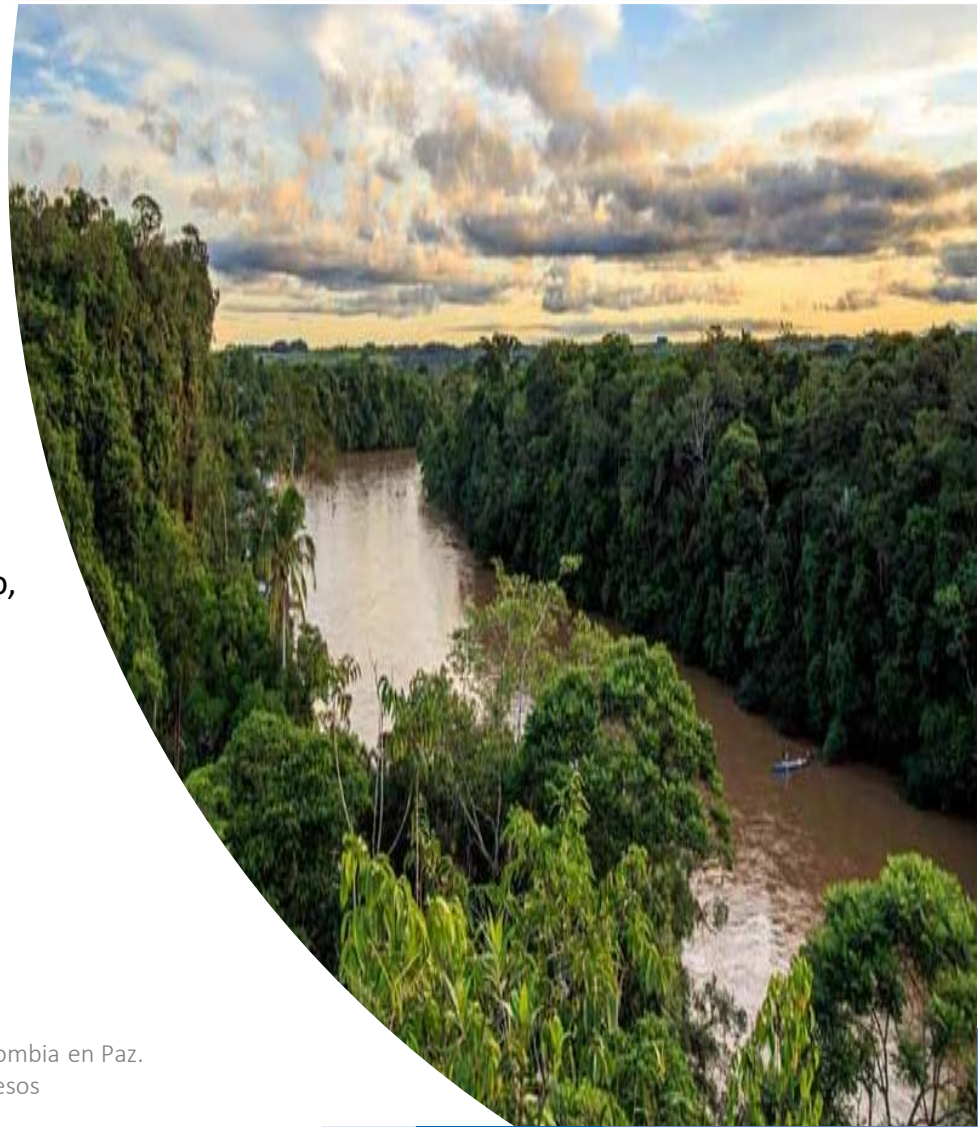

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

AFD

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Fondos Multidonante para el Posconflicto

Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Noviembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 85.668.040
En ejecución (USD):	$ 80.9 millones
Gastos administrativos	$3.064.073
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

Total movilizado

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

NACIONES UNIDAS

111

Proyectos aprobados por USD $83.7 Millones (2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
	Total: USD 85.668.040*

*Con intereses Y devoluciones el total es de USD 87.2

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 36.9 millones
Presupuesto en ejecución (USD):	$ -
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD 36.9 mill

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 5.092.400	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
Noruega	USD 9.290.421	
Corea	USD 500.000	
Suecia		USD 4.719.455
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
Suiza	USD 491.592	USD 498.505
Total:	USD 26.596.608	USD 10.300.191

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia contribuirá con EUR 150.000
- PBF contribuirá USD 2.000.000 (para proyecto de la Comisión de la Verdad)

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2019
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	$ 6.860.000
Saldo disponible (dólares):	$ 80.000

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

5 Proyectos aprobados

Donante	Recursos Registrados
Banco Mundial	USD 4.000.000
Suecia	USD 3.100.000
Total	USD7.100.000

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) **En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)** se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más.
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.970.810
Presupuesto en ejecución:	€ 74.300.580
Monto Proyectos en fase administrativa*:	34.500.000 (aproximadamente)
Saldo disponible:	7.370.230
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	8.800.000

Fondo Europeo para la Paz

EUR 116.840.133

EUR 2.320.677

Contribuciones pendientes

EUR 127.970.810*

Total Presupuesto Teórico

Fondo Europeo para la Paz

28

Proyectos en ejecución por un total de € 74.3* millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.890.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 3.000.000	
Francia	EUR 2.400.000	EUR 600.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 2.250.000	EUR 750.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 36.000	
Luxemburgo	EUR 40.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 30.000	
Suecia	EUR 2.146.323	EUR 970.677
CHILE	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Bank interests	EUR 775,62	
Total:	EUR 116.840.133	EUR 2.320.677

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	$ 250.000.000
Presupuesto en ejecución (dólares):	$ 8.540.000

BID

BID Colombia Sostenible

USD 19.658.355

Desembolsados al Fondo

USD 12.000.000

Contribuciones pendientes a febrero 2019, correspondientes al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 (líneas de trabajo 2018)

BID

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto "Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico" con el Fondo Acción y MADS	US$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US$ 1.5 Millones
TOTAL	US $ 8.540.000

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que iniciaron ejecución física y financiera 2019 *

BID

Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US$ 1.14 Millones
Promoción de Estrategias Innovadoras para el Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación Ambiental	US$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de Proyectos e Innovación Territorial	US$ 1.00 Millones
TOTAL	US $ 4.360.000

Fondo Colombia Sostenible

BID

Donante	Recursos Desembolsados para el POA 2018	Recursos Desembolsados POA 2019**
Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
Suiza	USD 3.00.000	N/A
Total		
*Componente de pago por resultados .	USD 19.658.355	USD 12.000.000

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD $ 5,479,312 que pasa al POA 2019*

- Noruega, anunció donación por USD$ 11 millones
- Suecia, anunció la donación de USD $ 1 millón
