Fondo Colombia en Paz - **FCP**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Informe semanal 292

06 al 10 de noviembre de 2023

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP y CRP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o actividades que ya cuentan con respaldo presupuestal.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

En trámite: Corresponde a los contratos y/o actividades en proceso de perfeccionamiento que no están vinculadas a convocatorias.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación del proceso contractual: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Adjudicación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia ICBF
- Sustitución
- BID Préstamo
- KFW
- Niñez y Adolescencia ICBF
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- AFD
- Zona ZEII Catatumbo
- Zona ZEII Catatumbo-Catastro
- Implementación
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia
- Agencia Nacional de Tierras 2019
- Visión Amazonía
- Catastro Multipropósito

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (*)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 7.424.567	$ 6.738.913	$ 685.654
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 5.144.918	$ 4.993.297	$ 151.620
TOTAL EJECUTADO	$ 4.192.290	$ 4.141.153	$ 51.138

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aporte de $3.500 del Convenio 550 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 de Cenit / Capitalización de Rendimientos por $6.937 / Otros ingresos Funcionamiento por $202 / Aporte BID Facilidad por $23.588 / Otros ingresos - Sustitución por $6.129 / Otros ingresos - Reincorporación por $23 /Otros ingresos PDET por $10 / Aporte KFW $53.447/ Convenios Fondo Paz $71.918/ Convenio Visión Amazonía $8.374./ Convenio AFD $1.892./ Otros ingresos MADS $37/ Convenio 1217 ANT $430.000 / Convenio 1231 IGAC $72.299

NO incluye valor de contrapartidas.

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 3.279.914	$ 2.378.036	73%	$ 901.878	27%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 1.227.793	$ 797.609	65%	$ 430.184	35%
Reincorporación	$ 1.133.987	$ 1.123.194	99%	$ 10.793	1%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 620.711	$ 20.669	3%	$ 600.042	97%
BID Préstamo	$ 389.027	$ 317.277	82%	$ 71.750	18%
Catastro Multipropósito	$ 157.946	$ 26.586	17%	$ 131.359	83%
Funcionamiento	$ 125.929	$ 113.962	90%	$ 11.967	10%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 116.263	$ 113.729	98%	$ 2.535	2%
Niñez y Adolescencia ICBF	$ 90.000	$ 31.126	35%	$ 58.874	65%
Primera Infancia ICBF	$ 67.877	$ 27.670	41%	$ 40.207	59%
KFW	$ 53.574	$ 43.847	82%	$ 9.726	18%
Implementación	$ 51.253	$ 47.315	92%	$ 3.938	8%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.065	$ 43.906	99,6%	$ 159	0,4%
BID Facilidad	$ 23.636	$ 21.949	93%	$ 1.688	7%
Herencia Colombia	$ 23.245	$ 19.478	84%	$ 3.766	16%
Visión Amazonía	$ 8.374	$ 8.104	97%	$ 269	3%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.847	$ 2.804	98%	$ 43	2%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
AFD	$ 1.895	$ 1.501	79%	$ 393	21%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	$ 1.354	$ 1.275	94%	$ 78	6%
Zona ZEII Catatumbo	$ 320	$ 320	100%	$ 0	0%
TOTAL	**$ 7.424.567**	**$ 5.144.918**	**69%**	**$ 2.279.650**	**31%**

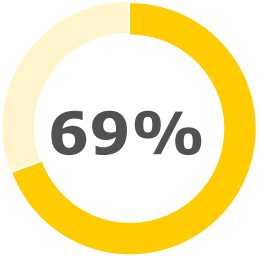

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal. NO incluye valor de contrapartidas.

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 2.378.036	$ 2.018.229	85%	$ 359.808	15%
Reincorporación	$ 1.123.194	$ 994.536	89%	$ 128.658	11%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 797.609	$ 529.646	66%	$ 267.963	34%
BID Préstamo	$ 317.277	$ 252.206	79%	$ 65.071	21%
Funcionamiento	$ 113.962	$ 95.556	84%	$ 18.406	16%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 113.729	$ 91.403	80%	$ 22.326	20%
Implementación	$ 47.315	$ 39.849	84%	$ 7.466	16%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 43.906	$ 43.906	100%	$ 0	0%
KFW	$ 43.847	$ 3.525	8%	$ 40.323	92%
Niñez y Adolescencia ICBF	$ 31.126	$ 24.366	78%	$ 6.760	22%
Primera Infancia ICBF	$ 27.670	$ 27.670	100%	$ 0	0%
Catastro Multipropósito	$ 26.586	$ 11.070	41,6%	$ 15.517	58,4%
BID Facilidad	$ 21.949	$ 17.685	81%	$ 4.263	19%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 20.669	$ 15.372	74%	$ 5.297	26%
Herencia Colombia	$ 19.478	$ 10.895	56%	$ 8.583	44%
Visión Amazonía	$ 8.104	$ 7.091	87%	$ 1.014	13%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.804	$ 2.804	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
AFD	$ 1.501	$ 1.046	70%	$ 455	30%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	$ 1.275	$ 559	44%	$ 717	56%
Zona ZEII Catatumbo	$ 320	$ 320	100%	$ 0	0%
TOTAL	**$ 5.144.918**	**$ 4.192.290**	**81%**	**$ 952.627**	**19%**

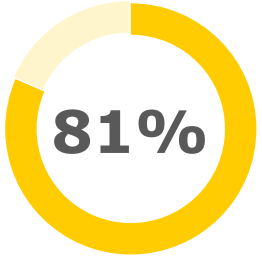

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos. NO incluye valor de contrapartidas

Línea del Tiempo

Disponible

$ 2.279.650
30,70%
19
Subcuentas

En Trámite

$ 9.349
0,13%
32
Procesos

Convocatoria

$ 14.880
0,20%
7
Procesos

Evaluación

$ 19.256
0,26%
6
Procesos

Adjudicación

$ 33.760
0,45%
1
Proceso

Ejecución

$ 3.507.594
47,24%
1543
Contratos

Terminados

$ 1.560.079
21,01%
4365
Contratos

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP. NO incluye valor de contrapartidas

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 901.878	**$ 1.017**	**$ -**	**$ 4.814**	**$ -**	**$ 1.670.244**	**$ 701.962**

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible $ 901.878 | En Trámite $ 1.017 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Sustitución	$ 901.878

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Contratos de prestación de servicios	$ 513
Defensa judicial	$ 504

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 1: Antioquia - Medellín	ART	$ 240	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023 7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 8. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ SANANDANTE 9. UNIÓN TEMPORAL UG 2023 10. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. 11. OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICA OLT TRANSPORTES S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 2: Arauca - Arauquita	ART	$ 248	1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 3. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. 4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 5. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 6. SERVICES V&M S.A.S. ZOMAC	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 3: Bolívar – San Pablo	ART	$ 246	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA TD 7. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023 8. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 9. UNIÓN TEMPORAL UG 2023 10. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. 11. OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS EN TRANSPORTE S.A.S. - OLT TRANSPORTE S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 4: Vichada – Cumaribo	ART	$ 253	1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 3. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. 4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 5. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 5: Cauca – Popayán	ART	$ 418	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 7. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC SANANDANTE 8. TRANSPORTADORA NUEVO MILENIO LIMITADA 9. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 6: Córdoba – Montería	ART	$ 247	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 7. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC SANANDANTE 8. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. 9. OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS S.A.S – OLT TRANSPORTE S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 7: Guaviare – San José de Guaviare	ART	$ 253	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 8: Meta – Villavicencio	ART	$ 253	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023 7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 8. UNIÓN TEMPORAL UG 2023 9. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. 10. TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S. BIC	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 9: Norte de Santander – Cúcuta – El Tarra	ART	$ 432	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023 7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 8. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC SANANDANTE 9. UNIÓN TEMPORAL UG 2023 10. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 10: Putumayo – Mocoa - Orito	ART	$ 427	1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S. 2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S. 5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 6. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA TD 7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 8. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC SANANDANTE 9. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 11: Caquetá – Florencia	ART	$ 188	1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 3. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S. 4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 5. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 6. TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S. BIC	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 12: Chocó – Quibdó – Riosucio	ART	$ 487	1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 3. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 13: Nariño – Tumaco	ART	$ 647	1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 3. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 4. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. 5. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC SANANDANTE 6. TRANSPORTADORA NUEVO MILENIO LIMITADA	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 4.814** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Servicio de transporte terrestre Territorial 14: Valle del Cauca – Cali - Buenaventura	ART	$ 477	1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S. 2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S. 3. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 4. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.670.244** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$ 996.242	Nov17 - Dic23	99.99%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	UNODC	1092-21	$ 157.898	Ene22 - Ene24	90%
	Fupad Colombia	1041-21	$ 136.554	Dic21 - Dic23	90%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	$ 25.855	Jun21 - Oct23	70%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	$ 21.849	Jul21 - Dic23	70%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	$ 15.066	Jul21 - Sep23	70%
Servicios Persona Natural	330 CPS	N/A	$ 23.278	Oct21 - Ago24	61%
Operador Logístico	Consorcio construyendo proyectos sostenibles	364-22	$ 24.573	Jul22 - Oct23	10%
	Consorcio Meta incluyente	405-22	$ 23.283	Ene23 - Abr24	10%

$ 1.670.244*

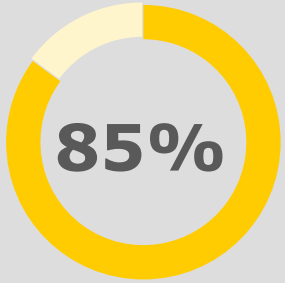

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 3 CPS, ajuste al CDP para asistencia alimentaria a familias, a la adición a 1 CPS y, a la terminación de 2 CPS

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.670.244** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Consorcio desarrollo rural zona 3	375-22	$ 30.693	Jun22 - Sep23	90%
	Consorcio productivo Caquetá 4	377-22	$ 28.919	Jun22 - Sep23	70%
	Consorcio grupo Max de Orinoquia	366-22	$ 27.681	Jun22 - Sep23	10%
	Consorcio construyendo proyectos PNIS	365-22	$ 31.629	Jul22 - Oct23	10%
	Consorcio familias productivas por la paz 2022	402-22	$ 20.520	Sep22 - Dic23	30%
	Corporación para impulsar el desarrollo ambiental "CIDMAG"	404-22	$ 17.539	Ago22 - Nov23	10%
	UT Caquetá avanza	403-22	$ 13.456	Ago22 - Nov23	30%
	Imagroup Colombia S.A.S.	835-23	$ 5.000	Jul23 - Ene25	2%
	Publica S.A.S.	984-21	$ 3.750	Nov21 - Jul23	94%
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	DCO Ingeniería & Servicios SAS	371-22	$10.258	May22 - Ene24	62%

$ 1.670.244*

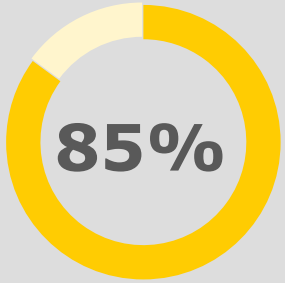

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 3 CPS, ajuste al CDP para asistencia alimentaria a familias, a la adición a 1 CPS y, a la terminación de 2 CPS

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.670.244** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	DCO Ingeniería & Servicios SAS	372-22	$ 8.898	Jun22 - Ene24	49%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	$ 8.696	Sep21 - Sep23	70%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	$ 5.241	Jul21 - Sep23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	$ 5.082	Jul21 - Mar23	10%
Arrendamientos	Situando S.A.S.	583-23	$ 9.136	Abr23 - Abr26	4%
	Situando S.A.S.	664-23	$ 8.913	Jun23 - Jun25	19%
Transporte Público Terrestre	UT Dapre OS 2022	354-22	$ 4.033	Abr22 - Dic23	87%
	Transportes Especiales Golden S.A.S. BIC	773-23	$ 107	Sep23 - Mar24	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 3.817	N/A	90%
Tiquetes aéreos	Subatours S.A.S.	699-23	$ 1.800	Jun23 - Jun24	4%
ARL	N/A	N/A	$ 477	N/A	54%

$ 1.670.244*

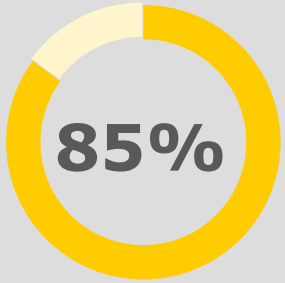

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 3 CPS, ajuste al CDP para asistencia alimentaria a familias, a la adición a 1 CPS y, a la terminación de 2 CPS

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 701.962**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF002	$309.350	Dic-20	Liquidado
-OEI-	262-20	$ 89.169	Nov-21	En proceso de liquidación
-OEI-	1091-21	$ 79.389	Oct-23	En proceso de liquidación
UNODC	AF001	$ 67.177	Dic-19	Liquidado
612 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 32.306	Dic-17	Liquidado
Unión temporal selva social	373-22	$ 31.145	Sep-23	En proceso de liquidación
Unión Temporal para la Paz 2022	359-22	$ 24.411	Ago-23	En proceso de liquidación
332 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 20.219	Ago-19	En proceso de liquidación
Fedecacao	123-17	$ 11.554	May-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 8.899	Nov-20	Liquidado
Situando SAS	927-21	$ 7.017	Jun-23	Liquidado
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	$ 4.850	Sep-19	Liquidado
COFESCO	896-20	$ 3.876	Jun-22	En proceso de liquidación
Situando SAS	928-21	$ 3.046	Abr-23	Liquidado
Situando SAS	254-19	$ 3.001	Oct-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 701.962**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
AS Transportes	28-21	$ 2.383	Abr22	Liquidado
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	$ 992	Ene-21	Liquidado
Festival Tours S.A.S	470-19	$ 804	Dic-22	Liquidado
Ecomún	771-18	$ 871	Oct-19	Liquidado
Situando SAS	411-20	$ 706	Oct-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 682	Dic-18	Liquidado
Viaja por el Mundo WEB/NICKISIX360 S.A.S.	504-23	$ 96	May-23	Liquidado
Semillas Valle S.A.	76-20	$ 19	Nov-20	Liquidado
UNODC - Departamento de Nariño - Municipio de Buesaco	227-22	-	May-22	Liquidado
UNODC - Municipio de Campamento	225-22	-	May-22	Liquidado
Municipio de la Cruz	154-22	-	Jun-22	Liquidado
Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego	180-22	-	May-22	Liquidado
Municipio el Tablón de Gomez	153-22	-	May-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 701.962**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC-Municipio de Valdivia	226-22	-	May-22	Liquidado
Departamento Vichada, municipio de Cumaribo	671-21	-	Sep-23	Liquidado
Gran Tierra Colombia INC Sucursal	1124-21	-	Sep-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 430.184	$ 1.745	$ 1.968	$ 14.441	$ 33.760	$ 362.952	$ 382.743

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y los Programas de Obras de Infraestructura.

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Fondo Colombia en Paz - FCP

Disponible $ 430.184 | En Trámite $ 1.745 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible PDET	$ 430.184

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Adquisición del licenciamiento para la plataforma ARCGIS	$ 1.001
Contratos de prestación de servicios	$ 744

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | **Convocatoria $ 1.968** | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre recepción de propuestas
Construcción de centro deportivo	ART	$ 1.968	24 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 14.441** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Ejecutar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial	ART	$ 6.817	1. BLANCA MILENA LÓPEZ SÁNCHEZ – GRUPO 1 2. UNIÓN TEMPORAL TERRITORIOS – GRUPO 3 3. UNIÓN TEMPORAL SAN VICENTE – GRUPO 3 4. CONSORCIO INFRESTRUCTURA VIAL FCP2024 – GRUPO 2 5. CONSORCIO VIAL CAGUAN HL – GRUPO 3 6. EABS INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. – GRUPO 1 EABS INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. – GRUPO 2 EABS INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. – GRUPO 3	14 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 14.441** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Interventoría integral	ART	$ 3.246	1. CONSORCIO BDCO23 2. VELNEC S.A. 3. CONSORCIO TERRITORIOS 24 4. UNIÓN TEMPORAL INTERCATATUMBO 5. J.S.M. AMBIENTALES E.U. 6. CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO 7. INFRAOBRAS INGENIERÍA S.A.S. 8. UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO 9. CONSORCIO INTER-INSTITUCIONALES	17 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 14.441** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Adquisición y entrega de unidades móviles médicas	ART	$ 2.046	1. UNIÓN TEMPORAL INGENIERÍAS MÓVILES	14 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 14.441** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Adecuación de centro educativo	ART	$ 1.580	1. CONSORCIO INCORA 2023 2. CONSORCIO DAKAR 3. CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023	10 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 14.441** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Publicación carta de aceptación
Interventoría integral	ART	$ 752	1. UCING S.A.S. – GRUPO 3 2. CONSORCIO VÍAS J.A. – GRUPO 1 2. CONSORCIO VÍAS J.A. – GRUPO 3 3. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA – GRUPO 1 4. CONSORCIO CONSULTA 23 – GRUPO 1 4. CONSORCIO CONSULTA 23 – GRUPO 2 4. CONSORCIO CONSULTA 23 – GRUPO 3	14 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | **Adjudicación $ 33.760** | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Estudios, diseños y construcción de la infraestructura de educación superior en el Catatumbo	ART	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO	$ 33.760	25 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 362.952** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	866-23	$50.382	Jul23 - Jul25	10%
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	$27.589	Feb20 - Oct23	74%
	Consorcio EGA	439-19	$15.017	Feb20 - Nov23	34%
	Consorcio FAM	111-20	$14.746	Abr20 - Nov23	90%
	Consorcio CEG-OME	162-20	$14.691	Abr20 - Oct23	35%
	Unión Temporal Futuro Pazcifico	110-20	$11.480	Jul20 - Nov23	76%
	Consorcio M&M PDET	312-20	$ 9.465	Jul20 - Ene24	70%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	$ 8.098	Feb20 - Nov23	79%
	Consorcio M&M FAM	311-20	$ 6.893	Jul20 - Ago23	82%

$ 362.952*

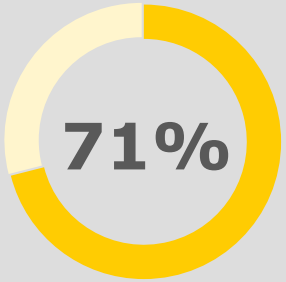

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 9 CPS, a las adiciones a 7 CPS y al CDP para gastos de desplazamiento y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 362.952** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Consorcio Construyendo Paz	437-19	$ 4.136	Feb20 - Sep23	66%
Ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo social y económico	OR Construcciones e Ingeniería SAS	433-22	$22.604	Sep22 - Dic23	27%
	Municipio de Chaparral (Tolima)	774-23	$ 4.503	Jul23 - Dic24	0%
	CDP Convenio Fondo Paz	736-22	$ 4.241	Dic22 - Dic24	0%
	Departamento de Putumayo	775-23	$ 3.644	Jul23 - Dic24	0%
	Municipio de La Montañita (Caquetá)	777-23	$ 3.516	Jul23 - Dic24	0%
	Municipio de Río Blanco (Tolima)	776-23	$ 2.536	Jul23 - Dic24	0%
Proyectos de Generación de Ingresos	UT E&C - Colombia en Paz	1068-21	$14.437	Dic21 - Dic23	90%
	UT por la Paz 2022	360-22	$10.892	Jun22 - Feb24	70%
	Corporación Colombia Internacional CCI	1042-21	$10.293	Dic21 - Dic23	90%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	358-22	$15.754	Abr22 - Sep23	95%
	UT ART 2023	1143-23	$15.266	Sep23 - Sep24	0%

$ 362.952*

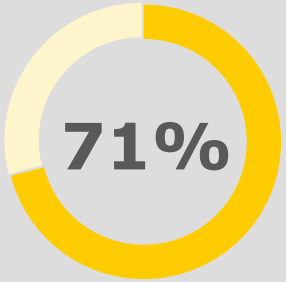

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 9 CPS, a las adiciones a 7 CPS y al CDP para gastos de desplazamiento y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 362.952** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Proyectamos Colombia SAS	436-22	$ 3.053	Ago22 - Abr23	100%
Prestación de Servicios	603 CPS	N/A	$37.169	Jun21 - Ago24	44%
Interventoría	Consorcio Interobras 2019	497-19	$ 7.805	Ene20 - Nov23	59%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	$ 7.448	Jul20 - Jun24	74%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	$ 7.331	Ene20 - Ene24	74%
	Velnec S.A.	437-22	$ 4.064	Sep22 - Ene24	11%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA LTDA	393-22	$ 127	Jun22 - May24	0%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$ 7.088	N/A	83%
Actualización catastral	Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC	1153-23	$ 4.062	Oct23 - Ene25	0%

$ 362.952*

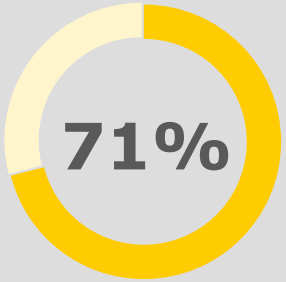

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 9 CPS, a las adiciones a 7 CPS y al CDP para gastos de desplazamiento y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 362.952** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio de transporte público terrestre	Transportes Especiales A & S S.A.S.	73-23	$ 3.377	Ene23 - Ene24	47%
Adquisición y entrega de ambulancias	Industrias Axial S.A.S.	1227-23	$ 2.760	Pendiente acta	0%
Actividades de conservación y desarrollo cultural	Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona - OWYBT	1262-23	$ 1.247	Pendiente acta	0%
Ejecutar proyecto de infraestructura productiva	Consorcio Eres 2022	417-22	$ 1.017	Ago22 - May24	0%
Arrendamiento de inmuebles	Situando S.A.S.	1182-23	$ 984	Pendiente acta	0%
Arrendamiento de inmuebles	Central de Inversiones S.A. - CISA	1124-23	$ 996	Pendiente acta	0%
Servicios de comunicación	Canal regional de televisión Teveandina S.A.S.	751-23	$ 750	Ago23 - Oct23	0%
Arrendamiento de inmuebles	Central de Inversiones S.A. - CISA	1108-23	$ 677	Oct23 - Jun25	0%
Adquisición licenciamiento plataforma ARCGIS	ESRI Colombia S.A.S.	563-22	$ 640	Nov22 - Nov23	100%

$ 362.952*

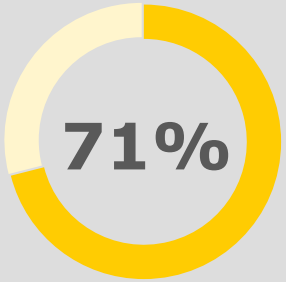

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 9 CPS, a las adiciones a 7 CPS y al CDP para gastos de desplazamiento y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 362.952** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición de inmuebles	Municipio El Tarra	628-23	$ 633	May23 - Ago23	94%
Formulación e implementación de un plan de fortalecimiento institucional	Universidad Pedagógica Nacional	645-23	$ 528	May23 - May24	30%
Tiquetes Aéreos	Expreso Viajes Y Turismo Expreso S.A.S.	102-23	$ 500	Feb23 - Feb24	19%
Estudio de pertinencia educativa	Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña	149-23	$ 499	Feb23 - Jul23	70%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	$ 12	Nov21 - N/A	100%

$ 362.952*

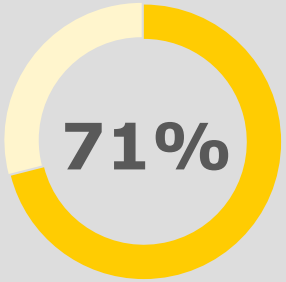

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 9 CPS, a las adiciones a 7 CPS y al CDP para gastos de desplazamiento y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.743**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$52.764	Feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	666 CPS	$45.069	Dic-17	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	1384 CPS	$48.374	Dic-17	Liquidado
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	Jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	Feb-20	En proceso de liquidación
Fundación SOCYA	112-20	$18.641	Nov-22	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	$16.467	Feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	Feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguán 2018	538-18	$13.890	Ene-20	En proceso de liquidación
Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	$ 9.475	Abr-22	En proceso de liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	$ 8.818	Oct-22	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	$8.769	Dic-20	En proceso de liquidación
Douglas Trade S.A.S.	721-21	$8.705	Abr-22	Liquidado
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	Dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	$7.627	Dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	$6.651	Ago-21	Liquidado
Consorcio EGA	440-19	$ 5.646	May-22	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	Dic-19	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.743**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	Feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$5.272	Feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$5.225	Sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	$ 3.250	Nov-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	$ 3.154	Abr-21	Liquidado
U.T. TCSC - Sabana FCP	1073-21	$ 2.966	Ene-23	Liquidado
Norte Ingenieros Ltda.	167-21	$ 2.981	Sep-22	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	$ 2.759	Dic-19	En proceso de liquidación
Inversiones BlucherS.A.S	463-22	$ 2.693	Ene-23	Liquidado
Consorcio ART JRUNOA	200-21	$ 2.004	Ene-22	Liquidado
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	$ 1.967	Nov-21	Liquidado
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	$ 1.965	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	$ 1.837	Ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	$ 1.848	Ago-19	En proceso de liquidación
Inversiones BlucherS.A.S	464-22	$ 1.698	Ene-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.743**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Unión Temporal Emprendimiento	14-21	$ 1.169	Jun-22	Liquidado
Software Estratégico S.A.S.	445-20	$ 1.532	Mar-22	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	$ 1.230	Abr-21	Liquidado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	$ 1.142	Ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$ 973	Nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S.	255-23	$ 878	May-23	Liquidado
COCOMACIA	821-20	$ 885	Feb-22	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	$ 797	Sep-22	Liquidado
Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	$ 643	Dic-21	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	$ 628	Oct-20	Liquidado
ERSI Colombia S.A.S.	858-20	$ 545	Nov-22	Liquidado
Novatours Ltda.	315-22	$ 450	Ene-23	En proceso de liquidación
Consorcio Intervial Antioquia	157-21	$ 422	Oct-22	En proceso de liquidación
Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	$ 413	Ene-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.743**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Proyectamos Colombia SAS	654-21	$ 341	Feb-22	Liquidado
Gastos Varios	N/A	$ 10	Feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$ 0	Nov-19	Liquidado
UT Fortalecimiento Territorial	261-23	$ 0	Ago-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 10.793	$ 677	$ -	$ -	$ -	$ 994.125	$ 128.392

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Disponible $ 10.793 | En Trámite $ 677 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Reincorporación	$ 10.793

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Viabilidad proyecto de vivienda	$ 590
Interventoría	$ 47
Defensa judicial	$ 40

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 994.125** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 772.106	Sep17 - Dic23	91%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	$ 91.081	Jun18 - Dic23	94%
Suministro de alimentos	N/A	N/A	$ 40.359	N/A	19%
Suministros víveres secos	Integralservicios SAS	493-22	$ 40.214	Oct22 - Sep23	77%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 35.537	Sep17 - Dic23	99%
Acciones de transferencia tecnológica y de conocimiento, fortalecimiento productivo y comercial	UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	1156-23	$ 5.329	Pendiente de acta	0%
Interventoría	CISP	520-22	$ 3.265	Oct22 - Oct24	53%
Fortalecimiento y Comercialización de Proyectos Productivos	Fiducoldex, vocera del fideicomiso Innpulsa Colombia	438-22	$ 2.000	Jul22 - Ene24	90%
Apoyo fortalecimiento institucional	CODES	548-22	$ 1.316	Nov22 - Sep23	70%
Prestación de Servicios	16 CPS	N/A	$ 1.543	Nov22 - Ago24	59%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	$ 853	N/A	48%

$ 994.125

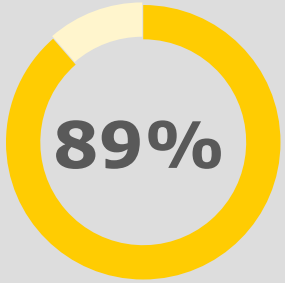

EJECUCIÓN

Fuente:. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 994.125** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Adecuación espacio físico acopio, preservación y conservación de productos agropecuarios	Monval Ingeniería S.A.S.	490-22	$ 230	Sep22 - Ago23	95%
Tiquetes aéreos	Comercializadora JE Tours S.A.S.	1157-23	$ 97	Oct23 - Oct24	0%
Servicio de transporte terrestre	Viajando Express S.A.S.	861-23	$ 80	Ago23 - Ago24	0%
Arrendamiento de equipos	Gamatécnica Ingeniería S.A.S.	1106-23	$ 68	Oct23 - Oct24	0%
Licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS.	435-22	$ 47	Jul22 - Jul23	100%

$ 994.125

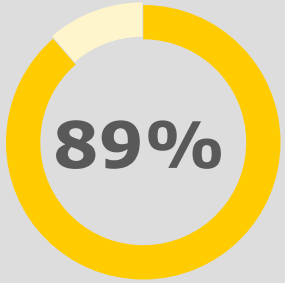

EJECUCIÓN

Fuente:. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 128.392**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	$ 30.447	Abr-21	Liquidado
UT FCP 2021	217-21	$ 25.472	Mar-22	Liquidado
Integral Servicios S.A.S.	261-22	$ 20.411	Oct-22	Liquidado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	$13.902	Mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	$12.219	Nov-19	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$ 4.037	May-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	$ 3.500	Mar-18	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	239-21	$ 2.528	Dic-22	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	$ 2.820	Mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios 20 CPS	N/A	$ 2.203	Dic-20	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	613-20	$ 2.060	Jul-22	En proceso de liquidación
Innpulsa Colombia	142-19	$ 1.977	Ago-20	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	245-20	$ 1.500	Dic-21	Liquidado
CODES	907-21	$ 1.213	Ago-22	Liquidado
Prestación de Servicios 22 CPS	N/A	$ 1.151	Feb-20	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$ 1.050	Jun-18	Liquidado
Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	$ 514	Oct-22	En proceso de liquidación
Experienza S.A.S	925-20	$ 400	Jul-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 128.392**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Conincag S.A.S.	143-20	$ 251	Abr-20	Liquidado
Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	$ 223	Dic-22	En proceso de liquidación
Subatours SAS	381-22	$ 100	Dic-22	En proceso de liquidación
Transportes especiales F.S.G. SAS.	430-22	$ 100	Feb-23	En proceso de liquidación
Subatours SAS	286-21	$ 84	Jun-22	Liquidado
Transporte Terrestre	209-21	$ 71	Abr-22	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	$ 60	May-21	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S	608-22	$ 45	Jul-22	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	$ 42	Jul-21	Liquidado
BIM Latinoamérica SAS	629-21	$ 12	Ago-22	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	$ -	Nov-19	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 159	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.906

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En proceso de cierre

Temporalidad: 2019

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Jurisdicción Especial para la Paz

Disponible
$ 159

En Trámite
$ -

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados

Nombre corto	Valor
Disponible JEP	$ 159

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Jurisdicción Especial para la Paz

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 43.906**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	Jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	239 CPS	$ 10.733	Nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	$9.139	Ene-21	Liquidado
Servisoft S.A.	56-19	$5.376	Jun-22	Liquidado
Archivo General de la Nación	498-19	$ 1.550	Sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	Ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	Dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	Jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$ 584	Mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	Nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$ 485	Abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	$ 363	Oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	Mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	$ 156	Jun-18	Liquidado
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	Sep-18	Liquidado
Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$77	May-22	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	Dic-18	Liquidado
Gastos de Desplazamiento	N/A	$57	Jul-22	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	Dic-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 40.207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48	$ 27.623

Primera Infancia ICBF

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Implementar acciones que promuevan la ampliación de la atención integral con pertinencia para las niñas y los niños en primera infancia que habitan en los municipios PDET, a través de 3 líneas de acción: i) gestión territorial y de política, ii) calidad y pertinencia de la atención integral, y iii) direccionamiento, seguimiento y gestión del conocimiento, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz y el Plan Especial de Educación Rural, en coherencia con lo dispuesto por la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2026

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Primera Infancia ICBF

Disponible
$ 40.207

En Trámite
$ -

Convocatoria

Evaluación

Adjudicación

Ejecución

Terminados

Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	$ 40.207

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Primera Infancia ICBF

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 48** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 48	N/A	100%

$ 48

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Primera Infancia ICBF

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 27.623**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	$3.877	Nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	$3.198	Jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	$3.052	Nov-20	Liquidado
Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	$2.574	Jul-22	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	$2.076	Ago-20	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	68 CPS	$2.999	Feb-19	Liquidado
Consorcia PDET 2021	1123-21	$1.895	Oct-22	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	$1.499	Dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	$1.391	Nov-20	Liquidado
Asesoría y Gestión CÍA SAS	306-22	$1.342	Sep-22	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	$1.387	Ago-20	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$1.076	Ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	9 CPS	$ 693	May-21	En proceso de liquidación
Consorcio S&T 2021	923-21	$ 528	Oct-22	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	$ 35	Sep-22	Liquidado
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	$ -	Nov-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.804

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Disponible $ 43 | En Trámite $ - | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	$ 43

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 2.804**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	89 CPS	$ 2.799	Jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	$ 5	Abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	Mar-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 11.967	**$ 2.050**	**$ 518**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.240**	**$ 53.154**

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad y Defensa Judicial del Fondo Colombia en Paz.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2026

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Disponible $ 11.967 | En Trámite $ 2.050 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Funcionamiento	$ 11.967

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Auditoría	$ 1.300
Arrendamiento y administración	$ 749
Defensa judicial	$ 1

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | **Convocatoria $ 518** | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre recepción de propuestas
Servicio de transporte terrestre	ART	$ 259	14 de noviembre de 2023
Servicio de aseo y cafetería	ART	$ 259	21 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 58.240** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	$22.179	Oct19 - Dic23	91%
Nómina	Apoyamos Procesos Temporales S.A.S.	758-23	$11.981	Jul23 - Abr24	29%
Nómina	PEC y CIA. S.A.S.	383-22	$11.506	Jun22 - Dic23	99%
Servicios TIC	IMPRETIC´S E.I.C.E	416-22	$ 2.878	Ago22 - Sep23	91%
	Talento Sólido S.A.S.	998-23	$ 2.606	Oct23 - Sep24	0%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 1.268	Nov18 - Dic23	95%
Auditoría	Ernst & Young S.A.S.	380-22	$ 1.061	Jun22 - Oct23	100%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	$ 937	Dic20 - Mar23	96%
Servicio de nube pública	Comunicación Celular - COMCEL S.A.	TVEC2	$ 613	Ago23 - Ago24	0%
Custodia de Documentos	PGD procesos de gestión documental SAS	439-22	$ 604	Ago22 - Feb24	59%
Tiquetes aéreos	Pubblica S.A.S.	1144-23	$ 431	Sep23 - Sep24	0%
	Novatours LTDA	356-22	$ 300	May22 - May23	29%
Operador Logístico	Century Media S.A.S.	671-23	$ 300	Jun23 - Jun24	6%

$ 58.240

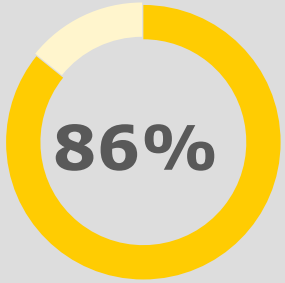

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 58.240** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty Seguros S.A.	Póliza	$ 232	Jul22 - Jul23	100%
	Liberty Seguros S.A.	517489	$ 232	Ago23 - Ago24	100%
	Zurich Colombia Seguros S.A.	95118275	$ 9	Ago23 - Ago24	100%
	Zurich Colombia seguros S.A.	Póliza	$ 7	Jul22 - Jul23	100%
Arrendamientos	Inversiones contadora SAS Y Deissy Alexandra Betancur Yepes	521-22	$ 184	Oct22 - Oct24	55%
Aseo y Cafetería	Grupo empresarial SEISO S.A.S.	465-22	$ 152	Sep22 - Dic23	78%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales Nueva Era S.A.S.	379-22	$ 170	Jun22 - Dic23	80%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 107	N/A	88%
Tiquetes aéreos	Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S.	642-23	$ 59	May23 - Sep23	0%

$ 58.240

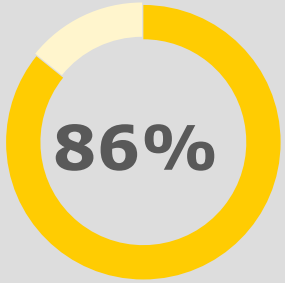

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 58.240** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	$ 50	Dic20 - Dic23	27%
Diseño e implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Aura Elena González Gutiérrez	1198-23	$ 22	Oct23 - Ene24	0%
Apoyo plataforma TVEC	Laura Alexandra Chamorro	878-23	$ 21	Jul23 - Ene24	17%
Acompañamiento uso SECOP	Laura Alexandra Chamorro	223-23	$ 14	Feb23 - Jun23	100%
Elementos de papelería	Panamericana Librería y Papelería	TVEC1	$ 11	Abr23 - Abr23	100%
Servicio de restaurante y material logístico	John Faiber Molano Polania	221-23	$ 3	Feb23 - Feb23	100%
Referenciador digital automático	LEGIS Editores S.A.	449-23	$ 2	Mar23 - Mar24	100%
Salón de reuniones	GEB Cadena Hotelera S.A.S.	222-23	$ 1	Feb23 - Mar23	100%

$ 58.240

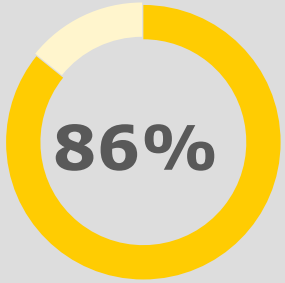

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Fondo Colombia en Paz - FCP

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 53.154**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Su Temporal	166-21	$ 9.550	May-23	Liquidado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	$ 6.619	Sep-19	Liquidado
Nomina	N/A	$ 6.510	Jul-22	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	$ 5.701	Abr-21	Liquidado
IMPRETIC´S E.I.C.E	304-21	$ 2.372	Jul-22	Liquidado
Linktic S.AS.	40-19	$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.101	May-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	Mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	May-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	$ 1.249	May-21	Liquidado
Ernst & Young	55-19	$ 964	Dic-20	Liquidado
Ernst & Young	867-20	$ 947	Abr22	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	Dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 560	Dic-20	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	$471	Sep-22	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	Feb-18	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 555	Nov-18	Liquidado
Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	$ 219	Ago-22	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	Ene-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 53.154**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Liberty Seguros	N/A	$ 188	Jul-21	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	$ 188	Jul-22	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	May-18	Liquidado
Grupo Empresarial SEISO	67-21	$ 119	Sep-22	Liquidado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	$ 133	Mar-21	Liquidado
Fenix Media Group SAS	123-21	$ 122	Dic-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	Dic-17	Liquidado
Imagroup Colombia SAS	882-21	$ 100	Oct-22	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	Abr-18	Liquidado
Nexura Internacional SAS	554-21	$ 83	Feb-22	En proceso de liquidación
Transportes Especiales A&S SAS	549-21	$ 82	May-22	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	May-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	Nov-17	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 66	Jun-18	En proceso de liquidación
Eminser S.A.S.	781-18	$ 65	May-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 41	Dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 38	Abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	$ 33	Jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	Nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	$ 31	Sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	$ 30	Jul-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 53.154**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	$ 22	Jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	Dic-17	Liquidado
Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 19	Sep-22	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	522-22	$ 19	Nov-22	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	May-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	$14	Oct-20	Liquidado
Godoy & Hoyos Abogados S.A.S.	571-22	$10	Dic-22	En proceso de liquidación
Comunitic S.A.S.	591-22	$10	Dic-22	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	694-22	$ 8	Ene-23	En proceso de liquidación
Zurich Colombia Seguros SA	N/A	$ 8	Jul-22	Liquidado
Irotama SAS	280-19	$ 7	Nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	$ 7	Jun-21	Liquidado
José Leandro Londoño Henao	624-22	$ 7	Feb-23	En proceso de liquidación
MCH Traducciones S.A.S	253-20	$ 6	Oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 6	Jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	Dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	$ 6	Jun-19	Liquidado
Arquiredes construcciones S.A.S.	462-22	$ 6	Ago-22	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	$ 5	Jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	$ 5	Dic-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 53.154**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Vector Ltda.	375-19	$ 5	Nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	$ 5	Mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	$ 5	Ago-21	Liquidado
C J Motors LTDA	525-22	$ 5	Nov-22	En proceso de liquidación
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	$ 4	Dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	$ 1	Mar-20	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 3.938	$ 537	$ 2.300	$ -	$ -	$ 13.948	$ 30.529

Implementación

Transversal

Entidad Ejecutora: Oficina del Alto Comisionado de Paz – Unidad de Implementación

Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Implementación de la OACP.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Implementación

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminados
$ 3.938	$ 537					

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Implementación	$ 3.938

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Fortalecer capacidades de la CSIVI	$ 537

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Implementación

Disponible | En Trámite | **Convocatoria $ 2.300** | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre recepción de propuestas
Operador logístico	ART	$ 2.300	27 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Implementación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 13.948** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	79 CPS	N/A	$ 9.392	Mar21 - Jul24	61%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 1.348	N/A	80%
Operador Logístico	Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S.	427-22	$ 1.449	Sep22 - Dic23	78%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	1002-21	$ 1.300	Dic21 - Jun23	100%
Tiquetes aéreos	Pubblica S.A.S.	572-22	$ 315	Nov22 - Nov23	47%
Operador Logístico	Pubblica S.A.S.	1300-23	$ 116	Pendiente acta	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	$ 29	N/A	71%

$ 13.948*

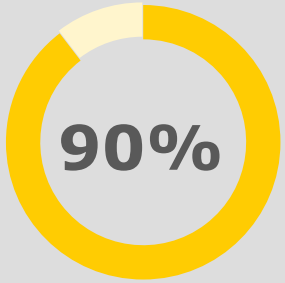

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a la suscripción del contrato 1300-23

Implementación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 30.529**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	129 CPS	$12.196	Dic-17	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	39 CPS	$ 3.782	Oct-19	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	$ 2.991	Jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.770	Jul-18	Liquidado
Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	$ 2.548	Ago-22	Liquidado
Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	$ 2.550	Ene-22	En proceso de liquidación
Infotic S.A.	238-21	$ 1.254	Ago-22	Liquidado
Sociedad hotelera Tequendama SA	428-22	$ 925	Oct-22	Liquidado
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 495	Jul-19	Liquidado
Subatours Ltda.	57-19	$ 353	Sep-22	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 251	Jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	$ 120	Sep-21	En proceso de liquidación
Subatours Ltda.	1029-21	$ 91	Jun-22	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	Dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	$ 62	Sep-19	Liquidado
Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	$ 49	Jun-22	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$ 16	Dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	$ 3	Jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	$ 0,01	Nov-17	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Cerrada

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sociedad de Activos Especiales

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 1.820**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.820	Ago-19	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 2.738**

Colombia Sostenible-Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Cerrada

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Colombia Sostenible-Nación 2018

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 2.738**

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$ 505	Oct-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$ 503	Dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$ 503	Oct-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$ 497	Oct-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	Oct-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 240	Feb-17	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 71.750	$ 2.514	$ -	$ -	$ -	$ 231.468	$ 83.295

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2025

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Disponible $ 71.750 | En Trámite $ 2.514 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible BID Préstamo	$ 71.750

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Fortalecimiento de la producción de Pirarocu	$ 364
Implementación de una estrategia integral de fortalecimiento para mejoras de capacidades productivas del cultivo de cacao	$ 335

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Disponible | **En Trámite $ 2.514** | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Conservación, recuperación y sostenibilidad de cananguchales	$ 245
Implementación del cultivo de Pirarocu	$ 229
Mejoramiento de la producción de plátano con pequeños productores	$ 226
Contratos de prestación de servicio	$ 195
Fortalecimiento de la cadena del valor de Sacha Inchi	$ 153
Incentivar la reconversión del cultivo de café hacia esquemas de producción sostenibles	$ 126
Generación de ingresos y alternativas de producción avícola	$ 124
Implementación de esquemas de producción orgánica de plátano	$ 114

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Disponible | **En Trámite $ 2.514** | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Fortalecimiento de la cadena del valor del cacao	$ 101
Formación y capacitación en producción sostenible	$ 100
Implementación un sistema agroforestal "ñame espino/maíz/frutales"	$ 94
Establecimiento de un sistema productivo de ñame diamante en asocio con maíz y frijol	$ 68
Fortalecimiento en la cadena de valor de la tilapia roja	$ 28
Implementación de tecnologías sostenibles para incrementar la competitividad del cultivo del cacao	$ 14

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Santa Isabel	122-22	$ 6.693	Mar22 - Mar24	100%
	DEBISAMCO	108-22	$ 6.147	Abril22 - Oct24	70%
	Fundación ambientalistas y reforestadores de Colombia	369-22	$ 5.708	Jun22 - Jun24	35%
	ECODELCA	850-20	$ 5.497	Nov20 - Dic23	100%
	Corponariño	848-20	$ 5.482	Nov20 - Jul24	35%
	Corporación Lexcom Colombia	104-22	$ 5.361	Jun22 - Jun24	35%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	$ 5.135	Nov20 - Dic23	100%
	Conservation International	740-20	$ 4.826	Nov20 - Mar23	99%
	ASOPATÍA	304-22	$ 4.582	May22 - May24	70%
	FEDEGAN	290-22	$ 4.058	Abr22 - Feb24	70%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	$ 4.499	Nov20 - Nov23	100%
	Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021	361-22	$ 4.394	Jun22 - Jun24	35%
	Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021	341-22	$ 3.709	Jun22 - Jun24	35%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	$ 3.528	Nov20 - Nov23	100%
	Fundación con vida	852-20	$ 3.397	Nov20 - Ago24	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	106-22	$ 3.285	Mar22 - Mar24	100%
	Masbosques	260-22	$ 3.236	May22 - May24	70%
	Corporación PBA	283-22	$ 3.204	Abr22 - Abr24	70%

$ 231.468

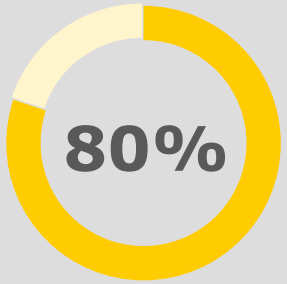

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Universidad de Ibagué	291-22	$ 2.823	Jul22 - Jul24	35%
	ONF Andina	765-20	$ 2.753	Nov20 - Dic23	100%
	Campodulce	845-20	$ 2.718	Nov20 - Dic24	100%
	HEVEANCOR	793-20	$ 2.546	Nov20 - Dic23	100%
	ASPROPISAT	342-22	$ 2.457	May22 - Nov23	70%
	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	$ 2.293	May21 - Nov23	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	107-22	$ 2.214	Mar22 - Mar24	100%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	44-22	$ 2.151	Jun22 - Jun24	70%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	$ 2.091	Nov20 - Jul23	100%
	FUDESCO	508-22	$ 1.980	Nov22 - Nov23	70%
	Unión Temporal Cindap - Cordep	301-22	$ 1.979	May22 - Sep24	70%
	Funmineros	923-20	$ 1.854	Dic20 - Dic23	100%
	FESU	734-20	$ 1.817	Nov20 - May23	100%

$ 231.468

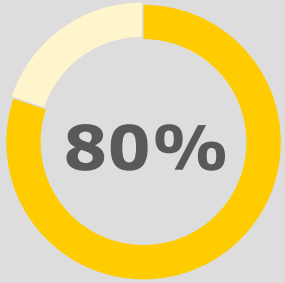

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Resguardo indígena YUPKA IROKA	370-22	$ 1.815	Jun22 - Jun24	100%
	Codesarrollo	276-22	$ 1.800	Mar22 - Mar24	70%
	CCI	259-22	$ 1.656	Mar22 – Mar24	100%
	COGAINCHAIRÁ	271-22	$ 1.602	Mar22 - Sep23	100%
	Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta del río Palo	297-22	$ 1.598	Mar22 - May24	100%
	Fundación para el desarrollo integral de las comunidades – SINERGIA	374-22	$ 1.455	Jun22 - Jun24	35%
	Unión temporal agrofuturo del norte	343-22	$ 1.440	May22 - May24	35%
	ASOPRODEMA	295-22	$ 1.341	May22 - Nov23	70%
	UNAD	281-22	$ 1.260	May22 - Nov23	2%
	CETEC	434-22	$ 1.260	Sep22 - Mar24	70%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	$ 1.207	Jun21 - Ago23	100%
	Fundación Horizonte	269-22	$ 1.206	May22 - Mar24	70%
	Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI	98-22	$ 1.204	Jun22 - Dic23	35%
	Savia Ambiental S.A.S	302-22	$ 1.197	May22 - May24	70%
	CETEC	743-20	$ 1.170	Nov20 - May23	100%

$ 231.468

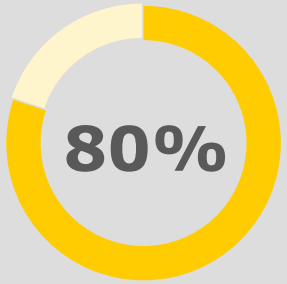

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Universidad Surcolombiana	125-22	$ 1.170	Sep22 - Mar24	35%
	Consorcio Prosercot Asociados	378-22	$ 1.170	Jun22 - Jul24	35%
	Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB	314-22	$ 1.169	Abr22 - Ago24	70%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la Plata Bahía Málaga	382-22	$ 1.167	Sep22 - Sep24	35%
	Fundación Suyusama	851-20	$ 1.160	Nov20 - May24	100%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	$ 1.133	Nov20 - Abr23	99,9%
	Fundación Salva Terra	730-20	$ 1.125	Nov20 - Mar23	100%
	Comité de Ganaderos del Tolima	36-22	$ 1.107	Mar22 - Mar24	70%
	Universidad Nacional	737-20	$ 1.101	Nov20 - Oct24	58%
	GESTANDO	277-22	$ 1.089	Abr22 - Abr24	70%
	Fundación EQUAL Colombia	123-22	$ 1.064	Mar22 - Ene24	50%
	Fundación Orinoquia	606-23	$ 1.056	Ago23 - Feb25	35%
	Fundación Orinoquia Biodiversidad	128-22	$ 1.051	Abr22 - Abr24	35%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	$ 1.021	Abr22 - Abr24	100%
	Proyecto NASA	345-22	$ 1.008	Oct22 - Abr24	35%
	ASOPROTECCO	262-22	$ 981	May22 - Oct23	100%

$ 231.468

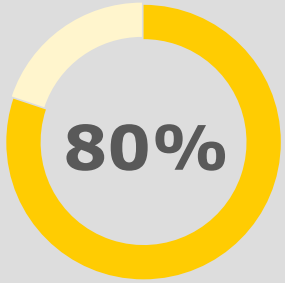

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	UNIMINUTO	43-22	$ 981	Mar22 - Nov23	70%
	PRAGRO SAS	41-22	$ 977	Mar22 - Dic23	100%
	Fundación asesorías e investigaciones profesionales	58-22	$ 954	Mar22 - Mar24	100%
	Consorcio PBA	274-22	$ 936	May22 - Nov23	70%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	$ 929	Nov20 - Sep24	35%
	Corporación autónoma regional del Cauca	564-22	$ 920	Mar23 - Feb25	35%
	CAFISUR	258-22	$ 927	May22 - Nov23	70%
	Fundación Horizonte	57-22	$ 918	May22 - Mar24	70%
	COSURCA	101-22	$ 917	Abr22 - May24	70%
	Corporacion PBA	115-22	$ 917	Abr22 - Abr24	70%
	CORPOYARUMOS	114-22	$ 909	May22 - Nov23	35%
	FUNDAHERENCIA	275-22	$ 907	May22 - Nov23	70%
	Grupo asociativo de cafeteros Villalibano	109-22	$ 900	Abr22 - Ene24	100%
	CAFISUR	272-22	$ 900	May22 - May24	70%
	Consorcio "RAÍCES"	362-22	$ 900	Jun22 - Jun24	70%
	CODES	300-22	$ 900	May22 - Nov23	100%
	Innovakit SAS BIC	48-22	$ 900	Mar22 - Nov23	100%
	GENYTEC	112-22	$ 900	Abr22 - Abr23	70%

$ 231.468

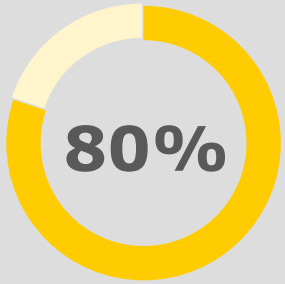

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Proyecto NASA	313-22	$ 888	May22 - Nov23	100%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	$ 883	Nov20 - Sep23	100%
	Futuro y desarrollo comunitario	120-22	$ 873	Jun22 - Jun24	35%
	Fundación Pancitas Felices	292-22	$ 873	May22 - Nov23	70%
	Ecoexplora Consultoría S.A.S BIC	625-23	$ 866	Jul23 - Jul24	35%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	$ 864	Mar22 - Nov23	50%
	COMICACAO	344-22	$ 864	May22 - May24	35%
	FUDESCO	510-22	$ 851	Oct22 - Jul24	70%
	COSURCA	46-22	$ 861	Abr22 - Feb24	70%
	CINDAP	45-22	$ 833	Jun22 - Mar24	70%
	Corporación Colombia Internacional CCI	257-22	$ 819	Mar22 - Sep23	100%
	Prodesarrollo Limitada	299-22	$ 812	May22 - Mar24	100%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	$ 810	Nov20 - Abr23	100%
	Corporación Colombia Agropecuaria	273-22	$ 801	Jun22 - Jun24	35%
	Fundación reserva natural la Palmita Centro de Investigación	308-22	$ 794	Oct22 - Oct24	35%
	FTV	40-22	$ 783	Mar22 - Dic23	100%
	ASOCALM	324-22	$ 773	May22 - Ene24	100%

$ 231.468

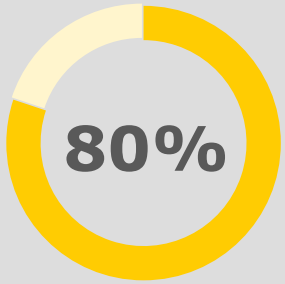

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo	105-22	$ 766	Mar23 - Mar24	70%
	COOBRA	781-20	$ 765	Nov20 - Mar23	100%
	Innovakit SAS BIC	51-22	$ 755	Mar22 - Sep23	100%
	ASOM	124-22	$ 720	Mar22 - Sep23	35%
	Corpoamazonía	245-22	$ 720	Jun22 - Abr24	70%
	FUNDECERP	131-22	$ 719	May22 - Mar24	70%
	Fundación Trópico	794-20	$ 709	Dic20 - Jun23	100%
	Fundación Ayudar	502-22	$ 702	Dic22 - Jun24	35%
	FUNINSUR	113-22	$ 693	Mar22 - Jul24	70%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	37-22	$ 684	Mar22 - Nov23	100%
	CADI	103-22	$ 675	Mar22 - Dic23	70%
	CORPOJAGUAR	56-22	$ 675	Abr22 - Abr23	70%
	Corporación Colombia Internacional CCI	255-22	$ 666	Mar22 - Dic23	100%
	Corporación Ambiental SIE	298-22	$ 666	May22 - Mar24	70%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	$ 665	Nov20 - Mar23	99,9%
	Fundación Planeta Rural	59-22	$ 662	Mar22 - Mar24	70%
	Corporación para la sostenibilidad de la subcuenca del rio palo	346-22	$ 662	May22 - Nov23	100%

$ 231.468

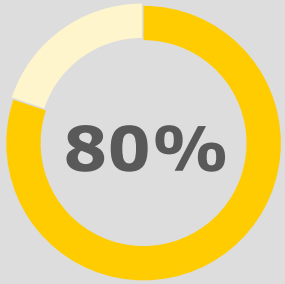

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre	860-20	$ 661	Nov20 - May23	100%
	Asesorías y Servicios de Ingeniería	54-22	$ 657	Abr22 - Abr23	100%
	FUNDARREGION	267-22	$ 657	Abr22 - Abr23	35%
	ASOGANADO	787-20	$ 648	Nov20 - Mar23	100%
	Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz	263-22	$ 648	Mar22 - Sep23	100%
	Fundacion para el desarrollo territorial y comunitario	865-23	$ 639	Ago23 - Feb25	35%
	Corporación PBA	110-22	$ 638	Abr22 - Abr24	70%
	ASI	53-22	$ 637	Mar22 - Nov23	100%
	Corpoamazonía	50-22	$ 630	Feb22 - Ene24	100%
	Fundación integral para el desarrollo sostenible Findes	323-22	$ 630	May22 - Nov23	100%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	42-22	$ 630	Mar22 - Nov23	100%
	Union Temporal Agromanifue	305-22	$ 630	Abr22 - Mar23	100%
	FUNDARREGION	266-22	$ 630	Abr22 - May24	70%
	U.T AGROMANIFUE	289-22	$ 621	Abr22 - Abr23	100%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	47-22	$ 621	Jun22 - Jun24	70%
	ASI	55-22	$ 621	Mar22 - Ene24	100%
	Fundación Planeta Rural	268-22	$ 619	Mar22 - Mar23	100%
	Acuicula Green Fish SAS	303-22	$ 607	Abr22 - Oct23	100%

$ 231.468

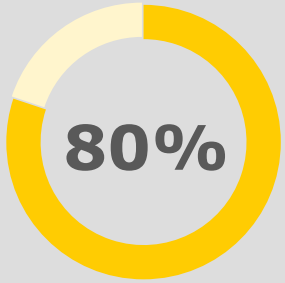

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	SERVICURE	129-22	$ 603	Mar22 - Ene24	70%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	$ 603	Nov20 - Abr23	95%
	CAFISUR	100-22	$ 603	May22 - Nov23	70%
	Corporación Colombia Internacional CCI	284-22	$ 593	Mar22 - Mar23	35%
	PRAGRO SAS	39-22	$ 602	Mar22 - Sep23	100%
	UNAD	282-22	$ 600	May22 - Nov23	1%
	GENYTEC	111-22	$ 600	Abr22 - Abr23	70%
	COPEX	788-20	$ 594	Nov20 - Oct23	100%
	ASOPRODAMET	285-22	$ 593	Mar22 - Abr23	50%
	Instituto Amazónico de Investigaciones SINCHI	265-22	$ 591	Jun22 - Jun24	35%
	Cámara de Comercio de Arauca	293-22	$ 591	May22 - Nov23	70%
	Corporación Colombia Internacional CCI	256-22	$ 585	Mar22 - Mar24	70%
	Corpoamazonía	38-22	$ 585	Feb22 - Jul23	100%
	CORSOC-ONG	127-22	$ 585	Mar22 - Mar23	98%
	Federación nacional de cafeteros de Colombia	126-22	$ 584	Jul22 - Abr24	70%
	Bolivar - Asocafe	121-22	$ 584	Abr22 - Abr24	70%
	CINDAP	49-22	$ 585	Mar22 - Ene24	70%
	Fundación Hijos de la Sierra Flor	264-22	$ 585	Mar22 - Mar24	100%

$ 231.468

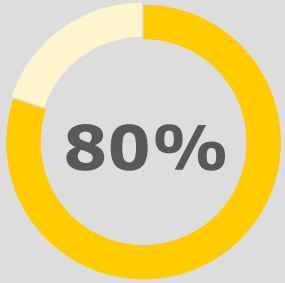

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de economía solidaria del medio y bajo Caguán - ASOES	648-23	$ 453	Jul23 - Jul24	0%
		286-22	$ 416	Mar22 - Sep23	100%
	Instituto Amazónico de investigaciones SINCHI	97-22	$ 327	Jun22 - Jun24	0%
	CECIDIC	368-22	$ 244	Oct22 - Abr24	35%
Prestación de Servicios	68 CPS	N/A	$11.113	Mar21 - Feb25	61%
Auditoría	Deloitte & Touche S.A.S.	106-23	$ 500	Feb23 - Jun25	31%
	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	$ 343	Ene21 - N/A	100%
Servicios TIC	Talento Sólido S.A.S.	998-23	$ 462	Oct23 - Sep24	0%
Arrendamiento	Puentes y Carreteras S.A.S.	833-23	$ 432	Jul23 - May25	13%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	$ 295	Nov21 - Oct23	85%
Consultoría	Universidad de los Andes	518-22	$ 198	Nov22 - Abr23	50%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 198	N/A	86%
Tiquetes	Subatours S.A.S.	214-19	$ 163	Ago19 - Feb25	60%
Consultoría herramienta tecnológica	Víctor Andrés Valencia	636-23	$ 129	May23 - May24	0%
Operador Logístico	Imagroup Colombia S.A.S.	848-23	$ 55	Jul23 - Feb25	7%

$ 231.468

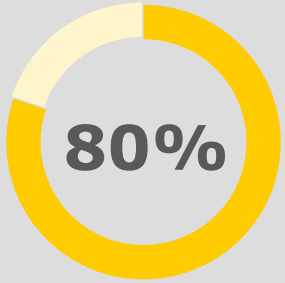

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 231.468** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Operador Logístico	Imagroup Colombia S.A.S.	461-22	$ 50	Ago22 - May23	90%
Videos instructivos	Fundación Cine Documental Investigación Social	605-23	$ 49	Abr23 - May24	14%
Hosting, ayuda portal web	High Quality Solutions LA EU	877-23	$ 10	Ago23 - Ago25	0%
Certificado digital	Camerfirma	655-21	$ 0,40	Ago21 - Feb25	100%

$ 231.468

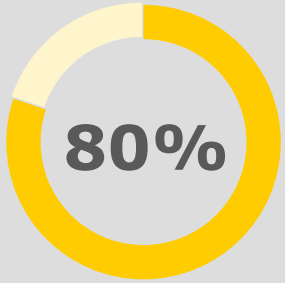

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 83.295**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
50 Contratos de Prestación de Servicios	-	$ 5.576	Oct-19	Liquidado
76 Contratos de Prestación de Servicios	-	$ 4.828	Sep-19	En proceso de Liquidación
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	$ 2.459	Feb-23	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional	399-19	$ 2.031	May-20	En proceso de Liquidación
CRC	905-21	$ 1.966	Feb-23	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	$ 1.929	May-20	Liquidado
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	$ 1.927	May-20	Liquidado
Misión Verde	726-20	$ 1.926	Ene-23	En proceso de Liquidación
Fundación Proterritorio	744-20	$ 1.873	Nov-22	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	$ 1.603	Jun-21	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	$ 1.597	Jun-21	Liquidado
ACAMAFRUT	778-20	$ 1.593	Ago-22	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	$ 1.538	May-20	Liquidado
MCC	786-20	$ 1.530	Ago-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	$ 1.577	Jun-21	Liquidado
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	$ 1.527	May-20	Liquidado
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	$ 1.349	Jun-21	Liquidado
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	$ 1.476	Jul-21	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	$ 1.438	May-20	Liquidado
ONF Andina	727-20	$ 1.332	Sep-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 83.295**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
UT Preservar Carbo Espira	927-20	$ 1.297	Ago-21	En proceso de Liquidación
SMURFIT	795-20	$ 1.233	Feb-23	En proceso de Liquidación
Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	$ 1.125	Dic-22	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	$ 1.094	Jun-21	En proceso de Liquidación
ASOCAFE	779-20	$ 1.089	Dic-22	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	$ 1.078	Jun-21	Liquidado
FUDESCO	733-20	$ 1.071	Nov-22	En proceso de Liquidación
Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	$ 1.065	Ene-23	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	$ 1.058	Jul-20	Liquidado
Proterritorio	838-20	$ 1.047	Jun-21	Liquidado
Portafolio Verde	840-20	$ 1.040	Jun-21	Liquidado
Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.117	Sep-21	Liquidado
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	$ 1.074	Oct-21	Liquidado
Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	$ 990	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	$ 979	Jun-21	Liquidado
RAPE Región Central	443-22	$ 956	Sep-23	En proceso de liquidación
INPROSEC	841-20	$ 941	Jun-21	Liquidado
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	$ 924	Jun-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 83.295**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
APCA Corporación para el Desarrollo ral y Urbano de Colombia	836-20	$ 940	Jun-21	Liquidado
CAFISUR	741-20	$ 900	Sep-22	En proceso de Liquidación
COOPERACAFE	738-20	$ 900	Feb-23	En proceso de Liquidación
CAFISUR	742-20	$ 899	Sep-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	$ 899	Sep-22	En proceso de Liquidación
FUN Lantano	783-20	$ 888	Nov-22	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	$ 885	Jul-21	Liquidado
Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	$ 833	Nov-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	739-20	$ 828	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	$ 793	Jun-21	Liquidado
Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	$ 792	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Ayudar	729-20	$ 790	Feb-22	Liquidado
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	$ 780	Ago-21	En proceso de Liquidación
ASOHECA	859-20	$ 777	Oct-22	En proceso de Liquidación
Asociación el futuro del mañana	862-20	$ 773	Jun-22	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	$ 745	Ago-21	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	$ 677	Jun-21	Liquidado
CORPOTUNIA	782-20	$ 660	Mar-22	Liquidado
Fundación ayudar en Acción	736-20	$ 657	Feb-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 83.295**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Universidad de los Andes	309-20	$ 655	Oct-21	En proceso de Liquidación
INPROSEC	784-20	$ 639	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORURAL	797-20	$ 639	Dic-22	En proceso de Liquidación
Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	$ 630	Sep-22	En proceso de Liquidación
Campodulce	825-20	$ 628	Sep-22	En proceso de Liquidación
SEPAS - DIPAL	826-20	$ 621	Abr-24	En proceso de Liquidación
Corporación grupo trópico diverso	857-20	$ 614	Oct-22	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	$ 612	Dic-22	En Proceso de Liquidación
ASOCOOPH	780-20	$ 585	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORPOJAGUAR	789-20	$ 572	Nov-22	En proceso de Liquidación
FMEPAC	854-20	$ 530	Mar-22	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	$ 479	Sep-21	Liquidado
CCI	761-20	$ 323	Ene-23	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	$ 71	Jun-20	Liquidado
Mas medios diseño y comunicación estratégica S.A.S.	492-22	$ 14	Feb-23	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 83.295**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
High Quality Solutions la E.U.	831-20	$ 10	Abr-22	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	$ 6	Sep-20	Liquidado
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	-	Nov-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	855-20	-	May-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 1.688	$ 800	$ -	$ -	$ -	$ 13.664	$ 7.484

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2024

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Disponible $ 1.688 | En Trámite $ 800 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible BID Facilidad	$ 1.688

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Formación y capacitación en producción sostenible	$ 776
Contratos de prestación de servicio	$ 24

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Disponible | En trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 13.664** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	APROCASUR	279-22	$ 1.211	Mar22 - Dic23	100%
	Corpoamazonia	525-20	$ 1.140	Nov20 - May23	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	117-22	$ 972	Mar22 - Sep23	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	118-22	$ 900	Mar22 – Sep23	100%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	119-22	$ 900	Mar22 - Jun23	100%
	Fundación Preservar	523-20	$ 850	Ago20 - May23	100%
	La fundación de mineros S.A	280-22	$ 783	May22 - May24	70%
	CCI	278-22	$ 687	Mar22 - Nov23	100%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	$ 680	Feb21 – Abr23	100%
	UNAD	130-22	$ 639	May22 - Nov23	6%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	$ 726	Sep20 - May23	100%
	Consultoría Estratégica Integral S.A.S – CEINTE S.A.S	752-23	$ 460	Jul23 - Jul24	0%
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	Corporación Colombiana internacional	844-21	$ 545	Oct21 - Abr23	100%

$ 13.664

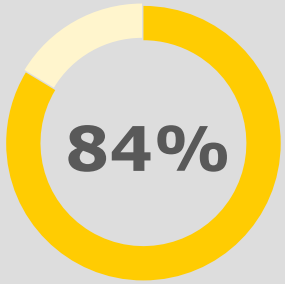

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

BID Facilidad

Disponible | En trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 13.664** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Formación y capacitación en producción sostenible	Corporación parque tecnológico de innovación del café y su caficultura TECNICAFÉ	1207-23	$ 647	Pendiente acta	0%
	Asociación agropecuaria UCEBUL	1209-23	$ 570	Pendiente acta	0%
	Riosierra S.A.S.	1208-23	$ 210	Pendiente acta	0%
	Asociación agropecuaria UCEBUL	1211-23	$ 160	Pendiente acta	0%
	Asociación agropecuaria UCEBUL	1210-23	$ 129	Pendiente acta	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	8 CPS	N/A	$ 472	May22 – Jun24	55%
Auditoría	Deloitte & Touche S.A.S.	45-21	$ 154	Feb21 - Sep23	100%
		105-23	$ 153	Feb23 – Jun24	50%
		44-21	$ 100	Feb21 - N/A	100%
		104-23	$ 43	Feb23 - Oct23	20%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 118	N/A	77%

$ 13.664

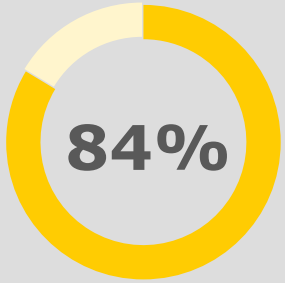

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

BID Facilidad

Disponible | En trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 13.664** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejec. Financ.
Diseño e impresión material visual	Sinergia P&M S.A.S	326-22	$ 86	Abr22 - Abr23	100%
Campaña BIBO	Comunican S.A.	457-22	$ 75	Ago22 - May23	100%
Consultoría herramienta tecnológica	Víctor Andrés Valencia	636-23	$ 51	May23 - May24	29%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	$ 33	Nov19 - Jun23	93%
		447-22	$ 20	Ago22 - Mar24	26%
		357-22	$ 69	Abr22 - Jul23	17%
Operador Logístico	Pubblica S.A.S.	507-23	$ 60	Mar23 - Jun23	100%
Página web	High Quality Solutions La EU	353-22	$ 21	May22 - May23	100%

$ 13.664

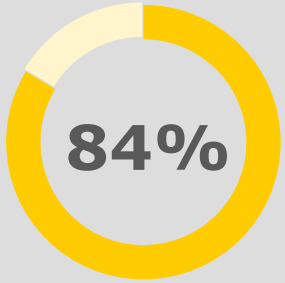

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

BID Facilidad

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 7.484**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.748	Sep-21	Liquidado
Amazon Corporation Team	524-20	$ 1.595	Ene-23	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	$ 1.585	Dic-22	En proceso de Liquidación
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	$ 1.309	Sep-21	Liquidado
21 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$ 714	Nov-19	En proceso de Liquidación
7 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$ 474	Nov-19	Liquidado
Editorial la republica SAS	444-22	$ 48	Dic-22	En proceso de Liquidación
Compañía pedagógica SAS	482-22	$ 9	Feb-23	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	412-19	$ 3	Oct-21	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization for Development Cooperation	593-20	-	Ene-21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 3.766	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 12.629	$ 6.848

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

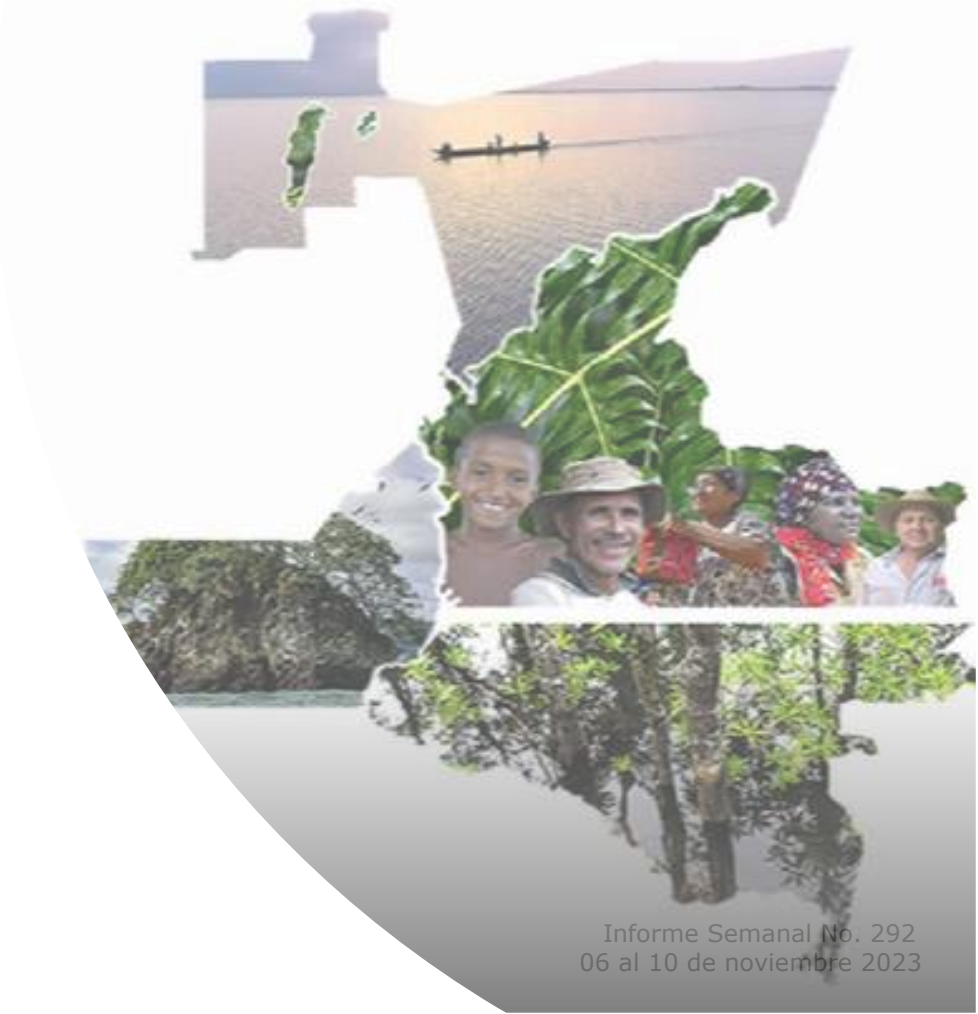

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminados
$ 3.766	$ 1					

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Herencia Colombia	$ 3.766

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Defensa judicial	$ 1

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 12.629** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia	1062-21	$ 6.200	Dic21 - Jun23	100%
Estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana	Corporación grupo empresarial ASES	418-22	$ 2.776	Ago22 - Abr24	12%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Nevados	321-22	$ 1.561	May22 - Sep23	90%
Prestación de Servicios Persona Natural	18 CPS	N/A	$ 1.182	Ene22 - May24	53%
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	Consorcio Interparques 22	322-22	$ 330	Abr22 - Abr23	22%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 300	N/A	4%
Interventoría	Consorcio Macaram	419-22	$ 281	Ago22 - Abr24	12%

$ 12.629*

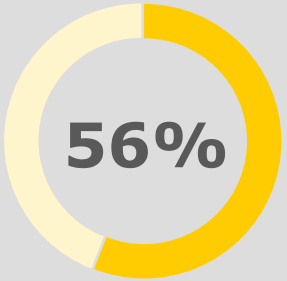

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 1 CPS y a la terminación de 1 CPS

Herencia Colombia

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 6.848**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Ingeurbano	1026-21	$4.602	Feb-23	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	13 CPS	$1.066	Ago-22	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	9 CPS	$ 681	Sep-21	Liquidado
Pubblica S.A.S.	327-22	$ 500	Abr-23	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 2.535	**$ 8**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.947**	**$ 51.773**

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible $ 2.535 | En Trámite $ 8 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 2.535

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Defensa judicial	$ 8

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 61.947** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	$ 10.000	Sep21 - Jul23	90%
Implementar procesos de restauración ecológica	Masbosques	224-22	$ 7.441	Feb22 - Ago23	92%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	$ 7.000	Nov21 - Dic23	89%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	$ 7.000	Sep21 - Nov23	77%
		708-21	$ 5.000	Sep21 - Mar23	90%
Prestación de Servicios Persona Natural	35 CPS	N/A	$ 3.732	Jul21 - Sep24	63%
Adquisición de insumos para dotación de viveros	Universidad de Cordoba	152-22	$ 5.686	Mar22 - May23	18%
Implementar acciones de restauración ecológica	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia	1089-21	$ 2.975	Mar22 - Dic23	80%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	$ 2.940	Jul21 - Mar23	100%

$ 61.947

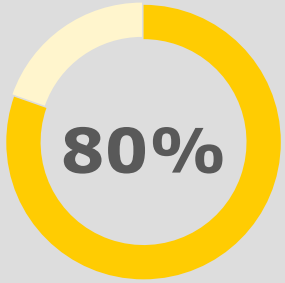

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 61.947** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Iguaque	316-22	$ 1.605	Abr22 - Abr23	89%
Implementar proyecto piloto de restauración activa	Corpocaldas	35-22	$ 1.500	Ene22 - Mar23	100%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	$ 1.469	Nov21 - Jul23	90%
Negocios verdes	Innpulsa Colombia	1028-21	$ 1.300	Ene22 - Jul23	90%
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Estoraques	367-22	$ 1.235	Ago22 - Dic23	39%
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Corales	319-22	$ 871	May22 - Mar23	89%
Implementar un esquema de pago por servicios	Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge	219-22	$ 823	Feb22 - Jul23	67%

$ 61.947

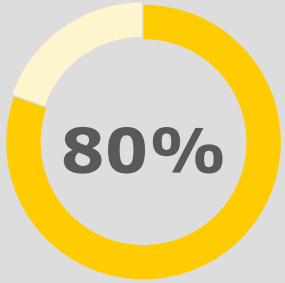

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 61.947** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Restauración Ecológica	Saving The Amazon	1027-21	$ 510	Dic21 - Mar23	90%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 300	N/A	61%
Interventoría	Consorcio estoraques HC	420-22	$ 258	Ago22 - Dic23	25%
	Consorcio JD 044	317-22	$ 189	Abr22 - Abr23	78%
	Inversiones Cuellar Tovar y CIA Ltda.	425-22	$ 113	Ago22 - Oct23	84%

$ 61.947

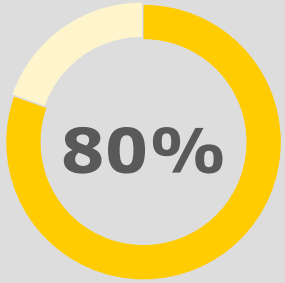

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 51.773**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Masbosques	1047-21	$ 9.990	Feb-23	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	130 CPS	$ 7.303	Abr-22	En proceso de Liquidación
Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarenia	1090-21	$ 4.106	Dic-22	En proceso de Liquidación
Masbosques	774-21	$ 3.971	Sep-22	Liquidado
Invemar	181-22	$ 3.849	Jul-22	Liquidado
Universidad Nacional abierta y a distancia	1121-21	$ 3.320	Oct-22	Liquidado
Arquiteck y asociados SAS	309-22	$ 3.278	Nov-22	En proceso de Liquidación
Consorcio Arqmara Tayrona	311-22	$ 3.008	Dic-22	En proceso de Liquidación
Ecoflora SAS	772-21	$ 2.345	Jun-22	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	31 CPS	$ 1.863	Oct-21	Liquidado
RTVC	216-22	$ 1.727	Dic-22	Liquidado
Universidad pontifica Bolivariana	1083-21	$ 1.000	Nov-22	En proceso de Liquidación
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	1048-21	$ 1.000	Ene-23	En proceso de Liquidación
Pubblica S.A.S.	327-22	$ 685	Abr-23	En proceso de liquidación
Valencia Producciones FX	878-21	$ 757	Abr-22	En proceso de Liquidación
Wework	720-21	$ 756	Sep-22	Liquidado
EMTEL E.S.P.	906-21	$ 589	Oct-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 51.773**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Coolechera	220-22	$ 486	Oct-23	En proceso de Liquidación
Policía Nacional	689-21	$ 400	Nov-22	Liquidado
Corporación Grupo Empresarial ASES	312-22	$ 286	Feb-23	En proceso de Liquidación
Corporación Grupo Empresarial ASES	310-22	$ 232	Nov-22	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	843-21	$ 206	Oct-22	En proceso de Liquidación
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico	1112-22	$ 200	Nov-22	En proceso de Liquidación
Telecafé Limitada	1084-21	$ 200	Mar-22	En proceso de Liquidación
703 S.A.S.	709-21	$ 91	Oct-21	Liquidado
Pradilla Nuñez SAS	911-21	$ 75	Dic-21	En proceso de Liquidación
I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	$ 50	Dic-21	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 600.042	$ 0,45	$ -	$ -	$ -	$ 20.620	$ 49

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral (compra de predios)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras 2019

Disponible $ 600.042 | En Trámite $ 0,45 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible ANT 2019	$ 600.042

En Trámite	
Nombre corto	**Valor**
Defensa judicial	$ 0,45

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras 2019

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 20.620** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	$ 13.761	N/A	100%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	$ 2.230	Sep21 - Mar23	50%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	$ 1.344	Jul21 - Sep23	24%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	$ 1.303	Jul21 - Mar23	10%
Levantamiento de información y diligenciamiento de FISO	Consultores en información Infométrika S.A.S.	466-22	$ 1.982	Oct22 - Sep23	0%

$ 20.620

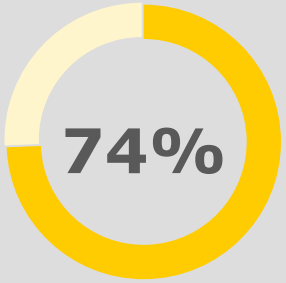

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras 2019

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 49**

Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	$ 49	May21	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 9.726	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.747	$ 100

KFW

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Apoyar la implementación del "Programa Piloto de Inversiones PDET"

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2020 - 2025

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

KFW

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminados
$ 9.726	$ -					

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible KFW	$ 9.726

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

KFW

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 43.747** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar y ejecutar proyectos priorizados	Consorcio AB Caquetá	1116-23	$ 9.821	Oct23 - Mar25	0%
	UT San José 2023	1107-23	$ 9.801	Sep23 - Feb25	0%
	Corporación Grupo Empresarial ASES	1063-23	$ 9.640	Sep23 - Feb25	0%
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	Gopa Infra GMBH Sucursal Colombia	355-22	$ 5.928	Ago22 - Ago25	34%
Interventoría	Yolanda Cabrera Balcázar	1053-23	$ 1.764	Sep23 - Abr25	1%
	Parque natural El Retiro S.A.S.	1064-23	$ 1.764	Sep23 - Abr25	0%
	Unión Temporal InterCaquetá	1123-23	$ 1.764	Sep23 - Abr25	0%
Solución de software para control de proyectos	Business Intelligence Software Assessor Corporation S.A.S. BIC	1191-23	$ 1.510	Pendiente acta	0%

$ 43.747

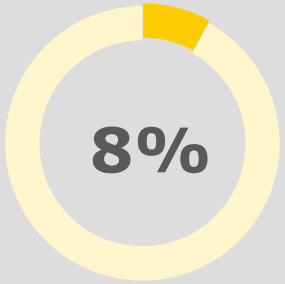

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

KFW

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 43.747** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición de vehículos	Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S.	594-23	$ 691	Abr23 - Jul23	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 CPS	N/A	$ 530	Mar23 - Mar24	56%
Adquisición de camioneta	Distribuidora Los Coches	907-23	$ 214	Ago23 - Oct23	100%
Arrendamiento	Fernando Cruz	649-23	$ 87	May23 - Nov25	19%
Arrendamiento	Jimmy Pimentel	705-23	$ 66	Jun23 - Ago23	100%
Suministro de drones	GO-Drone S.A.S.	922-23	$ 62	Sep23 - Nov23	68%
Adquisición de licenciamiento ArcGIS	ESRI Colombia S.A.S.	1177-23	$ 55	Oct23 - May24	0%
Adquisición de motocicletas	Grupo Supermotos S.A.S.	840-22	$ 37	Feb23 - Abr23	100%
Gastos de ARL	N/A	N/A	$ 15	N/A	62%

$ 43.747

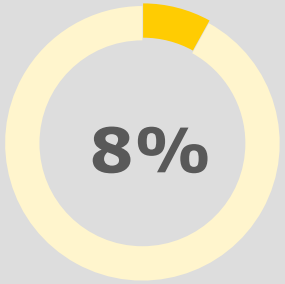

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

KFW

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 100**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	1 CPS	$ 100	Ene-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 913	$ 588

AFD

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2020 - 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

AFD

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminados
$ 393	$ -					

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible AFD	$ 393

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

AFD

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 913** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF International	509-22	$ 735	Nov22 - Oct23	55%
Estrategia de comunicación	Fundación Trenza	946-23	$ 93	Jul23 - Dic23	30%
Estrategia de comunicación	RQ Comunicación Creativa S.A.S.	947-23	$ 85	Ago23 - Dic23	30%

$ 913

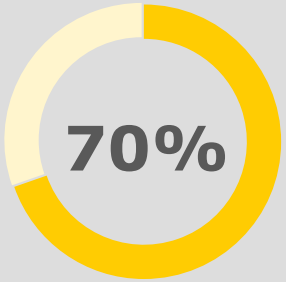

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

AFD

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 588**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
ADEL CCZ - RM - DM	394-22	$ 588	Abr-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 269	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.567	$ 1.537

VISIÓN AMAZONÍA

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Visión Amazonía

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminados
$ 269	$ -					

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Visión Amazonía	$ 269

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Visión Amazonía

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 6.567** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	$ 1.894	Nov20 - Mar23	100%
	Universidad Nacional	737-20	$ 734	Nov20 - Oct24	88%
	Fundación equal Colombia	123-22	$ 709	Mar22 - Ene24	100%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	$ 680	Abr22 - Abr24	100%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	$ 576	Mar22 - Nov23	100%
	ASOGANADO	787-20	$ 432	Nov20 - Mar23	100%
	ASOPRODAMET	285-22	$ 396	Mar22 - Abr23	100%
	Asociación de economía solidaria del medio y bajo Caguán - ASOES	648-23	$ 373	Jul23 - Jul24	81%
		286-22	$ 277	Mar22 - Sep23	100%
	Instituto amazónico de investigaciones científicas SINCHI	97-22	$ 218	Jun22 - Jun24	87%
Planificación de predios	11 CPS	N/A	$ 233	Ago23 - Dic23	20%
Adquisición de GPS	Manufacturas e Inversiones Alsava	869-23	$ 45	Ago23 - Sep23	100%

$ 6.567

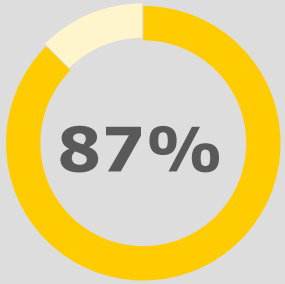

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Visión Amazonía

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 1.537**

Contratista	# Contrato	Valor	Fecha Terminación	Estado
Rape Región Central	443-22	$ 637	Sep-23	En proceso de liquidación
ASOHECA	859-20	$ 518	Oct-22	En proceso de liquidación
CORPOJAGUAR	789-20	$ 382	Nov-22	En proceso de liquidación
Prestación de servicios	1 CPS	$ -	Sep-23	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 58.874	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 108**	**$ 31.018**

Niñez y Adolescencia ICBF

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Acompañar a las niñas, los niños y adolescentes en la construcción de sus planes de vida, a través de procesos de formación basados en metodologías participativas para el fortalecimiento de sus habilidades, la exploración de sus vocaciones, la potencialización de sus talentos, el fortalecimiento de hábitos de cuidado para la salud mental, el fortalecimiento de los entornos próximos de desarrollo, así como la incidencia en los determinantes sociales de los riesgos específicos con mayores afectaciones en sus territorios.

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2026

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Niñez y Adolescencia ICBF

Disponible $ 58.874 | En Trámite $ - | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible ICBF Sacúdete	$ 58.874

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Niñez y Adolescencia ICBF

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 108** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	$ 108	N/A	1%

$ 108

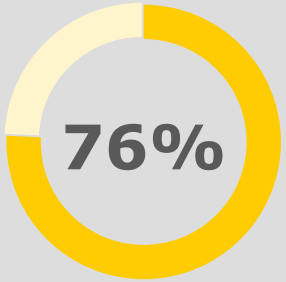

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Niñez y Adolescencia ICBF

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 31.018**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Asociación Colombiana Renaciente	925-21	$ 2.246	May-22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	$ 1.977	May-22	Liquidado
FUNDAFES	853-21	$ 1.655	Abr-22	Liquidado
FUNDAFES	968-21	$ 1.544	Jun-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	986-21	$ 1.503	Jul-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	$ 1.319	Jun-22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	724-21	$ 1.232	Abr-22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	740-21	$ 1.469	Abr-22	Liquidado
Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	$ 995	Abr-22	En proceso de Liquidación
Corporación Trigal del Norte	722-21	$ 904	Mar-22	Liquidado
Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	$ 965	Abr-22	Liquidado
Corporación Oxsan	856-21	$ 963	Abr-22	Liquidado
AEMG	987-21	$ 856	Jun-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	839-21	$ 852	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	$ 805	Mar-22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	808-21	$ 802	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social Creciendo	698-21	$ 794	Mar-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Niñez y Adolescencia ICBF

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 31.018**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	$ 940	Abr-22	Liquidado
Fundación para el desarrollo y soluciones	812-21	$ 761	Jun-22	Liquidado
Prestación de servicios	10 CPS	$ 735	Sep-22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	$ 725	Abr-22	En proceso de Liquidación
Fundación para el desarrollo y soluciones	813-21	$ 715	Jul-22	Liquidado
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	$ 705	Abr-22	Liquidado
Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	$ 622	Abr-22	En proceso de Liquidación
FAVANSO	855-21	$ 647	May-22	En proceso de Liquidación
FUNDESOP	988-21	$ 608	Jun-22	Liquidado
Universidad del Magdalena	814-21	$ 548	Jun-22	En proceso de Liquidación
Corpollanos	924-21	$ 543	May-22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	$ 511	Mar-22	En proceso de Liquidación
FUNDESO IS	840-21	$ 457	Jun-22	Liquidado
Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	$ 477	Jun-22	En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Niñez y Adolescencia ICBF

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 31.018**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Fundalianza	910-21	$ 437	Jun-22	Liquidado
Universidad del Magdalena	900-21	$ 349	Jun-22	En proceso de Liquidación
Fundalianza	908-21	$ 249	Jun-22	En proceso de Liquidación
UT San Pedro	743-21	$ 107	Sep-22	Liquidado
Vélez Tours SAS	217-22	$ 0,7	Sep-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320

Zona ZEII Catatumbo

Entidad Ejecutora: Policía Nacional

Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.

Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander

Estado: En Proceso de Cierre

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 320**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Unión temporal Ludark	391-22	$ 210	Oct-22	Liquidado
1 CPS	N/A	$ 110	Oct-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Colombia en Paz - FCP

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 131.359	$ -	$ 10.093	$ -	$ -	$ 15.098	$ 1.395

Catastro Multipropósito

Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.

Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2023

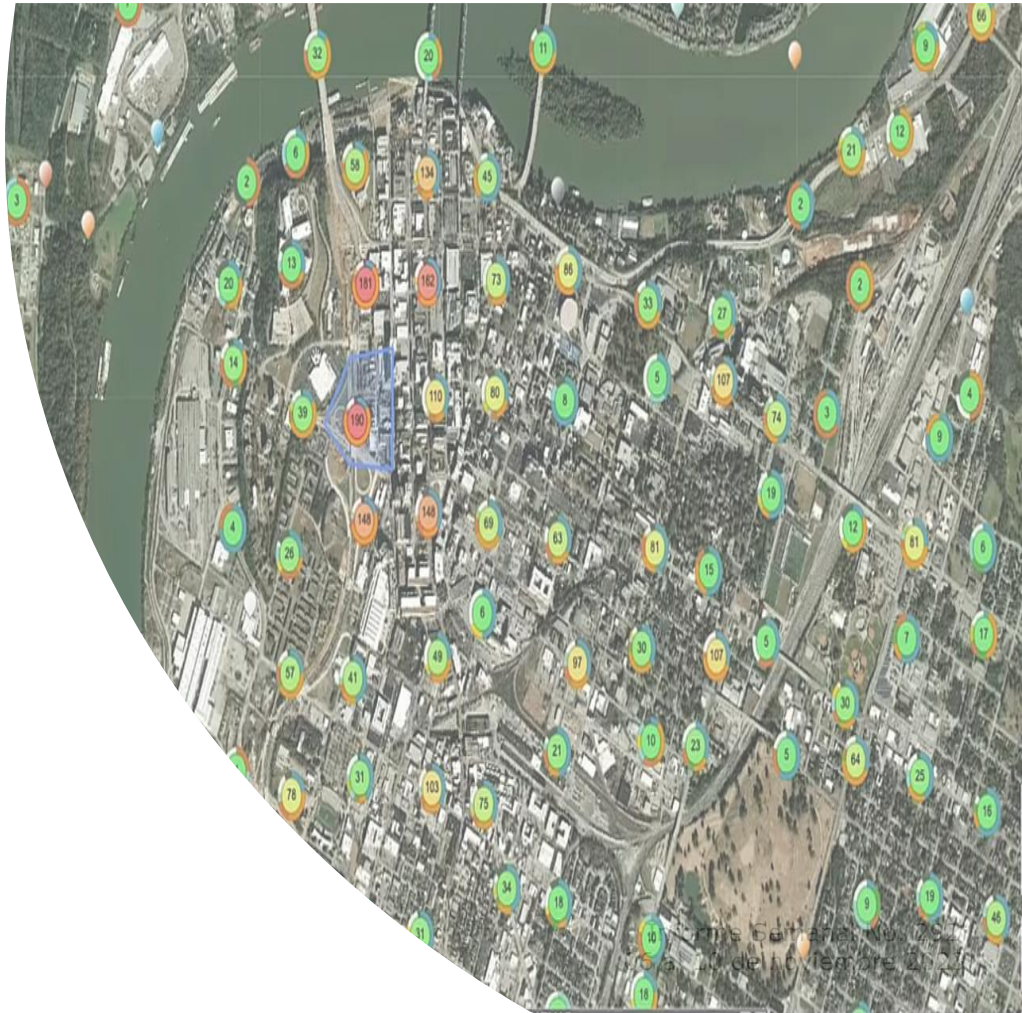

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminados
$ 131.359	$ -					

Disponible	
Nombre corto	**Valor**
Disponible Catastro Multipropósito	$ 131.359

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Disponible | En Trámite | **Convocatoria $ 10.093** | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre recepción de propuestas
Operador logístico	ART	$ 5.000	16 de noviembre de 2023
Servicio de transporte multimodal	ART	$ 4.849	20 de noviembre de 2023
Tiquetes aéreos	ART	$ 244	20 de noviembre de 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 15.098** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Generar Productos Cartográficos	UT Carto 044 2022	483-22	$ 6.354	Sep22 - Dic23	23%
Adquirir Ortoimágenes de los Municipios priorizados	Unión temporal Ingecalculo	387-22	$ 5.163	Jul22 - May23	96%
Adquirir estaciones de referencia de operación continua CORS	Datum Ingeniería S.A.S.	837-22	$ 3.046	Ene23 - Ago23	100%
Captura de coordenadas de precisión	Consorcio apoyo PDET	562-22	$ 535	Ene23 - Oct23	47%

$ 15.098

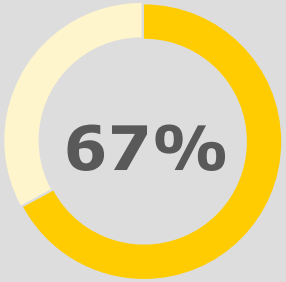

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Catastro Multipropósito

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 1.395**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Geospatial S.A.S	386-22	$ 1.132	Nov-22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 13 CPS	N/A	$ 263	Mar-22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Disponible	En Trámite	Convocatoria	Evaluación	Adjudicación	Ejecución	Terminado
$ 78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275	$ -

Zona ZEII Catatumbo-Catastro

Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales

Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.

Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo - Catastro

Disponible $ 78 | En Trámite $ - | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro	$ 78

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo - Catastro

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.275** | Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Operación Catastral	Geodesia por Satélite de Colombia LTDA.	2-23	$ 1.082	Feb23 - Sep23	40%
Operación Catastral	Asomunicipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña Y Sur del Cesar	422-22	$ 194	Ago22 - Nov23	65%

$ 1.275

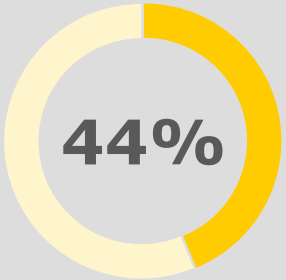

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo - Catastro

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ -**

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar.	218-22	$ -	May 22	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

www.fcp.gov.co

@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz
